
2026년 신라왕경 핵심유적 복원·정비 시행계획

2025. 12.



경주시

■ 차례 ■

제1장	계획의 개요	5
I 계획의 배경 및 목적		
1.	계획의 배경	7
2.	계획의 목적	7
II 관련 법령		
1.	관련 법령	8
2.	특별법 시행령 제정 전후 신라왕경 핵심유적 비교	13

제2장	2025년 주요성과	15
I 2025년 추진 사업 실적		
1.	신라 왕궁(경주 월성)	17
2.	경주 황룡사지	20
3.	경주 분황사지	24
4.	경주 구황동 원지 유적 일원	28
5.	경주 미탄사지 삼층석탑	30
6.	경주 동궁과 월지	32
7.	경주 첨성대	37
8.	경주 대릉원 일원	39
9.	경주 동부사적지대	45
10.	경주 춘양교지와 월정교지	47
11.	경주 인왕동사지	50
12.	경주 천관사지	52

13. 경주 낭산 일원	54
14. 경주 사천왕사지	60
II 2025년 추진 사업 종합	62
III 2025년 추진 사업 평가	69
1. 평가의 목적	69
2. 평가의 근거	69
3. 평가위원회 구성	69
4. 평가 세부 측정기준 및 내용	70
5. 평가결과	72
<hr/>	
제3장 2026-2030년 핵심유적 세부 이행 과제 및 로드맵	95
I 경주 월성	97
II 경주 황룡사지	100
III 경주 분황사지	103
IV 경주 구황동 원지 유적 일원	105
V 경주 미탄사지 삼층석탑	107
VI 경주 동궁과 월지	109
VII 경주 첨성대	112
VIII 경주 대릉원 일원	114
IX 경주 동부사적지대	117
X 경주 춘양교지와 월정교지	119
XI 경주 인왕동사지	121

Contents

XIII 경주 천관사지	123
XIII 경주 낭산 일원	125
XIV 경주 사천왕사지	128
<hr/>	
제4장 2026년 사업추진 세부계획	131
I 세부 시행계획	133
1. 신라 왕궁(경주 월성)	133
2. 경주 황룡사지	138
3. 경주 분황사지	142
4. 경주 구황동 원지 유적 일원	146
5. 경주 미탄사지 삼층석탑	149
6. 경주 동궁과 월지	151
7. 경주 첨성대	156
8. 경주 대릉원 일원	158
9. 경주 동부사적지대	165
10. 경주 춘양교지와 월정교지	168
11. 경주 인왕동사지	171
12. 경주 천관사지	174
13. 경주 낭산 일원	177
14. 경주 사천왕사지	182
II 세부 시행계획 종합	185
<hr/>	
제5장 예산계획	191
I 2026년 시행사업 소요예산	193
II 세부 시행계획의 의의	197

제1장 계획의 개요

I. 계획의 배경 및 목적

II. 관련 법령

I ▶ 계획의 배경 및 목적

1. 계획의 배경

- 신라왕경 핵심유적 복원·정비 사업은 신라왕경 골격 복원을 통한 천년고도 경주의 정체성 회복 및 역사문화자원의 가치 증진과 적극적 활용기반 구축을 목표로 2014년부터 추진하였음
- 2019년 “신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법(약칭: 신라왕경법)”이 제정(법률 제16779호, ‘19.12.10.)되었으며, 그동안 총리령에 근거하여 설치되었던 신라왕경 핵심유적 복원·정비 추진단은 신라왕경법 제7조에 의하여 법률에 근거한 조직으로 개편되었음
- 신라왕경 핵심유적 복원·정비 추진단은 신라왕경법 제5조에서 신라왕경 핵심유적 복원·정비 종합계획을 5년마다 수립하도록 규정하고 있으며, 경주시는 종합계획에 근거하여 연도별 시행계획을 수립하여야 함

2. 계획의 목적

- 신라왕경 핵심유적의 신라왕경법 제정에 따라 수립된 『신라왕경 핵심유적 복원·정비 종합계획(2021~2025)』을 바탕으로 경주시장은 체계적으로 사업을 수행할 수 있는 『(연도별)신라왕경 핵심유적 복원·정비 시행계획』을 수립함(신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법 시행령 제4조)
- 시행계획에는 복원·정비사업의 추진방향, 복원·정비사업의 세부계획, 복원·정비사업 비용 및 재원조달계획, 그 밖에 복원·정비사업의 시행에 필요한 사항으로 국가유산¹⁾청장이 정하는 사항을 포함하여 수립함(신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법 시행령 제4조)

1) 2024년 5월 17일 문화재라는 용어가 국가유산으로 변경되어 문화재→국가유산, 문화재청→국가유산청, 문화재청장→국가유산청장, 문화재보호법→문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률로 표기하였음. 단, 명칭 개정 이전에 시행된 사업 등에 대해서는 당시의 용어와 기관명을 그대로 사용하였음.

II ▶ 관련 법령

1. 관련 법령

- 2019년 12월 10일 “신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법”을 제정하면서 신라왕경 핵심유적을 복원·정비하는데 필요한 법적 기반을 마련함
- “신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법” 제2조에 따르면 “신라왕경”이란 신라 및 통일신라 시기의 수도를 일컫는 말로서 주로 왕이 거주하고 정치하던 경주 및 그 인근 지역을 말하고, “신라왕경 핵심유적”이란 신라 왕궁, 황룡사, 동궁과 월지, 첨성대 등 신라왕경 내의 대통령령으로 정하는 유적을 말함
- 특별법 제정(‘19.12.10. 공포, ‘20.12.11. 시행)으로 천년 고도 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업 추진 토대를 마련하였고, 합리적인 사업수행이 가능하도록 신라왕경 핵심유적에 대한 대상을 정하고자 2020년 10월 27일 “신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법 시행령”을 공포하였음
- 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법 시행령은 신라왕경 핵심유적의 범위, 신라왕경 핵심유적 복원·정비 종합계획의 중요사항, 연도별 시행계획의 수립 및 신라왕경 핵심유적 복원·정비 추진단의 업무·구성 등에 관한 사항을 정하는 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함
- 따라서 신라왕경 핵심유적의 범위(제2조), 신라왕경 핵심유적 복원·정비 종합계획의 중요사항 등(제3조), 연도별 시행계획 수립(제4조), 추진단의 업무 및 구성 등(제5조)을 주요 내용으로 함
- 신라왕경 핵심유적의 범위(제2조)는 특별법 제정으로 천년 고도 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업 추진 토대를 마련하고, 이를 사업의 합리적인 수행이 가능하도록 신라왕경 핵심유적에 대한 대상을 정한 것임
- 제정 내용은 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업의 원활한 추진을 위해 “신라왕경 핵심유적”의 대상 범위를 신라 왕궁(경주 월성), 경주 황룡사지, 경주 분황사지, 경주 구황동 원지 유적 일원, 경주 미탄사지 삼층석탑, 경주 동궁과 월지, 경주 첨성대, 경주 대릉원 일원, 경주 동부사적지대, 경주 춘양교지와 월정교지, 경주 인왕동 사지, 경주 천관사지, 경주 낭산 일원, 경주 사천왕사지로 명시함

- 신라왕경 핵심유적 복원·정비 종합계획의 중요사항 등(제3조)은 신라왕경 핵심유적의 현황, 역사문화환경, 수리 이력 및 보존·관리 현황, 복원·정비를 위한 대외협력, 핵심유적 관련 교육 및 홍보, 복원·정비가 세계유산 보존·관리에 미치는 영향, 복원·정비의 추진현황과 성과분석 등으로 정하고, 종합계획을 수립하거나 변경하려는 경우에는 관련 전문가의 의견을 듣고 경상북도지사와 경주시장에게 알리고 국가유산청의 인터넷 홈페이지에 공고하도록 정함
- 추진단의 업무 및 구성 등(제5조)은 신라왕경 핵심유적 복원·정비 추진단에서 신라왕경 핵심유적 복원·정비 종합계획의 수립 및 변경, 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업의 총괄·조정 및 관련 기초 조사·연구 등의 업무를 수행하도록 정함
- 또한, 신라왕경 핵심유적 복원·정비 추진단은 단장 1명과 단원으로 구성하고, 추진단의 단장은 국가유산청 소속 공무원 중에서 국가유산청장이 임명하며, 단장은 국가유산청장의 지휘를 받아 추진단의 운영 및 업무를 총괄하도록 정함
- 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법 시행령 제정에 따라 기존 8개이던 신라왕경 사업대상이 14개소의 핵심유적으로 범위가 확대되었고 신라왕경 핵심유적 복원·정비 추진단의 업무와 조직이 구성되어, 신라왕경 사업의 종합계획을 수립하는 등 총괄기관으로서 그 기능과 역할이 강화되었음

<표 1-1> 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법

구 분	내 용
제1조	제1조(목적) 이 법은 우리 민족의 소중한 문화적 자산인 신라왕경(新羅王京) 핵심유적을 복원·정비함으로써 민족문화의 원형을 되살려 민족의 정체성 확립에 기여하고 신라왕경이 소재한 경주를 활력 있는 역사문화도시로 조성하는 데 이바지함을 목적으로 한다.
제2조	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “신라왕경”이란 신라 및 통일신라 시기의 수도를 일컫는 말로서 주로 왕이 거주하고 정치하던 경주 및 그 인근 지역을 말한다. 2. “신라왕경 핵심유적”이란 신라왕궁(이하 “월성(月城)”이라 한다), 황룡사(皇龍寺), 동궁(東宮)과 월지(月池), 첨성대(瞻星臺) 등 신라왕경 내의 대통령령으로 정하는 유적을 말한다.
제3조	제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 신라왕경 핵심유적의 복원·정비를 원활하고 효율적으로 추진하기 위하여 상호 협력하여야 하며 신라왕경 핵심유적 복원·정비의 성공적 추진을 위하여 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 신라왕경 핵심유적의 복원·정비가 안정적으로 추진될 수 있도록 재원조달 계획 등을 수립하여 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 필요한 재정적 지원이 이루어지도록 노력하여야 한다.

<표 1-1> 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법 (계속)

구 분	내 용
제4조	<p>제4조(다른 법률과의 관계) ① 이 법은 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다.</p> <p>② 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관하여 이 법에 규정한 것을 제외하고는 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」에 따른다.</p>
제5조	<p>제5조(신라왕경 핵심유적 복원·정비 종합계획의 수립) ① 국가유산청장은 신라왕경 핵심유적의 복원·정비를 위하여 5년마다 경상북도지사와 경주시장의 의견을 들은 후 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 신라왕경 핵심유적 복원·정비 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)을 수립하여야 한다. 종합계획 중 대통령령으로 정하는 중요사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.</p> <p>② 종합계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 신라왕경 핵심유적 복원·정비 기본방향 및 목표 2. 신라왕경 핵심유적 복원·정비 계획 및 추진 3. 신라왕경 핵심유적 복원·정비를 위한 재원확보 4. 신라왕경 핵심유적 관련 조사·연구 5. 그 밖에 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항 <p>③ 그 밖에 종합계획의 수립에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p>
제6조	<p>제6조(연도별 시행계획의 수립 등) ① 경주시장은 종합계획에 따라 연도별 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)을 수립한 후 경상북도지사를 거쳐 국가유산청장의 승인을 받아야 한다.</p> <p>② 경주시장은 전년도 시행계획의 추진실적을 평가하고 그 결과를 다음 연도 시행계획에 반영하여야 한다.</p> <p>③ 그 밖에 시행계획의 수립에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p>
제7조	<p>제7조(추진단의 설치 및 운영) ① 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 업무를 효율적으로 추진하기 위하여 국가유산청에 신라왕경 핵심유적 복원·정비 추진단(이하 “추진단”이라 한다)을 둔다.</p> <p>② 추진단의 업무, 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p>
제8조	<p>제8조(복원·정비 사업) 정부와 지방자치단체는 신라왕경 핵심유적 복원·정비를 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 월성 복원·정비 2. 황룡사 복원·정비 3. 동궁과 월지 복원·정비 4. 월정교 복원·정비 5. 대형고분 재발굴·진시 6. 신라왕경 중심방 복원·정비 7. 첨성대 주변 발굴·정비 8. 쪽샘지구 발굴·정비
제9조	<p>제9조(국회에 대한 보고) 국가유산청장은 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 보고서를 매년 정기회 개최 전까지 국회 소관 상임위원회에 제출하여야 한다.</p>

<표 1-2> 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법 시행령

구 분	내 용
제1조	제1조(목적) 이 영은 「신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조	<p>제2조(신라왕경 핵심유적의 범위) 「신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제2호에서 “신라왕궁, 황룡사(皇龍寺), 동궁(東宮)과 월지(月池), 첨성대(瞻星臺) 등 신라왕경 내의 대통령령으로 정하는 유적”이란 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따라 국가지정문화유산으로 지정된 다음 각 호의 유적을 말한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 신라왕궁[경주 월성(月城)을 말한다] 2. 경주 황룡사지 일원(一圓): 다음 각 목의 유적 <ol style="list-style-type: none"> 가. 경주 황룡사지 나. 경주 분황사지 다. 경주 구황동 원지 유적 일원 라. 경주 미탄사지 삼층석탑 3. 경주 동궁과 월지 4. 경주 첨성대 5. 경주 대릉원 일원 6. 경주 동부사적지대 7. 경주 춘양교지와 월정교지 일원: 다음 각 목의 유적 <ol style="list-style-type: none"> 가. 경주 춘양교지와 월정교지 나. 경주 인왕동 사지 다. 경주 천관사지 8. 경주 낭산 일원 9. 경주 사천왕사지
제3조	<p>제3조(신라왕경 핵심유적 복원·정비 종합계획의 중요사항 등) ① 법 제5조제1항 후단에서 “대통령령으로 정하는 중요사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 신라왕경 핵심유적의 범위 2. 신라왕경 핵심유적에 대해 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제27조제1항에 따라 지정된 보호구역의 현황 3. 법 제8조에 따른 신라왕경 핵심유적 복원·정비 사업(이하 “복원·정비사업”이라 한다) 추진 <p>② 법 제5조제2항제5호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 신라왕경 핵심유적의 현황 2. 신라왕경 핵심유적의 역사문화환경(국가유산 주변의 자연경관이나 역사적·문화적인 가치가 뛰어난 공간으로서 국가유산과 함께 보호할 필요성이 있는 주변 환경을 말한다) 현황 3. 신라왕경 핵심유적의 수리 이력 및 보존·관리 현황 4. 신라왕경 핵심유적 복원·정비를 위한 대외협력 5. 신라왕경 핵심유적 관련 교육 및 홍보 6. 신라왕경 핵심유적 복원·정비가 세계유산(「세계문화유산 및 자연유산의 보호에 관한 협약」에 따라 국제연합 교육과학문화기구의 세계유산목록에 등재된 유산을 말한다. 이하 같다)의 보존·관리에 미치는 영향

<표 1-2> 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법 시행령 (계속)

구 분	내 용
제3조	<p>7. 복원·정비사업의 추진현황 및 성과분석</p> <p>③ 국가유산청장은 법 제5조제1항에 따른 신라왕경 핵심유적 복원·정비 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)을 수립하거나 변경하기 위하여 필요한 때에는 경주시장에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다.</p> <p>④ 국가유산청장은 종합계획을 수립하거나 변경하려는 경우에는 관련 전문가의 의견을 들어야 한다.</p> <p>⑤ 국가유산청장은 종합계획을 수립하거나 변경한 경우에는 이를 경상북도지사와 경주시장에게 알리고, 국가유산청의 인터넷 홈페이지에 공고해야 한다.</p>
제4조	<p>제4조(연도별 시행계획의 수립) ① 법 제6조제1항에 따른 연도별 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 복원·정비사업의 추진방향 2. 복원·정비사업의 세부계획 3. 복원·정비사업 비용 및 재원조달계획 4. 그 밖에 복원·정비사업의 시행에 필요한 사항으로서 국가유산청장이 정하는 사항 <p>② 경주시장은 매년 12월 31일까지 다음 연도의 시행계획을 수립하여 국가유산청장에게 제출해야 한다.</p> <p>③ 국가유산청장은 법 제6조제1항에 따라 시행계획을 승인한 경우에는 그 사실을 경상북도지사와 경주시장에게 각각 알려야 하며, 경상북도지사와 경주시장은 지체 없이 시행계획을 해당 기관의 게시판 및 인터넷 홈페이지에 공고해야 한다.</p>
제5조	<p>제5조(추진단의 업무 및 구성 등) ① 법 제7조제1항에 따른 신라왕경 핵심유적 복원·정비 추진단(이하 “추진단”이라 한다)은 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 종합계획의 수립 및 변경 2. 복원·정비사업의 총괄·조정 3. 복원·정비사업 관련 기초 조사·연구 4. 신라왕경 핵심유적 복원·정비를 위한 대외협력 5. 신라왕경 핵심유적 관련 교육 및 홍보 6. 복원·정비사업이 세계유산의 보존·관리에 미치는 영향 분석 7. 그 밖에 복원·정비사업의 추진을 위해 필요한 사항 <p>② 추진단은 단장 1명과 단원으로 구성한다.</p> <p>③ 추진단의 단장(이하 “단장”이라 한다)은 국가유산청 소속 공무원 중에서 국가유산청장이 임명한다.</p> <p>④ 추진단의 단원(이하 “단원”이라 한다)은 국가유산청 및 관계 행정기관의 소속 공무원과 관계 기관·단체의 소속 직원 중에서 파견된 사람으로 한다.</p> <p>⑤ 단장은 국가유산청장의 지휘를 받아 추진단의 운영 및 업무를 총괄하고, 단원을 지휘·감독한다.</p>

2. 특별법 시행령 제정 전후 신라왕경 핵심유적 비교

- 2019년 12월 10일 제정된 신라왕경 특별법에서는 복원정비 대상을 8대 사업으로 규정하고 있으며, 2020년 10월 27일 제정된 신라왕경 특별법 시행령에서는 핵심유적을 14개로 지정하였음

<표 1-3> 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법과 시행령의 핵심유적 비교

신라왕경 특별법	신라왕경 특별법 시행령	
월성 복원·정비	신라 왕궁(경주 월성)	
황룡사 복원·정비	경주 황룡사지 일원	경주 황룡사지
		경주 분황사지
		경주 구황동 원지 유적 일원
		경주 미탄사지 삼층석탑
동궁과 월지 복원·정비	경주 동궁과 월지	
신라왕경 중심 방 복원·정비		
월정교 복원·정비	경주 춘양교지와 월정교지 일원	경주 춘양교지와 월정교지
		경주 인왕동사지
		경주 천관사지
대형고분 재발굴·전시	경주 대릉원 일원	
쪽샘지구 발굴·정비		
침성대 주변 발굴·정비	경주 침성대	
	경주 동부사적지대	
-	경주 낭산 일원	
-	경주 사천왕사지	

제2장 2025년 주요성과

- I. 2025년 추진 사업 실적
- II. 2025년 추진 사업 종합
- III. 2025년 추진 사업 평가

I 2025년 추진 사업 실적

1. 신라 왕궁(경주 월성)



사진 1. 경주 월성

1) 주요 성과

- 월성은 일제강점기 고적 조사를 시작으로 현재까지 성벽 내부와 해자, 문지 등 외곽 시설에 대한 발굴조사 및 학술연구가 지속적으로 수행되어 왔음
- 1902년 세키노 다다시의 조사를 필두로 1910년 도리이 류조의 성벽 발굴, 1922년 후지타 료사쿠·우메하라 스에지·고이즈미 아키오의 조사, 1929년 후지시마 가이지로의 건축 조사, 1930~40년대 아리미스 교이치의 조사 등이 진행됨
- 초기에는 동문지와 해자 등 외곽 지역을 중심으로 조사가 이루어졌으나, 최근 성벽 내부에 대한 정밀 조사가 병행되면서 월성 전역에 대한 종합적인 조사가 진행 중임
- 이외에도 “경주 월성 기초학술조사연구 보고서”와 “경주 월성 보존정비정책연구 종합연구보고서”를 간행하여 학술적 토대로 공고히 하였음
- 2015년 수립된 “월성 발굴조사 마스터플랜”에 따라 내부(A~D구역)와 외부

(가~라구역)를 체계적으로 분절하여 연차별 발굴조사를 추진함

- A지구는 서성벽과 남성벽 구간을 조사하였으며, C지구는 건물지 17동, 담장 4기, 우물 1개소 등 주요 유구의 실체를 확인함
- 월성해자의 경우 정비 사업의 일환으로 1호 해자를 조사하여 호안 목재 구조물 등 확인한 성과를 거둠
- 2021년 “월성 종합연구사업 백서”발간을 통해 단계별 추진 전략과 세부 과제를 설정하였으며, 발굴조사의 전문성 확보 및 융복합 분석을 통한 기획 연구 기능을 강화함
- 2022년 5월 월성해자 복원·재현 사업을 완료하였으며, 수목정비 및 예초 등 쾌적한 유적 환경 조성을 위한 상시 관리를 지속하고 있음
- 2023년 7월 월성 유적의 전문 연구와 유물 관리·활용을 위한 통합운영 시설인 “신라월성연구센터(송문대)”건립을 완료함
- 2024년 12월 “월성 서편지 종합정비계획”수립하여 향후 체계적인 정비 사업 추진계획에 있음
- 2025년 9월 “월성 관람환경개선사업(탐방로 정비)”을 통해 탐방로 포장 및 편의 시설 정비하였음

2) 경주 월성 2025년 실적

(1) 발굴·연구

가. 경주 월성 발굴조사 및 학술연구

<표 2-1> 경주 월성 발굴조사 및 학술연구

구 분	내 용
사업기간	● 2014. 01. ~ 계속
사 업 비	● 1,309억원(월성 기초연구 및 발굴조사 1,129억, 학술연구 180억)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ● 월성 A지구(남성벽 및 건물지), C지구(내부 건물지 등) 정밀발굴조사 <ul style="list-style-type: none"> - A, C지구 정밀발굴조사 및 목간자료 비교연구 등 월성 관련 심화 연구 ● 신라 금석문 자료 집성, 신라 표준연대기 수립 및 해자 출토 목부재 자료집 발간 ● 월성 발굴조사·연구 성과 공개회 및 현장 개방 축제 개최 ● 안정적인 연구 기반 구현을 위한 발굴조사 데이터 디지털 기록화 시스템 구축 ● 국내외 홍보 및 학술대회 개최

(2) 복원·정비

가. 경주 월성 지구 예초

<표 2-2> 경주 월성 지구 예초

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 01. ~ 2025. 12.
사업비	• 2.52억원(2025년 집행완료)
사업내용	• 경주 월성 지구 예초 실시

나. 경주 월성 관람환경 시설 개선

<표 2-3> 경주 월성 관람환경 시설 개선

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 11. ~ 2026. 12.
사업비	• 14.9억원(2025년 12억, 2024년 이월 2.9억원)
사업내용	• 주요 탐방로 정비 및 수목정비, 편의시설 정비 등

다. 승문대 진입로 정비

<표 2-4> 승문대 진입로 정비

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 5. ~ 2025. 12.
사업비	• 3억원(2025년)
사업내용	• 진입로 확·포장 및 인도개설

2. 경주 황룡사지



사진 2. 경주 황룡사지 전경

1) 주요 성과

- 1976년 ~ 1983년, 경주고적발굴조사단 발굴조사 결과 동서 288m, 남북 281m의 정방형에 가까운 사역을 확인하였음
- 2007년, 황룡사 복원·정비 기본계획을 수립함
- 2012년, 황룡사 복원·정비 종합정비계획을 수립함
- 2012년 ~ 현재, 황룡사 복원 심화 연구(현재 9차 연구 중) 진행함
- 2015년 ~ 현재, 황룡사 남쪽담장 외곽부지 내 유적 발굴조사 결과 통일신라시대의 광장형 도로, 신라방 가옥군 등 존재가 확인됨(현재 3차 나구역 발굴조사 중)
- 2016년 ~ 2017년, 중문지와 동문지, 남회랑지, 담장지, 도로 등에 대한 재발굴조사 결과 중문지는 3차례의 변화가 확인되었고, 동문지가 새롭게 조사됨
- 2017년, 황룡사역사문화관 및 주차장 등이 건립됨
- 2018년 ~ 2019년, 국립경주문화재연구소에서 남문지와 동서건물지의 구조를 검토하고 폐와수혈을 조사하였음

- 2018년 ~ 2022년, 황룡사지 동편, 서편 및 북편 경관개선 및 관람로 정비
- 2018년 ~ 2021년, 중문 및 남회랑 증강현실 콘텐츠 제작(디지털 복원)
- 2020년 ~ 2021년, 황룡사 진입부, 회랑내곽 건물지 기단 고증연구
- 2022년 ~ 2024년, 황룡사 9층 목탑 증강현실 콘텐츠 개발
- 2023년 ~ 2024년, 황룡사지 진입부 기단 정비
- 2023년 ~ 2025년, 황룡사지 남쪽광장 정비
- 2025년 ~ 2026년, 황룡사지 배수체계 개선 계획 수립 중
- 2025년 ~ 2027년, 황룡사지 중심사역 기단정비 중

2) 경주 황룡사지 2025년 실적

(1) 발굴·연구

가. 경주 황룡사 남쪽담장 외곽 정비사업 부지 발굴

<표 2-5> 경주 황룡사 남쪽담장 외곽 정비사업 부지 발굴

구 분	내 용
사업기간	● 2024. 12. ~ 2025. 12.
사업비	● 3.5억원(2024년 집행완료)
사업내용	● 황룡사지 남쪽담장 외곽 도시유적 정밀 발굴조사 구역 유구 보존조치 ● 학술대회 개최

나. 경주 황룡사 복원 10차 심화연구

<표 2-6> 경주 황룡사 복원 10차 심화연구

구 분	내 용
사업기간	● 2025. 01. ~ 2026. 12.
사업비	● 10억원(2025년 예산)
사업내용	● 중금당 모형 제작 및 중금당 및 불상 디지털 복원 콘텐츠 제작 ● 강당 건축복원 고증연구, 관람환경 정비계획 수립, 중금당 학술대회 개최

다. 경주 황룡사지 배수체계 개선 계획 수립

<표 2-7> 경주 황룡사지 배수체계 개선 계획 수립

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 09. ~ 2026. 09.
사업비	• 2.2억원(2025년 예산)
사업내용	• 황룡사지 고지형 분석 및 현장 조사를 통한 효율적 배수체계 정비방안 수립

라. 경주 황룡사지 기록화 기초 연구

<표 2-8> 경주 황룡사지 기록화 기초 연구

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 12. ~ 2025. 12.
사업비	• 2억원(2024년 집행완료)
사업내용	• 황룡사지 관련 자료의 기록화 기초 작업

(2) 복원·정비

가. 경주 황룡사지 중심사역 기단 정비

<표 2-9> 경주 황룡사지 중심사역 기단 정비

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 09. ~ 2027. 12.
사업비	• 19억원(2025년 예산)
사업내용	• 목탑자·중금당지(석조가구식기단), 강당지(장대석 외벌대 기단) 기단 정비 • 동·서금당지·강당 동서편건물지·회랑자·종루자·경루지(기단 경계표시) 기단 정비

나. 경주 황룡사지 남쪽광장 정비 사업

<표 2-10> 경주 황룡사지 남쪽광장 정비 사업

구 분	내 용
사업기간	• 2023. 07. ~ 2025. 12.
사업비	• 28억원(2025년 8.3억, 2024년 이월 8억, 2023년 이월 11.6억)
사업내용	• 부지정비(마사토 포장), 담장 재현

다. 황룡사 역사문화관 전시실 개편

<표 2-11> 황룡사 역사문화관 전시실 개편

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 09. ~ 2026. 12.
사업비	• 20억원(2025년 예산)
사업내용	• 황룡사 역사문화관 2층 전시실 개편

라. 경주 황룡사지 주변정비

<표 2-12> 경주 황룡사지 주변정비

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 01. ~ 2025. 12.
사업비	• 1.6억원(2025년 1.4억, 2024년 이월 0.2억)
사업내용	• 황룡사지 일원 산책로 정비, 경관조명 유지보수, 예초 작업 등

3. 경주 분황사지



사진 3. 경주 분황사지 전경

1) 주요 성과

- 분황사 석탑은 일제강점기인 1904년에 세키노 다다시가 모전석탑으로 보고한 이후, 1925년에 대대적인 보수가 이루어졌음
- 이후 1930년과 1933년에 후지시마 가이지로의 건축조사가 이루어졌음
- 1965년 12월 21일부터 25일까지 분황사 뒷담에서 북쪽으로 33m 떨어진 구황동 857번지 내 우물 조사에서 훼손된 석불과 보살상이 수습되었음
- 1975년 2월 8일부터 18일까지 분황사 실측 및 예비조사를 실시하고, 11월 8일부터 12월 4일까지 보광전 주위에 대한 발굴조사를 진행하여 정면 3칸, 측면 3칸 규모의 서향 건물지가 확인되었음
- 1990년부터 2003년까지 7차례에 걸친 발굴조사를 했고, 2004년부터 2012년까지 8차 조사를 진행하였음
- 1991년에는 석탑 실측조사를 실시하여 탑이 9층이었을 가능성이 언급되었음

- 2015년과 2017년, 2022년에 종합정비계획이 수립되었음
- 분황사는 현재 사원으로 기능하고 있으므로 조선 및 현대의 사원을 염두에 두고 현상 유지가 이루어지고 있음
- 구황동 원지와와의 관계성을 고려한 복원·정비계획이 고려되고 있음
- 수년간의 발굴조사로 분황사의 가람배치와 외곽 영역이 확인됨

2) 경주 분황사지 2025년 실적

(1) 발굴·연구

가. 경주 분황사지 복원건물 고증 연구(2차)

<표 2-13> 경주 분황사지 복원건물 고증 연구(2차)

구 분	내 용
사업기간	● 2024. 08. ~ 2025. 08.
사 업 비	● 5억원[2024년 예산(3억), 2025년 예산(2억)]
사업내용	● 분황사지 복원건물 고증을 위한 연구로드맵 수립

나. 경주 분황사지 복원건물 고증 연구(3차)

<표 2-14> 경주 분황사지 복원건물 고증 연구(3차)

구 분	내 용
사업기간	● 2025. 10. ~ 2026. 09.
사 업 비	● 5억원(2025년 예산)
사업내용	● 분황사지 중문 및 남회랑 건축복원 고증연구

(2) 복원·정비

가. 경주 분황사지 사찰지원시설(종무소)건립 시행

<표 2-15> 경주 분황사지 사찰지원시설(종무소)건립

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 11. ~ 2026. 06.
사업비	• 7.2억원(2025년 예산)
사업내용	• 종무소 건립을 위한 공사 시행

나. 경주 분황사지 주변정비 시행

<표 2-16> 경주 분황사지 주변정비 시행

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 02. ~ 2025. 12.
사업비	• 3.6억원(2025년 예산)
사업내용	• 화장실 건립

다. 경주 분황사지 관람편의시설(휴게시설) 관련 콘텐츠 구축

<표 2-17> 경주 분황사지 관람편의시설(휴게시설) 관련 콘텐츠 구축

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 10. ~ 2025. 12.
사업비	• 0.5억원(2025년 예산)
사업내용	• 경주 분황사지 관람편의시설(휴게시설) 관련 콘텐츠 구축

라. 경주 분황사지 관람편의시설(휴게시설) 설치

<표 2-18> 경주 분황사지 관람편의시설(휴게시설) 설치

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 09. ~ 2025. 12.
사업비	• 1.5억원(2025년 예산)
사업내용	• 경주 분황사지 관람편의시설(휴게시설) 설치

4. 경주 구황동 원지 유적 일원

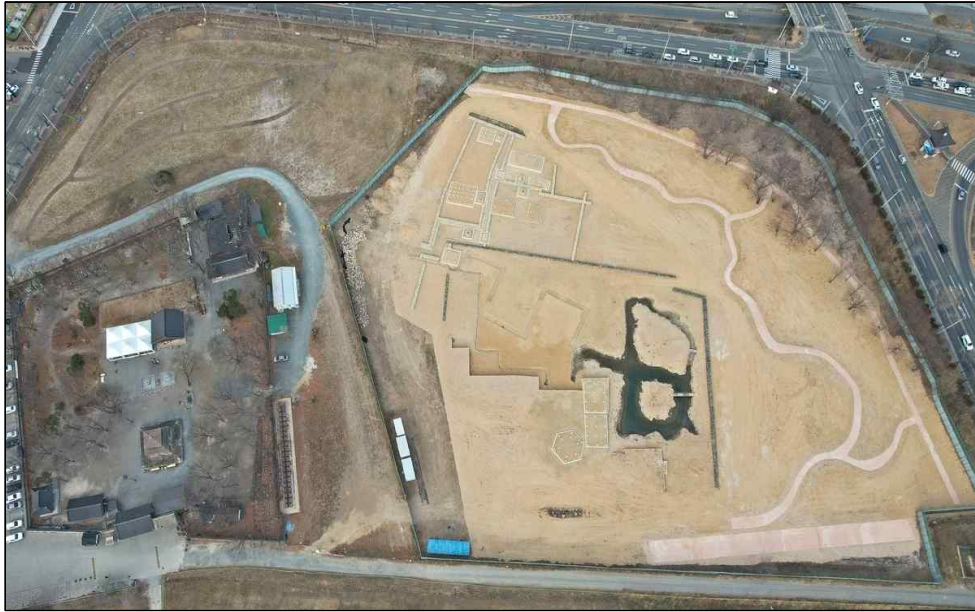


사진 4. 경주 구황동 원지 유적 일원 전경

1) 주요 성과

- 1999년 5월부터 1999년 10월까지 시굴조사, 1999년 11월부터 2004년 3월까지 이루어진 발굴조사 결과 동궁과 월지, 용강동 원지에 이어 신라왕경의 세 번째 원지 유적으로 확인되었음
- 연못을 중심으로 입수로, 배수로, 담장, 축대, 건물지 등이 조화를 이루고 있는 정원 유적으로, 신라왕경에서 발견된 원지라는 희소성으로 인해 국가지정문화유산 사적으로 지정되었음
- 2013년 복토위주의 정비가 있었으며, 2021년 종합정비계획을 수립하고 정비를 위한 실시설계를 시행하였음
- 2022년 실시설계가 승인되어 2023년 정비공사가 착공되었으며, 2025년 현재 1차 정비공사가 완료되었음

2) 경주 구황동 원지 유적 일원 2025년 실적

(1) 복원·정비

가. 경주 구황동 원지 유적 일원 정비

<표 2-19> 경주 구황동 원지 유적 일원 정비

구 분	내 용
사업기간	• 2022. 12. ~ 2025. 11.
사 업 비	• 10억원(2025년 10억)
사업내용	• 종합정비계획 1단계 사업(연못호안, 축대, 담장, 수로, 건물지 유구표시, 주변정비 등) • 경주 구황동 원지 유적 일원 경관조명 설치

5. 경주 미탄사지 삼층석탑



사진 5. 경주 미탄사지 삼층석탑 전경

1) 주요 성과

- 1980년 국립경주박물관에서 실시한 미탄사지 삼층석탑 발굴조사 결과, 금동불입상, 수정제 장식 등을 확인하였으며, 석탑과 석등 하대석, 간주석을 현재 자리로 복원하였음
- 2013년 ~ 2014년 중요 폐사지 시·발굴조사 사업의 일환으로 실시한 미탄사지 삼층석탑 주변 시굴조사 결과 미탄사임을 확인할 수 있는 ‘味呑’명 명문와가 출토되었음
- 2018년 ~ 2020년 3차에 걸쳐 미탄사지 삼층석탑 보존정비계획 수립을 위한 주변 (조사면적 10,500㎡) 발굴조사를 실시한 결과, 추정 건물지 19동, 도로, 담장, 배수로 등, 금동대좌, 쌍조문 장식, ‘丁巳翫陵’명 암기와, 인화문 유개완, 무악식 암막새, 쌍록보상화문전 등의 유물이 출토되었음
- 특히 2020년에 실시한 미탄사지 삼층석탑 북편 발굴조사구역(3차) 3,000㎡는 미탄사 폐사와 관련된 고려시대 후기층, 미탄사 창건과 관련된 통일신라시대 문화층에 대한 조사가 이루어졌음

- 2021년 경주 미탄사지 삼층석탑 주변 정비사업 부지 내 유적 4차 정밀발굴조사에는
기 실시한 석탑 북편 발굴조사구역(3차) 3,000㎡의 하층인 미탄사 창건 이전 층에
대한 추가 조사가 이루어졌음
- 2022년 ~ 2023년 경주 미탄사지 삼층석탑 주변정비사업 부지 내 유적 5차 정밀발굴
조사(조사면적 4,280㎡)는 기 실시한 4차 정밀발굴조사 구역 북쪽 일대이며, 그
결과, 건물지 11동 및 원지, 우물, 담장, 인화문 토기편, 연화문 수막새 등의 유물이
출토되었음
- 2022년 12월부터 2024년 12월까지 경주 미탄사지 종합정비계획이 수립됨

2) 경주 미탄사지 삼층석탑 2025년 실적

(1) 복원·정비

가. 경주 미탄사지 종합정비 실시설계 용역

<표 2-20> 경주 미탄사지 종합정비 실시설계 용역

구 분	내 용
사업기간	● 2025. 5. ~ 2025. 12.
사업비	● 1.5억원
사업내용	● 미탄사지 종합정비 실시설계 용역 시행

6. 경주 동궁과 월지



사진 6. 경주 동궁과 월지 전경

1) 주요 성과

- 1975 ~ 1976년 경주고적발굴조사단에서 실시한 안압지 및 주변 건물지 발굴조사 결과 대형연지(동서200m, 남북 180m), 주변 건물지 31동, 담장지 9동을 확인하였고, 1980 ~ 1981년 안압지 주차장 부지 발굴조사 결과 대형 건물지를 확인함
- 1970 ~ 1980년대 발굴조사 결과를 토대로 정비를 위한 토지매입과 연못 정비, 1·3·5호 건물지 복원, 전통조경 정비 등 경역 내 복원·정비 사업을 실시함
- 2007 ~ 2017년 국립경주문화재연구소에서 실시한 II-가지구, II-나지구 발굴조사 결과, 동궁 내 중복 양상을 띤 대형 건물지, 담장, 화장실, 창고, 우물 등 생활 및 부속시설이 확인, 더불어 동궁 축조 이전의 도시기반시설(도로 등)과 건물지 및 부속 시설 등이 확인되어 동궁 축조 이전의 모습을 추정하게 되었음
- 2007년 이후 발굴조사 결과를 토대로, 2012년 체계적인 정비를 위한 종합정비기본 계획 수립, 2016 ~ 2019년 서편 건물지 복원을 위한 설계를 실시, 동궁과 월지 야간 경관을 조성하여 운영시간을 확대함으로써 관람서비스 개선을 도모하였음

- 2018 ~ 2019년 서편 건물지 복원을 위한 심화 연구를 목적으로 I 지구(서편 건물지) 발굴조사를 실시한 결과 A건물지 규모와 남북편 출입시설이 확인되었고, 기단 축조 방법과 동·서편 익랑의 내부를 알게 되었음
- 2021년 동궁과 월지 조사연구 마스터플랜을 수립하여 기존 연구 성과를 종합 분석하고 이를 바탕으로 중장기적 관점의 조사연구 방향을 제시하였으며, 동편의 정밀 발굴조사를 지속하고 있음
- 동궁과 월지 북편(보호구역)의 신라왕경 방에 대하여, 2016년 타당성 조사 및 기본계획을 수립하였고 정비를 위한 토지매입 및 지하물리탐사를 완료하였음

2) 경주 동궁과 월지 2025년 실적

(1) 발굴·연구

가. 경주 동궁과 월지 발굴조사 및 학술연구

<표 2-21> 경주 동궁과 월지 발굴조사 및 학술연구

구 분	내 용
사업기간	● 2019. 10. ~ 2025. 12.
사업비	● 86억원(2025년 집행완료)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ● 동궁과 월지 동편 발굴조사 진행 및 서편 A건물지 발굴조사 보고서 발간 ● 경주 동궁과 월지 '나'지구 출토 신각단화쌍조문금박 기자간담회 및 특별전시 개최 ● 세계유산 신라왕경 보호 관리에 대한 5가지 접근 학술대회 개최 ● 세계유산 신라왕경 관리체계 및 활용방안 수립 연구보고서 발간 ● 동궁과 월지 유적 문화유산 고고물리탐사 조사 용역 추진 ● 신라왕경 내 내도랑 및 불교시설[내불당(추정 천주사)]의 실체복원 연구 완료 ● 일제강점기 신라왕경 조사 연구 보고서 발간 ● 신라왕경 출토 유물 표준형식 설정 연구 완료 ● 경주 동궁과 월지 유적 퇴적환경 분석 연구 완료 ● 2022년 국제문화재산업전 동궁과 월지 발굴조사 성과 홍보 부스 운영 ● 동궁과 월지 발굴조사, 학술연구 보고서 발간 ● 동궁과 월지 서편 나지구 시굴조사 및 시굴완료 구역 발굴조사 ● 동궁과 월지 방문자센터 건립 예정부지 시굴조사 ● 신라왕경 도시구조 복원 및 동궁과 월지 관련 학술대회 개최

(2) 복원·정비

가. 신라왕경 방 정비사업 시행

<표 2-22> 신라왕경 방 정비사업 시행

구 분	내 용
사업기간	• 2023. 12. ~ 2026. 06.
사업비	• 70.1억원(2025년 9.8억, 2024년 이월 33.7억, 2023년 이월 26.6억)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 건축, 기계, 토목, 조정공사(편의시설 1개동, 배수로 설치, 탐방로 조성, 잔디식재 등) • 전기공사(편의시설 조명공사, 외부 보안등 및 가로등 공사 등) • 통신공사(CCTV설치 및 제어기 설치공사 등) • 소방공사(편의시설 내 소방공사) • 신라왕경 방 정비·활용사업 책임감리 용역

(3) 활용

가. 경주 동궁과 월지 야간 개장 및 운영

<표 2-23> 경주 동궁과 월지 야간 개장 및 운영

구 분	내 용
사업기간	• 상시 운영 (9:00 ~ 22:00)
사업비	• 경주시 자체예산
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 신라 왕경의 핵심 유적으로 관람시간 확대 운영하여 관람만족도 제고 • 경역 내 연못 및 탐방로 정비, 야간 경관 조성 등 야간 관람 환경에 맞춘 복원정비 사업을 마련하여 야간 운영 실시

나. 경주 동궁과 월지(연꽃단지) 야간경관 기본 콘텐츠 제작 및 디자인 용역

<표 2-24> 경주 동궁과 월지(연꽃단지) 야간경관 기본 콘텐츠 제작 및 디자인 용역

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 09. ~ 2024. 11.
사업비	• 0.19억원(2023년 이월)
사업내용	• 경주 동궁과 월지(연꽃단지) 야간경관 기본 콘텐츠 제작 및 디자인 용역 완료

다. 경주 동궁과 월지 야간경관조명 정비사업 (연꽃단지)

<표 2-25> 경주 동궁과 월지 야간경관조명 정비사업 (연꽃단지)

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 04. ~ 2025. 10.
사업비	• 15억원(2024년 7.7억, 2023년 이월 7.3억)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 경주 동궁과 월지(연꽃단지) 디지털 야간경관 콘텐츠 제작 및 시스템 구축 용역 시행 • 경주 동궁과 월지 야간경관조명 정비공사(연꽃단지) 실시설계용역 시행 • 경주 동궁과 월지 야간경관조명 정비공사(연꽃단지) 착공 및 준공

라. 경주 동궁과 월지 야간경관조명(전각 및 호안석축) 실시설계용역

<표 2-26> 경주 동궁과 월지 야간경관조명(전각 및 호안석축) 실시설계용역

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 09. ~ 2025. 12.
사업비	• 0.19억원(2023년 이월)
사업내용	• 경주 동궁과 월지 야간경관조명(전각 및 호안석축) 실시설계용역 시행

마. 경주 동궁과 월지 임시주차장 정비사업

<표 2-27> 경주 동궁과 월지 임시주차장 정비사업

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 11. ~ 2025. 10.
사업비	• 16억원(2025년, 외교부)
사업내용	• 동궁과 월지 임시주차장 실시설계 및 정비공사 시행

바. 경주 동궁과 월지 관람편의시설 정비사업

<표 2-28> 경주 동궁과 월지 관람편의시설 정비사업

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 10. ~ 2025. 10.
사업비	• 5억원(2025년)
사업내용	• 동궁과 월지 관람편의시설 설계 및 정비공사 시행

사. 신라왕경 방 활용 및 교육방안 수립 용역

<표 2-29> 신라왕경 방 활용 및 교육방안 수립 용역

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 12. ~ 2025. 12.
사업비	• 1.786억원(2024년 1.9억)
사업내용	• 신라왕경 방 활용 및 교육방안 수립 용역 시행

7. 경주 첨성대



사진 7. 경주 첨성대 전경

1) 주요 성과

- 1962년 12월부터 1963년 1월 31일까지 실측조사가 이루어졌으며, 2009년 첨성대 훼손도 조사를 실시하였음
- 첨성대 주변의 발굴조사는 1985년 이루어졌는데 통일신라시대 건물지와 관련된 적심과 대호 매납 시설 3기가 확인되었고, 1992년 첨성대 남편 부지 조사결과 건물지 34개소가 확인되었음
- 첨성대 일원은 동부사적지대에 속해 있으며 관람을 위한 보행로가 정비되어 있으며 꽃밭이 조성되어 있음
- 첨성대의 구조연구와 안전점검을 통해 지속적인 모니터링(안전진단)을 시행하고 있음
- 2025년 9월 첨성대 주변 노후된 안내소 및 담장, 안내판 정비를 통해 주변 경관 개선을 하였음

2) 경주 첨성대 2025년 실적

(1) 복원·정비

가. 경주 첨성대 주변 안내소 보수

<표 2-30> 경주 첨성대 주변 안내소 보수

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 01. ~ 2025. 09.
사업비	• 0.7억원(2025년 집행완료)
사업내용	• 노후 안내소 정비 및 안내판 보수

나. 경주 첨성대 관람환경시설 기본계획 수립 및 설계

<표 2-31> 경주 첨성대 관람환경시설 기본계획 수립 및 설계

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 01. ~ 2026. 6.
사업비	• 1.07억원(2025년 집행완료)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 첨성대 주변 관람편의시설 정비방안 • 홍보 영상관 신축 검토 • 전문관련 콘텐츠 및 디지털 기술을 활용한 체험 프로그램 구상 (전시, 영상 등)

8. 경주 대릉원 일원



사진 8. 경주 대릉원 일원 전경

1) 주요 성과

- 대릉원 일원 내의 고분은 1909년 황남동 남총(145호분)을 시작으로 공식적인 발굴 조사가 이루어졌음
- 1920년대에는 금관총(128호분)과 금령총(127호분) 등 노서동과 노동동에 분포한 대형 고분에 조사가 집중된 반면, 1930년대에는 황남동 109호분을 비롯해 황남동과 황오동에 위치한 고분이 주로 발굴되었음
- 광복 이후에는 호우총(140호분)과 은령총(139호분), 쌍상총(37호분), 마총(133호분) 등이 발굴되었으며, 이 과정에서 대릉원 일원에는 적석목곽분과 더불어 석실분이 존재한다는 사실이 재차 확인됨
- 1971년 경주관광종합개발계획에 의해 천마총과 황남대총이 조사되었으며, 대릉원을 둘러싼 담장과 도로가 조성된 계림로와 미추왕릉지구를 중심으로 발굴이 진행되었음
- 당시 조사한 고분 가운데 황남동 110호분은 신라 적석목곽분 연구에 중요한 위치를 차지하며, 계림로 14호분에서는 서역계 장식보검이 출토되었음

- 1970년대 쪽샘지구 내 고분을 조사한 결과 황남동과 노동동 등의 중심 고분군보다는 위계가 낮지만 중소형 고분군이 일정한 묘역을 갖추고 있음이 확인되었음
- 경주 대릉원은 국내에서 고분군을 공원으로 조성한 첫 번째 사례로 시민들과 관람객들의 휴식공간으로 이용되고 있음
- 2007년부터 이루어진 쪽샘지구 조사는 14개 지구로 구분하여 분포조사가 진행 중이며, 조사 결과 개별 고분군의 위치와 규모가 확인되었음
- 특히 쪽샘지구 C10호분에서는 신라 중장기병의 존재를 알려주는 마갑과 마주, 찰갑이 출토되어 당시 마갑, 마주의 제작기술 및 착장 방법을 알 수 있게 되었음
- 쪽샘지구를 조사하기에 앞서 쪽샘지구에 살던 주민들의 생활 모습을 조사기록한 민속조사를 실시함
- 2015년부터 시작된 금관총, 서봉총, 금령총 등의 재발굴조사를 통해 일제강점기에 발굴된 고분 조사의 문제점을 확인하였고, 적석목곽분의 구조와 제의 양상을 규명할 수 있는 새로운 자료가 확보되었음
- 1976년 천마총의 내부 공개시설 준공 및 2018년 리모델링을 실시하였음
- 대릉원 일원 내 고분의 봉분 기저부를 복원하였음
- 2014년 국내 최초로 고분의 발굴 과정을 관람할 수 있는 쪽샘유적발굴관(44호분)을 건립, 운영하고 있음
- 사유지와 민가의 매입, 정비를 통해 대릉원 일원의 환경이 꾸준히 개선되었음
- 관광객의 편의 증진을 위해 임시주차장 2개소 설치(황남지구, 쪽샘지구)
- 경주시 도심고분공원 기본조사, 경주 대릉원 일원 고분 자료집성 및 분포조사를 실시하고 보고서를 간행하였음
- 2022년 금관총 보존전시공간을 준공하고 2023년 고분정보센터를 준공하였음
- 2018년부터 대릉원 일원 남쪽 가장자리에 위치한 미발굴 대형고분 황남동 120호분 조사를 수행하여, 120호, 120-1호, 120-2호, 1호 목곽묘 등이 차례로 조사되었음
- 2025년 황남동 120호분 1호 목곽묘 주곽에서 금동투조장식, 금귀걸이, 주인공 치아 등이, 부곽에서 철제투구, 찰갑, 마주, 마갑 일체가 출토되었음

2) 경주 대릉원 일원 2025년 실적

(1) 발굴·연구

가. 경주 대릉원 일원 쪽샘지구 분포조사 및 정밀학술발굴조사

<표 2-32> 경주 대릉원 일원 쪽샘지구 분포조사 및 정밀학술발굴조사

구 분	내 용
사업기간	• 2007. 03. ~ 2025. 12.
사업비	• 30.5억원(2025년)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 쪽샘 J지구 신라고분 분포·발굴조사 • 연구소-대학 공동발굴조사(K지구) • 쪽샘 44호 적석목곽묘 축조 실험 • 쪽샘 44호 적석목곽묘 건축공학적 분석 • 쪽샘 41호 적석목곽묘 출토 유물·유기물 분석 • 황오·인왕지구 분포·발굴조사 • 쪽샘 K지구 발굴조사 보고서 발간 • 황남대총 남분 자료집 발간 • 천마총 좌담회 자료집 발간

나. 경주 황남동 120호분 주변 정밀발굴조사

<표 2-33> 경주 황남동 120호분 주변 정밀발굴조사

구 분	내 용
사업기간	• 2018. 05. ~ 2026. 12.
사업비	• 11.06억원(2025년)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 황남동 120호분 정밀발굴조사 및 유물 보존처리 • 발굴현장 공개 및 성과보고회 개최

(2) 복원·정비

가. 경주 대릉원 일원 내 토지 및 지장물 매입

<표 2-34> 경주 대릉원 일원 내 토지 및 지장물 매입

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 01. ~ 계속
사업비	• 11.28억원 (2024년 이월 4.48억, 2025년 예산 6.8억원)
사업내용	• 토지 및 지장물 매입, 정비

나. 경주 대릉원 일원 예초

<표 2-35> 경주 대릉원 일원 예초

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 04. ~ 2025. 12.
사업비	• 3.3억원(2025년)
사업내용	• 경주 대릉원 일원 내 예초 실시

다. 금관총 및 고분정보센터 일원 정비 실시설계 용역

<표 2-36> 금관총 및 고분정보센터 일원 정비 실시설계 용역

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 05. ~ 2025. 07.
사업비	• 0.16억원
사업내용	• 금관총 및 고분정보센터 일원 정비 실시설계 용역 시행

라. 금관총 및 고분정보센터 일원 정비공사

<표 2-37> 금관총 및 고분정보센터 일원 정비공사

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 08. ~ 2025. 11.
사업비	• 1.44억원
사업내용	• 금관총 앞 인도 정비 • 금관총 및 고분정보센터 내부 시설 등 보수

(3) 활용

가. 쪽샘유적발굴관 상시 공개 운영

<표 2-38> 쪽샘유적발굴관 상시 공개 운영

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 11. ~ 2026. 01.
사업비	• 경주 대릉원 일원 쪽샘지구 분포조사 및 정밀발굴조사 예산에 포함
사업내용	• 쪽샘지구 44호분 복원축조실험 현장 공개 및 전문 해설 서비스 제공

나. 금관총 및 고분정보센터 공개 운영

<표 2-39> 금관총 및 고분정보센터 공개 운영

구 분	내 용
사업기간	• 2023. 06. ~ 계속
사업비	• 경주시 자체 예산 추진
사업내용	• 금관총 및 고분정보센터 공개, 전문 해설 서비스 제공

다. 경주 쪽샘유적지구 관람편의시설 조성계획 수립 용역 시행

<표 2-40> 경주 쪽샘유적지구 관람편의시설 조성계획 수립 용역 시행

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 07. ~ 2025. 12.
사업비	• 0.9억원(선금 0.4억 집행완료)
사업내용	• 쪽샘유적지구 관람편의시설 조성계획 수립

라. 쪽샘44호분 보호각 개보수 기본설계 용역 시행

<표 2-41> 쪽샘44호분 보호각 개보수 기본설계 용역 시행

구 분	내 용
사업기간	• 2025 06 ~ 2026 06.
사업비	• 2.4억원(선금 1.68억 집행완료)
사업내용	• 쪽샘44호분 보호각 개보수 기본설계 용역 시행

9. 경주 동부사적지대



사진 9. 경주 동부사적지대 전경

1) 주요 성과

- 동부사적지대 발굴조사는 발천과 그 주변으로 이루어졌으며 1985년 조사 결과 통일신라시대 건물지 등이 확인되었음
- 1988년 ~ 1989년까지 계림 북편 건물지 조사, 1992년 ~ 1993년까지 첨성대 남편지 조사, 1994년 ~ 1995년까지 월성 북편 건물지 조사 등이 이루어졌으며, 발천 호안석축과 석교지가 정비되고 복원되었음
- 2015년~2020년까지 석교지 복원공사 부지 내 발굴조사 결과, 시기에 따라 발천과 월성해자가 변화된 것을 확인하였음
- 2019년 ~ 2024년까지 석교지 복원공사 부지 내 발굴조사에서 새로운 석축수로 및 석교지, 도로, 우물 등이 확인되었음
- 지금까지의 조사결과 동부사적지대는 월성 북쪽에 위치한 궁궐 관련시설 또는 관청시설이었던 것으로 추정됨
- 2020년 3월 “동부사적지대(발천) 정비기본계획” 수립 용역을 시작하여 현재까지 추진 중에 있으며 향후 정비방향에 따라 복원·정비할 계획임

2) 경주 동부사적지대 2025년 실적

(1) 발굴·연구

가. 경주 동부사적지대 발천유적 보존관리

<표 2-42> 경주 동부사적지대 발천유적 보존관리

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 08. ~ 2025. 07.
사업비	• 1.5억원(2024년 집행완료)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 발굴조사 완료 구간에 대한 복토 및 보존관리 • 제초 및 배수, 안내판 설치 등 현장 관리 • 발굴조사 현장자료의 정리

(2) 활용

가. 경주 동부사적지대 발천 고고자료 집성 및 학술대회

<표 2-43> 경주 동부사적지대 발천 고고자료 집성 및 학술대회

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 12. ~ 2026. 06.
사업비	• 1.5억원(2024년 1억, 2025년 0.5억 집행완료)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 경주 동부사적지대 일대 문헌기록 검토 및 역사학적 분석 • 경주 동부사적지대 고지형 분석과 기존 고지형 검토 • 경주 동부사적지대 주변의 고고학적 현황과 연구검토 • 학술대회 개최

(3) 복원·정비

가. 발천유적 석재유구 및 주변정비

<표 2-44> 발천유적 석재유구 및 주변정비

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 01. ~ 2025. 10.
사업비	• 1.0억원(2025년 예산)
사업내용	• 발천유적 석재유구 정비 및 주변정비

10. 경주 춘양교지와 월정교지



사진 10. 경주 춘양교지와 월정교지(복원된 월정교)

1) 주요 성과

- 월정교지는 1984년 11월에서 1985년 4월까지 교각을 중심으로 하상에 산재한 석재들을 조사하였으나 범위를 넓혀 조사하여야 복원설계가 가능하다는 판단으로 조사 범위가 확대되었음
- 1985년 11월에서 1986년 9월까지 월정교 교각 중심에서 상류 20m, 하류 60m 범위까지 2차 조사를 실시하였고, 1986년 3월에서 6월까지 월정교지 목조 유구 발굴조사, 3~4호 교각 사이 수습조사를 실시하였음
- 조사결과 발견된 석재 중 아치석이 발견되지 않았으며, 솟이 발견된 점으로 볼 때 교각은 석재, 상부구조는 목재로 추정하였음
- 월정교지에서는 4개의 교각과 남북 양쪽 교대를 확인하였고, 4호 교각과 남측 교대 사이의 하상에서 하상 시설물이 확인되었음
- 노출된 유구에 대해서 갈수기인 1986년 11월 20일에서 1987년 6월 30일까지 전면 발굴조사 하여 월정교의 모습은 교각 상면에 누각을 설치한 누교였을 것으로 추정하였음

- 월정교는 2016년 8월 교각·교대 복원, 2018년 4월 문루 복원을 완료하였고 2018년 10월 주변정비공사를 준공하였음
- 월정교는 복원되어 2019년부터 일반에 공개되고 있으며 주변 정비가 함께 이루어져, 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업의 첫 번째 가시적인 성과로서 의의를 가짐
- 춘양교지에 대한 조사는 2001년 1월에서 4월까지 시굴조사를 한 후 2002년 1월에서 2003년 4월까지 발굴조사를 하였음
- 조사결과 춘양교는 3개의 교각이 사용되었으며 교각과 교각 사이의 거리는 11m로 월정교와 동일한 모습임
- 춘양교지는 발굴조사 후 현상이 유지되고 있으며 주변에 석재보관 장소와 탐방로 정비 등이 이루어졌음
- 2019년 11월에서 2021년 3월까지 춘양교지 종합정비계획이 수립됨
- 2020년 12월에서 2021년 4월까지 경주 춘양교지와 월정교 주변 보수정비공사 시행하였음
- 2020년 12월에서 2021년 11월까지 춘양교지 석재유물 3D 정밀실측 및 유구노출 대행사업 시행하였음
- 2021년 12월에서 2022년 8월까지 춘양교지 관람편의시설 조성부지 내 정밀발굴조사를 시행하였음
- 2023년 7월에서 2023년 11월까지 춘양교지 관람편의시설 조성부지 내 임시주차장 조성을 완료하였음
- 2021년 11월에서 2023년 7월까지 2차례에 걸쳐 춘양교지 경관조명 설치 및 추가설치 사업을 시행하였음
- 2022년 10월에서 2023년 12월까지 춘양교지 3D 정밀실측 및 학술대회 대행사업을 시행하였음

2) 경주 춘양교지와 월정교지 2025년 실적

(1) 발굴연구

가. 경주 춘양교지 복원 연구 용역 시행

<표 2-45> 경주 춘양교지 복원 연구 용역 시행

구 분	내 용
사업기간	• 2023. 12. ~ 2025. 10.
사업비	• 1억원(2023년 집행완료)
사업내용	• 춘양교지 석재의 3D실측 결과물에 대한 분석 및 국내외 사례연구 • 문헌 분석을 통한 춘양교지 원형 연구

(2) 복원정비

가. 경주 춘양교지 환경정비(잔디깎기 등) 실시

<표 2-46> 경주 춘양교지 환경정비(잔디깎기 등) 실시

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 04. ~ 2025. 12.
사업비	• 0.72억원
사업내용	• 월정교지 및 춘양교지 예초 작업

나. 경주 춘양교지 토지보상 대행용역

<표 2-47> 경주 춘양교지 토지보상 대행용역

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 02. ~ 2026. 2.
사업비	• 0.14억원
사업내용	• 춘양교지 미매입 토지 보상용역 (7필지/ A=3,666m ²)

11. 경주 인왕동사지



사진 11. 경주 인왕동사지 전경

1) 주요 성과

- 2002년부터 2011년까지 4차에 걸쳐 발굴조사를 실시하여 인왕동사지의 영역이 파악되었음
- 조사결과 탐지와 전각 배치가 확인되었음
- 발굴 조사된 유적의 현상 유지 및 원형 보존을 위해 복토하여 보존 조치함
- 2013년 10월 유적정비 기본계획이 수립됨
- 2023년부터 2025년까지 경역정비(주요건물지, 탐방로, 주차장) 시행됨
- 2025년부터 동·서 석탑 복원 진행 및 유적정비 심화연구 수립 중

2) 경주 인왕동사지 2025년 실적

(1) 복원·정비

가. 경주 인왕동사지 유적정비 심화연구 용역 시행

<표 2-48> 경주 인왕동사지 유적정비 심화연구 용역 시행

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 09. ~ 2026. 05.
사 업 비	• 1.5억원(2025년 예산)
사업내용	• 경주 인왕동 사지 복원 정비안 마련, 석탑 복원 실시설계

나. 경주 인왕동사지 주변정비공사 시행

<표 2-49> 경주 인왕동사지 주변정비공사 시행

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 01. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 3.0억원(2025년 예산)
사업내용	• 경주 인왕동사지 주변정비(야간조명 설치, 유구보호시설 도색, 수목식재, CCTV설치 등)

다. 경주 인왕동사지 경역정비공사 시행

<표 2-50> 경주 인왕동사지 경역정비공사 시행

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 01. ~ 2025. 12.
사 업 비	• 2.0억원(2025년 예산)
사업내용	• 경주 인왕동사지 경역정비(건물지 정비, 유구보호시설 설치 등)

12. 경주 천관사지



사진 12. 경주 천관사지 전경

1) 주요 성과

- 2000년부터 2018년까지 사지 내외곽에 대한 4차례의 발굴조사를 실시하였음
- 조사결과 사역의 중심시설과 사찰 건립 이전의 생활시설 및 부속시설 등이 확인되었음
- 발굴조사 결과를 토대로 2015년 종합정비계획, 2016년 경역정비 실시설계가 수립됨
- 2017년부터 2022년까지 천관사지 팔각석탑 복원 및 농로 이설 등 경역 정비가 이루어짐

2) 경주 천관사지 2025년 실적

(1) 복원·정비

가. 경주 천관사지 환경정비(잔디깎기 등) 실시

<표 2-51> 경주 천관사지 환경정비(잔디깎기 등) 실시

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 04. ~ 2024. 10.
사업비	• 0.3억원(2025년 예산)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 예초(배부식) A=8,657.0m² • 잔디깎기(핸드가이드식) A=10,506.0m² • 임목폐기물 운반 및 처리

나. 경주 천관사지 경역정비 실시설계 용역

<표 2-52> 경주 천관사지 경역정비 실시설계 용역

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 11. ~ 2025. 09.
사업비	• 0.2억원(2024년 이월 0.2억)
사업내용	• 경주 천관사지 경역정비 실시설계용역 시행

13. 경주 낭산 일원



사진 13. 경주 낭산 일원 전경

1) 주요 성과

- 경주 낭산은 신라시대 신성한 장소인 신유림(神遊林)으로 전해진 신라 왕경의 진산(鎭山)으로 낭산 내에는 신라의 주요 유적이 밀집분포하고 있음
- 낭산에 대한 최초의 조사는 일제강점기의 지표조사였음. 조사 결과는 『조선고적도보』 5권에 <낭산 석조보살상>을 수록(조선총독부, 1917)하였고, 이후 1937년 조사한 능지탑과 십이지신상이 부조된 면석들에 대해 소개되었음(「第七 慶州に於ける新羅一統時代遺構址の調査」). 이 외에도 사천왕사지, 황복사지 등에 대한 조사가 이루어졌고, 사천왕사지 서탑지는 일부가 발굴조사 되었음
- 일제강점기에 이루어진 황복사지 조사에서 1926년 십이지신상 면석, 1937년 황복(皇福), 왕복(王福)명 기와가 확인되었으며, 1942년 석탑해체 수리 중, 2층 옥개석 상부에서 사리구와 발원문이 발견되면서 신라왕실과의 관계가 주목 받았음
- 1960 ~ 1970년대 신라삼산오악조사단에서 낭산 일대에 대한 지표조사를 실시하였고, 1969년부터 1971년까지 능지탑지에 대한 4차례의 조사를 실시한 후, 1975년에 해체·발굴을 실시하였음

- 1979년에 기단부는 한 변의 길이가 12m, 높이가 1m인 석단으로, 상부의 낙수면은 흙으로 덮고 잔디를 심는 방식으로 마감, 둘레의 중대석에는 12지상 9구를 방위에 맞추어 같은 간격으로 기둥처럼 배치하여 현 모습으로 복원하였으나, 조사결과가 반영되지 않아 잘못된 복원의 사례로 지적되기도 함
- 황복사지 삼층석탑은 국보 제37호로 지정(1962. 12. 20.)되었으며, 경주 낭산 일원은 사적 제163호로 지정(1968.12.13.)됨
- 1982 ~ 1985년에는 『신라낭산유적조사』를 통해 낭산에 산재한 대부분의 유적에 대한 현황 및 실측조사가 이루어졌음
- 2010년 발굴조사계획, 동선정비·식재정비주차장 신설계획 등을 포함한 ‘경주 낭산 종합정비 기본계획’을 수립하였음
- 2016 ~ 2020년까지 황복사지 사·발굴조사가 실시, 2016 ~ 2017년 동편 왕릉에 사용된 것으로 추정되는 지대석·갑석 등의 석재가 수습되었으며, 2018 ~ 2020년 사역을 구획하는 도로, 사역 내부 건물지, 연못 등 140여기의 유구가 조사되었음
- 낭산에 대한 종합적인 조사 및 정비를 위한 사유지와 민가의 매입을 지속적으로 추진하고 있음

2) 경주 낭산 일원 2025년 실적

(1) 발굴·연구

가. 경주 낭산 일원 석조유산 현황조사 및 분석연구

<표 2-53> 경주 낭산 일원 석조유산 현황조사 및 분석연구

구 분	내 용
사업기간	● 2024. 09. ~ 2025. 10.
사 업 비	● 1.5억원(2024년 집행완료)
사업내용	● 경주 낭산 일원 석조유산 기초 현황조사 ● 암질 분석 및 3D스캐닝을 통한 석재 형식 및 양식 자료조사 ● 경주 능지탑지 일원 시굴조사

나. 경주 낭산 일원 시굴조사 및 기초학술조사

<표 2-54> 경주 낭산 일원 시굴조사 및 기초학술조사

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 06. ~ 2026. 04.
사 업 비	• 6.5억원(2025년)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 경주 능지탑지 일원 시굴 연장조사 및 정밀발굴조사 • 경주 능지탑지 콜로키움 개최 및 기초자료보고서 발간 • 경주 낭산 마을조사

(2) 복원·정비

가. 경주 낭산 일원 국가유산 정비 가이드라인 수립

<표 2-55> 경주 낭산 일원 국가유산 정비 가이드라인 수립

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 12. ~ 2025. 05.
사 업 비	• 1.5억원(2024년)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 경주 낭산 일원 내 국가유산의 현황조사 및 정비실태 분석 • 경주 낭산 일원 내 국가유산의 보존 및 정비 방안 제시

나. 경주 낭산 일원 세부정비계획 수립

<표 2-56> 경주 낭산 일원 세부정비계획 수립

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 09. ~ 2026. 08.
사 업 비	• 4.5억원(2025년)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 경주 낭산 일원 기반 연구 및 정비 연구 • 탐방 클러스터 조성계획 수립 • 토지매입구역 우선순위 선별 • 전문가 토론회 개최 및 의견 수렴

다. 경주 낭산 일원 내 토지 및 지장물 매입

<표 2-57> 경주 낭산 일원 내 토지 및 지장물 매입

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 01. ~ 2025. 12.
사 업 비	• 38.8억원(2024년 이월 0.3억, 2025년 38.5억)
사업내용	• 경주 낭산 일원 내 토지 및 지장물 보상(26필지/27,129㎡) • 이사비 및 손실보상금 지급

라. 경주 낭산 일원 매입구역 정비(지장물 철거 등)

<표 2-58> 경주 낭산 일원 매입구역 정비(지장물 철거 등)

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 01. ~ 2025. 12.
사 업 비	• 6억원(2025년)
사업내용	• 경주 낭산 일원 내 매입구역 지장물 철거 • 경주 황복사지 일원 예초 • 경주 낭산 진입로 포장공사 시행 • 경주 낭산 독서당 계단 보수공사 시행 • 경주 선덕여왕릉 진입로 보수공사 시행

마. 경주 낭산 일원 재선충 방제 및 고사목 제거

<표 2-59> 경주 낭산 일원 재선충 방제 및 고사목 제거

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 10. ~ 2025. 12.
사 업 비	• 0.42억원(2025년)
사업내용	• 경주 낭산 일원 소나무 재선충병 예방주사 • 경주 낭산 일원 소나무 고사목 제거

바. 경주 선덕여왕릉 CCTV 설치

<표 2-60> 경주 선덕여왕릉 CCTV 설치

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 10. ~ 2025. 12.
사 업 비	• 0.5억원(2025년)
사업내용	• 경주 선덕여왕릉 일원 CCTV 설치 공사 시행

(3) 활용

가. 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 정사모자이크·3차원 실사 지형모델 제작

<표 2-61> 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 정사모자이크·3차원 실사 지형모델 제작

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 11. ~ 2025. 04.
사 업 비	• 0.1억원(2024년 집행완료)
사업내용	• 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 무인항공촬영 및 3D지형도 제작

나. 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 안내 플랫폼 제작

<표 2-62> 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 안내 플랫폼 제작

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 12. ~ 2025. 07.
사 업 비	• 0.1억원(2024년 집행완료)
사업내용	• 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 디지털 사진 촬영 및 유리건판 제작 • 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 안내 웹사이트 제작

다. 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 기록·홍보 영상 제작

<표 2-63> 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 기록·홍보 영상 제작

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 12. ~ 2025. 07.
사업비	• 0.1억원(2024년 집행완료)
사업내용	• 신라왕경 핵심유적 사업 10년간 주요 성과 및 출토 유물·유적 관련 영상 기록

14. 경주 사천왕사지



사진 14. 경주 사천왕사지 전경

1) 주요 성과

- 일제강점기인 1915년과 1916년에 서탑지 조사 및 녹유신장벽전, 녹유능현전(천조형전, 千鳥形塙) 등을 수습하였고, 일본의 『考古學雜誌』에 수록됨
- 1922년 실시된 <고적조사사업>의 일환으로 금당지, 탑지 등에 대한 유구 실측과 토단 위에 있는 초석, 동탑지의 노반석(이형석재)도 실측이 이루어짐
- 1963년 1월 21일 경주 사천왕사지는 사적으로 지정됨
- 1982 ~ 1985년 『신라낭산유적조사』를 통해 사천왕사지에 대한 전체적인 측량 조사(평판 실측) 실시, 귀부당간지주 등 석조물에 대한 실측도 작성 및 사진 촬영 등의 기록 작업을 실시함
- 2006 ~ 2012년까지 발굴조사 결과, 금당지동, 서목탑지(추정)단석지·강당지·익랑, 회랑지·석교자귀부(2기)가 확인되었음. 동서목탑의 기단부 4면에 모두 24점(동서목탑 총 48점)이 배치된 것을 확인함
- 녹유신장벽전에 대한 도안 이미지 특허청 등록(2013) 및 복원(2015), 복원 기념 전시회(2018)를 개최함

- 2015년 사천왕사지 동남쪽 임시 주차장 부지 시굴조사를 실시하여 수로 및 담장, 암거시설 등을 확인하였고, 2017년 관람객 편의를 위한 임시주차장을 조성함
- 2017년 『경주 사천왕사지 종합정비기본계획』 수립, 2018년 『경주 사천왕사지 보존 정비와 활용』 학술대회 개최를 통해 유적 조사 성과를 통해 보존 정비, 활용, 역사콘텐츠 개발 방안에 대한 종합적인 고찰을 진전시킴
- 2022년 경주 사천왕사지 서탑(녹유신장벽전 포함)을 복원함

2) 경주 사천왕사지 2025년 실적

(1) 복원·정비

가. 경주 사천왕사지 경역 정비공사 시행

<표 2-64> 경주 사천왕사지 경역 정비공사 시행

구 분	내 용
사업기간	● 2025. 02. ~ 2026. 06.
사 업 비	● 6.0억원(2025년 예산)
사업내용	● 경주 사천왕사지 배수로 정비계획

나. 경주 사천왕사지 금당지 기단 정비공사 실시설계 시행

<표 2-65> 경주 사천왕사지 금당지 기단 정비공사 실시설계 시행

구 분	내 용
사업기간	● 2024. 09. ~ 2025. 12.
사 업 비	● 1.0억원(2024년 0.68억, 2025년 0.32억)
사업내용	● 사천왕사지 금당지 기단정비 실시설계 ● 사천왕사지 주변정비 공사

II 2025년 추진 사업 종합

<표 2-66> 2025년 추진 사업 종합

구 분	내 용	세부내용
경주 월성	<ul style="list-style-type: none"> 경주 월성 발굴조사 및 학술연구 	<ul style="list-style-type: none"> 월성 A지구(남성벽 및 건물지), C지구(내부 건물지 등) 정밀발굴조사 <ul style="list-style-type: none"> - A, C지구 정밀발굴조사 및 목간자료 비교연구 등 월성 관련 심화 연구 신라 금석문 자료 집성, 신라 표준연대기 수립 및 해자 출토 목부재 자료집 발간 월성 발굴조사 연구 성과 공개회 및 현장 개방 행사 개최 안정적인 연구 기반 구현을 위한 발굴조사 데이터 디지털 기록화 시스템 구축 국내외 홍보 및 학술대회 개최
	<ul style="list-style-type: none"> 경주 월성 지구 예초 	<ul style="list-style-type: none"> 경주 월성 지구 예초 실시
	<ul style="list-style-type: none"> 경주 월성 관람환경 시설 개선 송문대 진입로 정비 	<ul style="list-style-type: none"> 주요 탐방로 정비 및 수목정비, 편의시설 정비 등 진입로 확포장 및 인도개설
경주 황룡사지	<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사 남쪽담장 외곽 정비사업 부지 발굴 	<ul style="list-style-type: none"> 황룡사지 남쪽담장 외곽 도시유적 정밀 발굴조사 구역 유구 보존조치 학술대회 개최
	<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사 복원 10차 심화연구 	<ul style="list-style-type: none"> 중금당 모형 제작 및 중금당 및 불상 디지털 복원 콘텐츠 제작 강당 건축복원 고증연구, 관람환경 정비계획 수립, 중금당 학술대회 개최
	<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사 배수체계 개선 계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> 황룡사지 고지형 분석 및 현장 조사를 통한 효율적 배수체계 정비방안 수립
	<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사지 기록화 기초연구 	<ul style="list-style-type: none"> 황룡사지 관련 자료의 기록화 기초 작업

<표 2-66> 2025년 추진 사업 종합 (계속)

구 분	내 용	세부내용		
경주 황룡사지	복원 정비	• 경주 황룡사지 중심사역 기단정비	• 목탑자 중금당지(석조가구식기단), 강당지(장대석 외벌대 기단) 기단 정비 • 동서금당지·강당 동서편건물지·회랑지·종루지· 경루지(기단 경계표시) 기단 정비	
		• 경주 황룡사지 남쪽광장 정비사업	• 부지정비(마사토 포장), 담장 재현	
		• 황룡사역사문화관 전시실 개편	• 황룡사 역사문화관 2층 전시실 개편	
		• 경주 황룡사지 주변정비	• 황룡사지 일원 산책로 정비, 경관조명 유지보수, 예초 작업 등	
경주 분황사지	발굴 연구	• 경주 분황사지 복원건물 고증 연구(2차)	• 분황사지 복원건물 고증을 위한 연구로드맵 수립	
		• 경주 분황사지 복원건물 고증 연구(3차)	• 분황사지 중문 및 남회랑 건축복원 고증연구	
	복원 정비	• 경주 분황사지 사찰지원 시설(종무소)건립	• 종무소 건립을 위한 공사 시행	
		• 경주 분황사지 주변정비	• 화장실 건립	
		• 경주 분황사지 관람편의 시설(휴게시설) 관련 콘 텐츠 구축	• 분황사지 관람편의시설(휴게시설) 관련 콘텐츠 구축	
		• 경주 분황사지 관람편의 시설(휴게시설) 설치	• 분황사지 관람편의시설(휴게시설) 설치	
	경주 구황동 원지 유적 일원	복원 정비	• 경주 구황동 원지 유적 일원 정비	• 종합정비계획 1단계 사업(연못호안, 축대, 담 장, 수로, 건물지 유구표시, 주변정비 등) • 경주 구황동원지 유적 일원 경관조명 설치
			경주 미탄사지 삼층석탑	복원 정비

<표 2-66> 2025년 추진 사업 종합 (계속)

구 분	내 용	세부내용	
경주 동궁과 월지	발굴 연구	<ul style="list-style-type: none"> 경주 동궁과 월지 발굴조사 및 학술연구 	<ul style="list-style-type: none"> 동궁과 월지 동편 발굴조사 진행 및 서편 A건물지 발굴조사 보고서 발간 경주 동궁과 월지 '나지구' 출토 선각단화쌍조문금박 기자간담회 및 특별전시 개최 세계유산 신라왕경 보호 관리에 대한 5가지 접근 학술대회 개최 세계유산 신라왕경 관리체계 및 활용방안 수립 연구보고서 발간 동궁과 월지 유적 문화유산 고고물리탐사 조사 용역 추진 신라왕경 내 내도량 및 불교시설[내불당(추정 천주사)]의 실체복원 연구 완료 일제강점기 신라왕경 조사 연구 보고서 발간 신라왕경 출토 유물 표준형식 설정 연구 완료 경주 동궁과 월지 유적 퇴적환경 분석 연구 완료 2022년 국제문화재산업전 동궁과 월지 발굴조사 성과 홍보 부스 운영 동궁과 월지 발굴조사, 학술연구 보고서 발간 동궁과 월지 서편 나지구 시굴조사 및 시굴완료 구역 발굴조사 동궁과 월지 방문자센터 건립 예정부지 시굴조사 신라왕경 도시구조 복원 및 동궁과 월지 관련 학술대회 개최
	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 신라왕경 방 정비사업 시행 	<ul style="list-style-type: none"> 건축, 기계, 토목, 조경공사(편의시설 1개동, 배수로 설치, 탐방로 조성, 잔디식재 등) 전기공사(편의시설 조명공사, 외부 보안등 및 가로등 공사 등) 통신공사(CCTV설치 및 제어기 설치공사 등) 소방공사(편의시설 내 소방공사) 신라왕경 방 정비·활용사업 책임감리 용역
	활용	<ul style="list-style-type: none"> 경주 동궁과 월지 야간 개장 및 운영 경주 동궁과 월지(연꽃단지) 야간경관 기본 콘텐츠 제작 및 디자인 용역 	<ul style="list-style-type: none"> 신라 왕경의 핵심 유적으로 관람시간 확대 운영하여 관람만족도 제고 경역 내 연못 및 탐방로 정비, 야간 경관 조성 등 야간 관람 환경에 맞춘 복원정비 사업을 마련하여 야간 운영 실시 경주 동궁과 월지(연꽃단지) 야간경관 기본 콘텐츠 제작 및 디자인 용역

<표 2-66> 2025년 추진 사업 종합 (계속)

구 분	내 용	세부내용	
경주 동궁과 월지	활용	• 경주 동궁과 월지 야간경관조명 정비사업(연꽃단지)	• 경주 동궁과 월지(연꽃단지) 디지털 야간경관 콘텐츠 제작 및 시스템 구축 용역 시행 • 경주 동궁과 월지 야간경관조명 정비공사(연꽃단지) 실시설계용역 시행 • 경주 동궁과 월지 야간경관조명 정비공사(연꽃단지) 착공 및 준공
		• 경주 동궁과 월지 야간경관조명(전각 및 호안석축) 실시설계용역	• 경주 동궁과 월지 야간경관조명(전각 및 호안석축) 실시설계용역 시행
		• 경주 동궁과 월지 임시주차장 정비사업	• 경주 동궁과 월지 임시주차장 정비 실시설계용역 시행 • 경주 동궁과 월지 임시주차장 정비 착공 및 준공
		• 경주 동궁과 월지 관람편의시설 정비사업	• 경주 동궁과 월지 관람편의시설 정비 실시설계용역 시행 • 경주 동궁과 월지 관람편의시설 정비 착공 및 준공
		• 신라왕경 방 활용 및 교육방안 수립 용역	• 신라왕경 방 활용 및 교육방안 수립 용역 시행
경주 첨성대	복원 정비	• 경주 첨성대 주변 안내소 보수	• 노후 안내소 정비 및 안내판 보수
		• 관람환경시설 기본계획 수립 및 설계	• 첨성대 주변 관람편의시설 정비방안 • 홍보 영상관 신축 검토 • 천문관련 콘텐츠 및 디지털 기술을 활용한 체험 프로그램 구상(전시, 영상 등)
경주 대릉원 일원	발굴 연구	• 경주 대릉원 일원 쪽샘지구 분포조사 및 정밀학술발굴조사	• 쪽샘 J지구 신라고분 분포·발굴조사 • 연구소-대학 공동발굴조사(K지구) • 황오·인왕지구 분포·발굴조사 • 쪽샘 44호 적석목곽묘 축조 실험 • 쪽샘 44호 적석목곽묘 건축공학분석 • 쪽샘 41호 적석목곽묘 출토 유물·유기물 분석 • 쪽샘 K지구 발굴조사 보고서 발간 • 황남대총 남분 자료집 발간 • 천마총 좌담회 자료집 발간
		• 경주 황남동 120호분 주변 정밀발굴조사	• 황남동 120호분 정밀발굴조사 및 유물 보존처리 • 발굴현장 공개 및 성과보고회 개최
	복원 정비	• 경주 대릉원 일원 내 토지 및 지장물 매입	• 토지 및 지장물 매입, 정비
		• 경주 대릉원 일원 예초 • 금관총 및 고분정보센터 일원 정비 실시설계 용역 • 금관총 및 고분정보센터 일원 정비공사	• 경주 대릉원 일원 내 예초 실시 • 금관총 및 고분정보센터 일원 정비 실시설계 용역 시행 • 금관총 앞 인도 정비 • 금관총 및 고분정보센터 내부 시설 등 보수

<표 2-66> 2025년 추진 사업 종합 (계속)

구 분	내 용	세부내용	
경주 대릉원 일원	활용	• 쪽샘유적발굴관 상시 공개 운영	• 쪽샘지구 44호분 복원축조실험 현장 공개 및 전문 해설 서비스 제공
		• 금관총 및 고분정보센터 공개 운영	• 금관총 및 고분정보센터 공개, 전문 해설 서비스 제공
		• 경주 쪽샘유적지구 관람 편의시설 조성계획 수립 용역 시행	• 쪽샘유적지구 관람편의시설 조성계획 수립
		• 쪽샘44호분 보호각 개보수 기본설계 용역 시행	• 쪽샘44호분 보호각 개보수 기본설계 용역 시행
경주 동부사적지대	발굴 연구	• 경주 동부사적지대 발천 유적 보존관리	• 발굴조사 완료 구간에 대한 복토 및 보존관리 • 제초 및 배수, 안내판 설치 등 현장 관리 • 발굴조사 현장자료의 정리
	활용	• 경주 동부사적지대 발천 고고자료 집성 및 학술대회	• 경주 동부사적지대 일대 문헌기록 검토 및 역사학적 분석 • 경주 동부사적지대 고지형 분석과 기존 고지형 검토 • 경주 동부사적지대 주변의 고고학적 현황과 연구 검토 • 학술대회 개최
	복원 정비	• 발천유적 석재유구 및 주변정비	• 발천유적 석재유구 정비 및 주변정비
경주 춘양교지와 월정교지	발굴 연구	• 경주 춘양교지 복원 연구 용역 시행	• 춘양교지 석재의 3D실측 결과물에 대한 분석 및 국내외 사례연구 • 문헌 분석을 통한 춘양교지 원형 연구
	복원 정비	• 경주 춘양교지 환경정비 (잔디깎기 등) 실시	• 월정교지 및 춘양교지 예초 작업
		• 경주 춘양교지 토지보상 대행용역	• 춘양교지 미매입 토지 보상용역 (7필지/ A=3,666m)

<표 2-66> 2025년 추진 사업 종합 (계속)

구 분	내 용	세부내용	
경주 인왕동사지	복원 정비	• 경주 인왕동사지 유적 정비 심화연구 용역	• 인왕동 사지 복원 정비안 마련, 석탑 복원 실시 설계
		• 경주 인왕동사지 주변 정비	• 인왕동사지 주변정비(야간조명 설치, 유구보호시설 도색, 수목식재, CCTV설치 등)
		• 경주 인왕동사지 경역정비	• 인왕동사지 경역정비(건물지 정비, 유구보호시설 설치 등)
경주 천관사지	복원 정비	• 경주 천관사지 환경정비 (잔디깎기 등) 실시	• 예초(배부식) A=8,657.0m ² • 잔디깎기(핸드가이드식) A=10,506.0m ² • 임목폐기물 운반 및 처리 12.9 Ton
		• 경주 천관사지 경역정비 실시설계 용역	• 경주 천관사지 경역정비 실시설계용역 시행
경주 낭산 일원	발굴 연구	• 경주 낭산 일원 석조유산 현황조사 및 분석연구	• 경주 낭산 일원 석조유산 기초 현황조사 • 암질 분석 및 3D스캐닝을 통한 석재 형식 및 양식 자료조사 • 경주 능지탑지 일원 시굴조사
		• 경주 낭산 일원 시굴조사 및 기초학술조사	• 경주 능지탑지 일원 시굴 연장조사 및 정밀발굴조사 • 경주 능지탑지 콜로키움 개회 및 기초자료보고서 발간 • 경주 낭산 마을조사
	복원 정비	• 경주 낭산 일원 국가유산 정비 가이드라인 수립	• 경주 낭산 일원 내 국가유산의 현황조사 및 정비 실태 분석 • 경주 낭산 일원 내 국가유산의 보존 및 정비 방안 제시
		• 경주 낭산 일원 세부정비 계획 수립	• 경주 낭산 일원 기반 연구 및 정비 연구 • 탐방 클러스터 조성계획 수립 • 토지매입구역 우선순위 선별 • 전문가 토론회 개최 및 의견 수립
		• 경주 낭산 일원 내 토지 및 지장물 매입	• 경주 낭산 일원 내 토지 및 지장물 보상 • 이사비 및 손실보상금 지급
		• 경주 낭산 일원 내 매입구역 정비(지장물 철거 등)	• 경주 낭산 일원 내 매입구역 지장물 철거 • 경주 황복사지 일원 예초
		• 경주 낭산 일원 재선충 방제 및 고사목 제거	• 경주 낭산 일원 소나무 재선충병 예방주사 • 경주 낭산 일원 소나무 고사목 제거
		• 경주 선덕여왕릉 CCTV 설치	• 경주 선덕여왕릉 일원 CCTV 설치 공사 시행

<표 2-66> 2025년 추진 사업 종합 (계속)

구 분		내 용	세부내용
경주 낭산 일원	활용	<ul style="list-style-type: none"> 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 정사모자이크·3차원 실사 지형모델 제작 	<ul style="list-style-type: none"> 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 무인항공촬영 및 3D지형도 제작
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 안내 플랫폼 제작 	<ul style="list-style-type: none"> 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 디지털 사진촬영 및 유리건판 제작 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 안내 웹사이트 제작
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 낭산 일원 및 신라왕경 핵심유적 기록·홍보 영상 제작 	<ul style="list-style-type: none"> 신라왕경 핵심유적 사업 10년간 주요 성과 및 출토 유물·유적 관련 영상 기록
경주 사천왕사지	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 경주 사천왕사지 경역 정비공사 	<ul style="list-style-type: none"> 사천왕사지 배수로 정비 계획
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 사천왕사지 금당지기단 정비공사 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> 사천왕사지 금당지 기단정비 실시설계

Ⅲ 2025년 추진 사업 평가

1. 평가의 목적

- 신라왕경 특별법 제정 및 2024년도 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업의 시행에 따른 평가위원회를 구성 및 운영하여, 2025년도 사업 시행계획 수립에 평가결과 반영을 통한 사업의 효율적 추진을 도모코자 함

2. 평가의 근거

- 신라왕경 특별법 제6조2항 규정에 의거
- 제6조(연도별 시행계획의 수립 등) ② 경주시장은 전년도 시행계획의 추진실적을 평가하고 그 결과를 다음 연도 시행계획에 반영하여야 한다.

3. 평가위원회 구성

- 평가위원회는 신라왕경 사업에 학식과 경험이 풍부한 전문가를 전공별로 안배하여 구성함

<표 2-67> 평가위원 구성

구분	성명	소속	전문분야	비고
위원장	강봉원	신경주대학교	고고학	국가유산청 문화유산위원회 위원장
위원	이승용	목원대학교	건축학	국가유산청 문화유산위원회 사적분과위원장
위원	홍보식	공주대학교	고고학	국가유산청 문화유산위원회 사적분과위원
위원	김충식	한국전통문화대학교	조경·경관	국가유산청 문화유산위원회 사적분과위원
위원	강동진	경성대학교	도시공학	국가유산청 문화유산위원회 세계유산분과위원

4. 평가 세부 측정기준 및 내용


- 사업별 평가는 <표 2-68>의 지표에 따라 평가하였으며, <표 2-69>의 평가표를 바탕으로 결과를 개별사업별로 도식화하여 나타냄
- 평가위원의 기타 의견은 별도로 첨부하였음
- 개별 사업당 총점은 35점으로 평가위원 5명의 평가 점수를 평가지표별로 평균하여 계산하였음

<표 2-68> 평가지표 세부 측정기준

분 야	평가항목	평가지표	세 부 측 정 기 준
사업기획	사업의 타당성 및 구체성	사업의 합목적성	○ 신라왕경 복원·정비 사업 본연의 목적에 부합하는가? ○ 타 복원정비 사업과의 연관성 여부?
		추진계획의 구체성	○ 추진계획이 실현가능성이 있는가?
사업집행	사업의 효율적 집행 및 수행과정	예산집행 실적	○ 계획의 일관성이 유지되었는가? ○ 배정된 예산이 최대한 집행되었는가? ○ 결과 보고서가 충실히 작성되었는가? (해당시)
		사업추진 과정상 문제해결	○ 사업추진 과정상 문제는 합리적으로 해결되었는가?
사업성과	사업목표 달성도 및 기여도	사업목표 달성도	○ 계획된 목표는 최대한 달성되었는가?
		사후관리 계획	○ 사업완료 후 사후관리 계획은 적절히 수립되었는가?
		사업의 기여도	○ 사업이 목적에 맞게 기여하는가?

5. 평가결과

1) 신라왕궁(경주 월성) 평가결과 및 종합의견

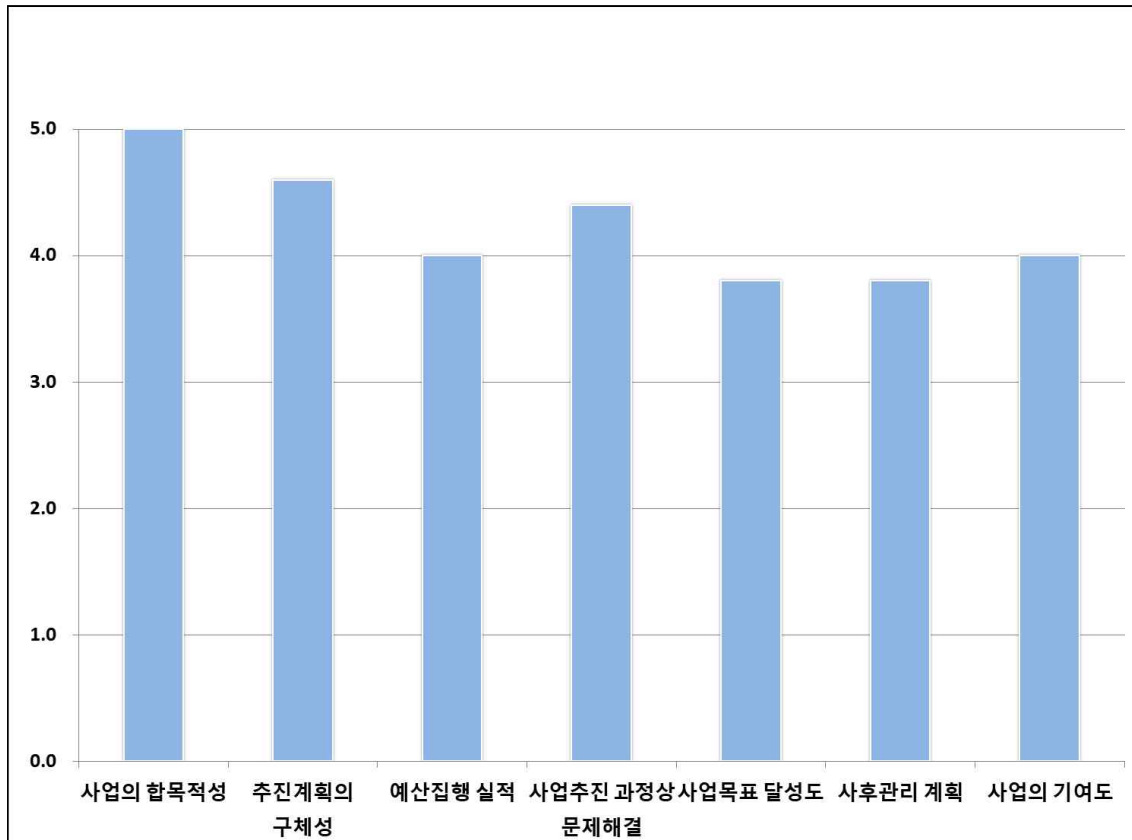


- 사업기획 및 내용은 적정함. 사업 수행에 있어 로드맵에 따라 적절하게 시행되고 있음. 다만 발굴 및 학술연구 추진 과정에서 내용 변경 등에 따른 실적이 미흡함. 기타 관람환경 개선 등은 26년까지 계속되는 사업으로 26년도에 목표 달성이 가능할 것으로 생각됨.
- 월성은 신라 왕궁의 핵심부로서 신라의 정체성을 상징하는 유산으로서 학술조사와 연구 성과는 매우 중요하여 매우 신중하게 사업을 추진해야 하지만, 발굴조사가 종료된 구역을 대상으로 임시 정비하여 조사 내용과 성과의 일부를 국민들과 공유할 수 있는 적극적인 문화유산행정이 필요함. 계획사업 중 일부는 목표를 달성하였으나 달성이 미진한 사업은 조기 완성할 수 있도록 추진함.
- 경주월성과 연계된 왕경구조의 본질을 파악하고 이를 실제적으로 드러내려는 사업

과 국민에게 이해와 설명을 도모하기 위한 사업이 합리적이며 구체적임. 사업 내용이 실제적인 물증과 발굴 과정 등 현장 중심적인 왕경구조의 본질을 전달하기 위한 것이어서 매우 바람직하다고 판단됨. 다만, 월성관람 환경개선사업과 승문로 진입로 정비공사의 경우 사업 진척의 속도를 올려 국민에게 월성 관람의 효율성을 높일 필요가 있음.

- 전반적으로 사업을 잘 수행하고 있음. 이 사업이 장기간에 걸쳐서 이루어지고 있으므로 참여하고 있는 연구원들이 학술적인 측면에 문제의식을 가지고 향후 연구 성과를 도출할 수 있도록 노력함. 신라월성연구센터(승문대) 진입로 정비는 이 방면으로 지나는 주민 및 관람/방문객을 위해서 바람직하다고 사료됨.

2) 경주 황룡사지 평가결과 및 종합의견

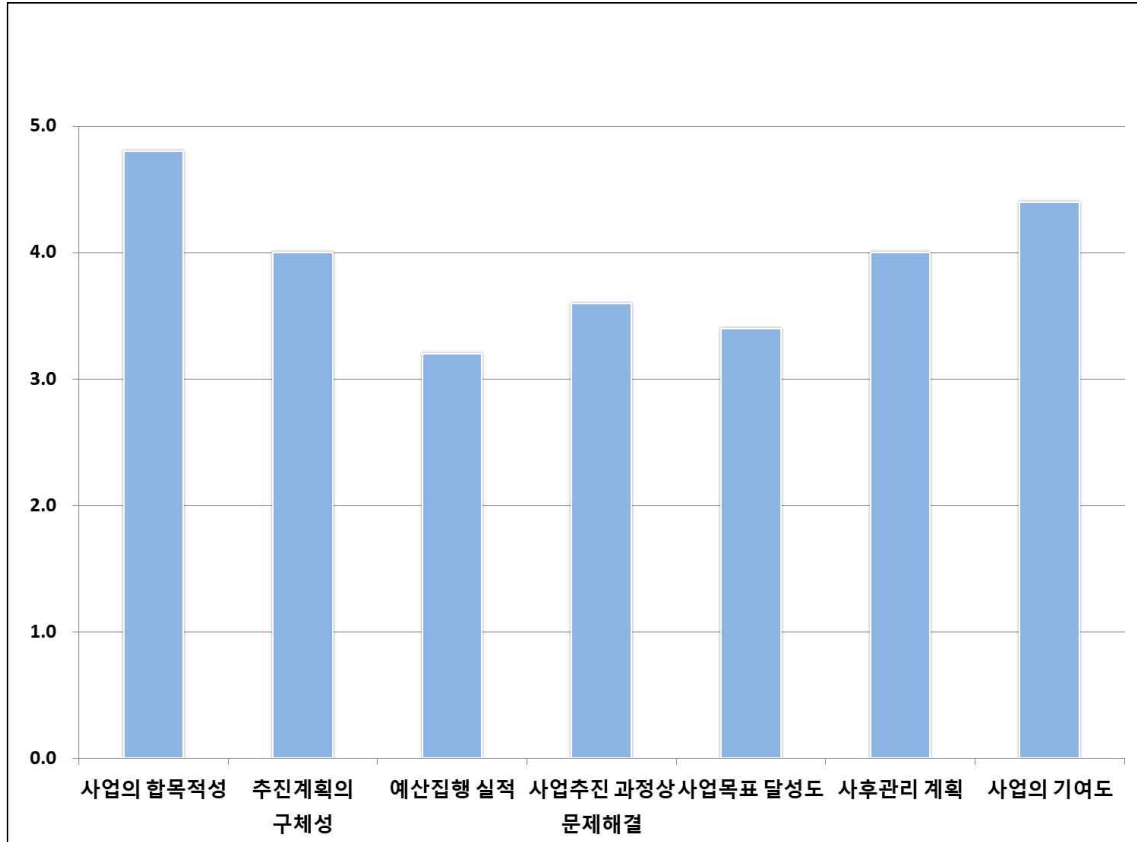


- 황룡사지 복원정비 사업은 연구 자료를 바탕으로 정비를 장기적으로 시행하고 있음. 진행된 연구를 기반으로 황룡사 진입부 기단 등 정비 및 주변 정비가 진행되고 있고, 차후에도 복원을 위한 연구를 심도 있게 진행될 계획임. 다만 단계별 연구 실적 및 자료 등을 정리할 필요가 있으며, 이를 기반으로 정비 방향을 설정할 필요가 있음.
- 황룡사지는 1970년대부터 발굴조사를 추진하여 예불영역과 승지영역 등의 구조와 특징 등이 확인되었고, 발굴조사를 통해 확인된 내용과 성과를 종합하고 복원정비하여 모두의 유산으로 만들어가는 과정이 쉽지 않은 현상을 충분히 검토하여 매년 사업을 완결할 수 있는 치밀한 계획수립과 추진을 하여 사업의 신뢰도를 높여야 함.
- 황룡사지의 발굴과 복원은 시급하면서도 정밀 및 체계적인 접근이 필요한 사안임. 발굴조사와 기록화 사업의 성과가 거의 마무리 단계에 이른 것으로 판단되며, 복원 심화 연구도 50% 달성을 한 것으로 보임. 이를 바탕으로 한 복원정비 사업의 추진에

집중할 필요가 있고, 특히 복원정비의 방향이 활용보다는 세계유산으로서의 진정성과 완전성 확보에 우선적 관점을 가질 필요가 있음.

- 황룡사 중문·남회랑·9층 목탑 증강현실 콘텐츠로 문화재 디지털 재현 사업은 이용자체에 한계가 있어 활용 가치가 크지 않다고 사료됨.
- 현재 복원되고 있는 담장은 높이가 다소 높아 전반적인 경관에 긍정적으로 보이지 않음.
- 황룡사의 경우 주변 유구(예: 문지, 금당지, 강당 포함 건물지 전반, 및 담장)에 대한 발굴 및 조사, 복원정비에 대해서도 주의를 기울이는 것은 맞지만 가장 중요한 것(예: 9층 목탑)에 대한 향후 계획에 대해서도 끊임없이 논의하고 결론을 도출하는 것이 중요하다고 생각함.

3) 경주 분황사지 평가결과 및 종합의견

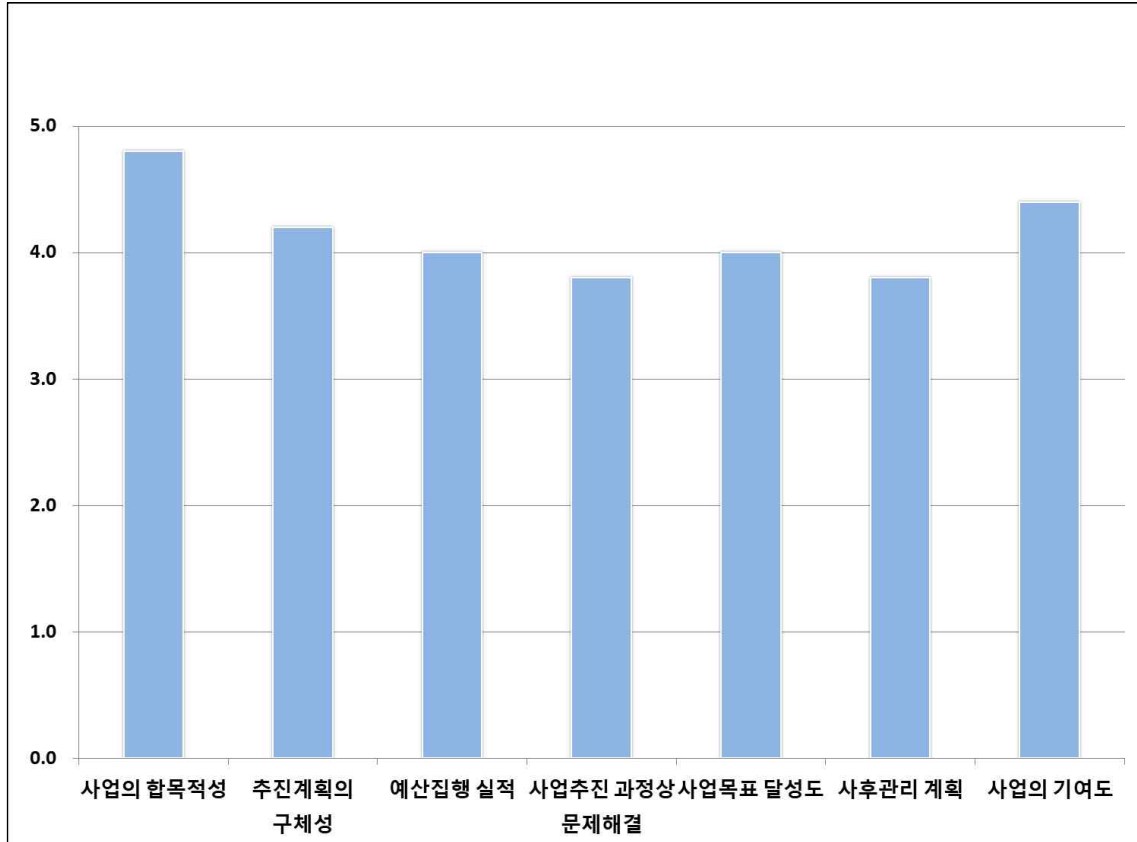


- 분황사 복원 건물 고증연구(2차) 수행 후 3차를 시행하고자 하는 것으로, 복원을 위한 과정은 적정함. 다만 3차 연구에서는 그동안 진행된 연구 내용을 분석 정리하여 다음 단계로의 방향을 설정 및 제시할 필요가 있다고 생각됨. 전체적으로 마스터플랜을 기반으로 절차에 따라 진행하되, 마스터플랜에서의 실증적 작업을 거친 후 추진할 필요가 있음.
- 분황사지의 발굴조사 내용과 성과를 토대로 복원건물 고증연구는 복원정비를 위한 필수불가결한 사업으로 중요하며, 주변경관 정비와 관람편의시설 개선 등은 모두의 유산으로 만들어가는 과정임. 사업진행상 추진이 매우 어려운 요소들에 대해 사전에 면밀하게 검토하고 계획을 수립하여 매년 사업을 완결할 수 있는 치밀한 계획수립과 추진을 하여 사업의 신뢰도를 높여야 함.
- 전반적으로 복원정비를 위한 발굴/연구와 복원정비 사업이 체계적으로 진행되고 있는 것으로 판단됨. 추진 내용은 대부분 동의하나, 조성 예정인 종무소, 화장실, 휴게시설들은 세계유산으로서의 분황사의 진정성과 완전성에 훼손이 없도록 세심한

고려가 필요함.


- 종무소와 화장실 재건축 및 주변 시설물 보수정비 그리고 휴게시설 조성은 가능한 빨리 시행하는 것이 바람직하다고 사료됨.
- 보광전이 협소하여 이에 대한 합리적인 개선책 마련이 시급히 요구됨. 분황사는 7세기 창건된 이래 많은 외침과 우여곡절이 있었음에도 법당이 이어지고 있고 신도 들 수 또한 적지 않다. 이러한 유서 깊은 사찰과 더불어 현금에도 신도들의 성소로 이용되고 있는 만큼 관광객만이 아니고 신도들을 위한 시설도 개선되어야 한다고 사료됨.

4) 경주 구황동 원지 평가결과 및 종합의견

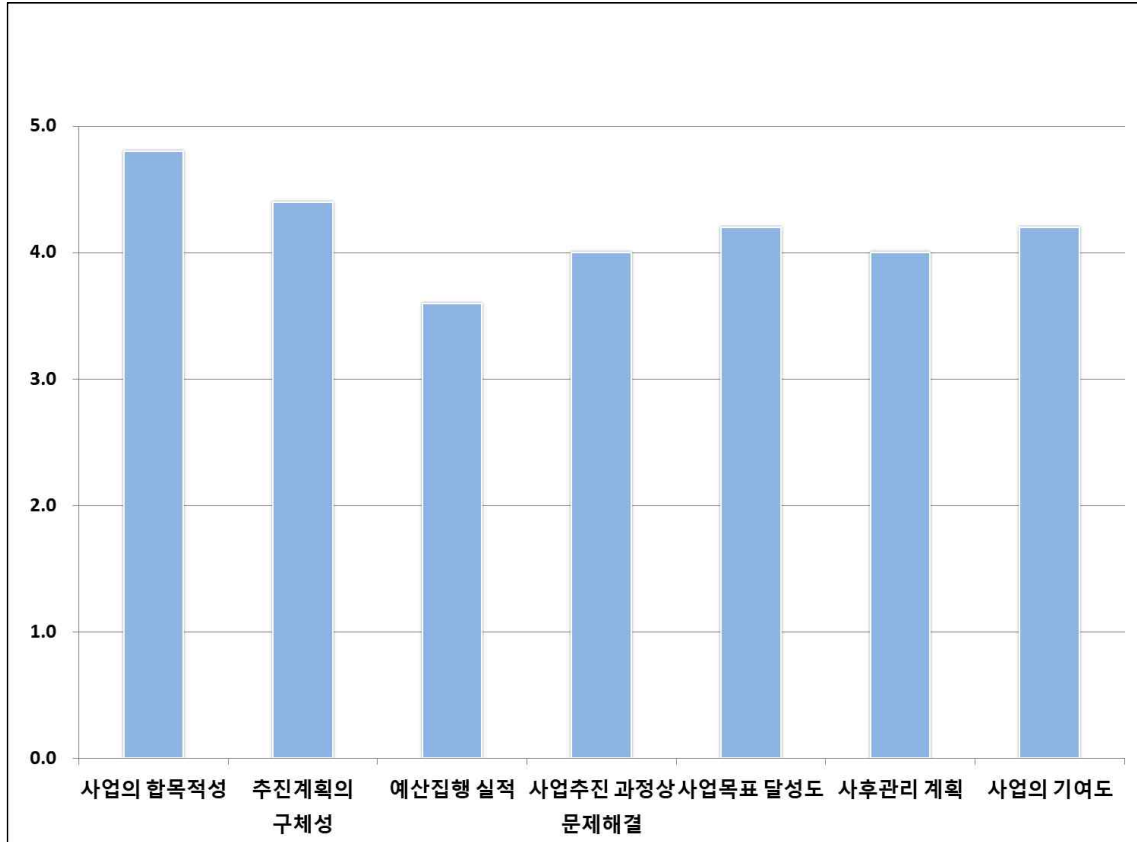

- 전반적으로 사업이 적절하게 시행되었음. 사업 집행된 내용에 비하여 예산집행이 수행되지 않음. 현재 시점에서 집행되지 않은 것으로 이해됨. 차후 사업 마무리 진행에 따라 25년에 집행이 필요함.
- 구황동 원지 복원 정비의 총사업 달성도는 높으나 25년도 예산 집행률이 14.5%이나 목표 달성도가 85%라는 수치 간의 정합성 문제가 있음.
- 유적 일원 정비공사와 경관조명 설치공사의 진행 상황이 순조로워 보임. 단발 사업으로 그치지 않고, 주변의 역사문화적인 유산들과의 연계를 통한 다양한 효과가 발생할 수 있는 대책 마련이 필요함.
- 원지 복원은 깨끗하게 되어 있으나 건물지들의 시간 차 때문에 현재 복원된 일부 건물지들은 처마가 서로 충돌하는 문제가 발생함. 아울러 우물도 비현실적으로 복원되었음. 원지를 복원하는 과정에서 성격이 밝혀지기는 어렵고 지속적인 학술연구가 이루어져야 한다고 사료됨.

5) 경주 미탄사지 삼층석탑 평가결과 및 종합의견

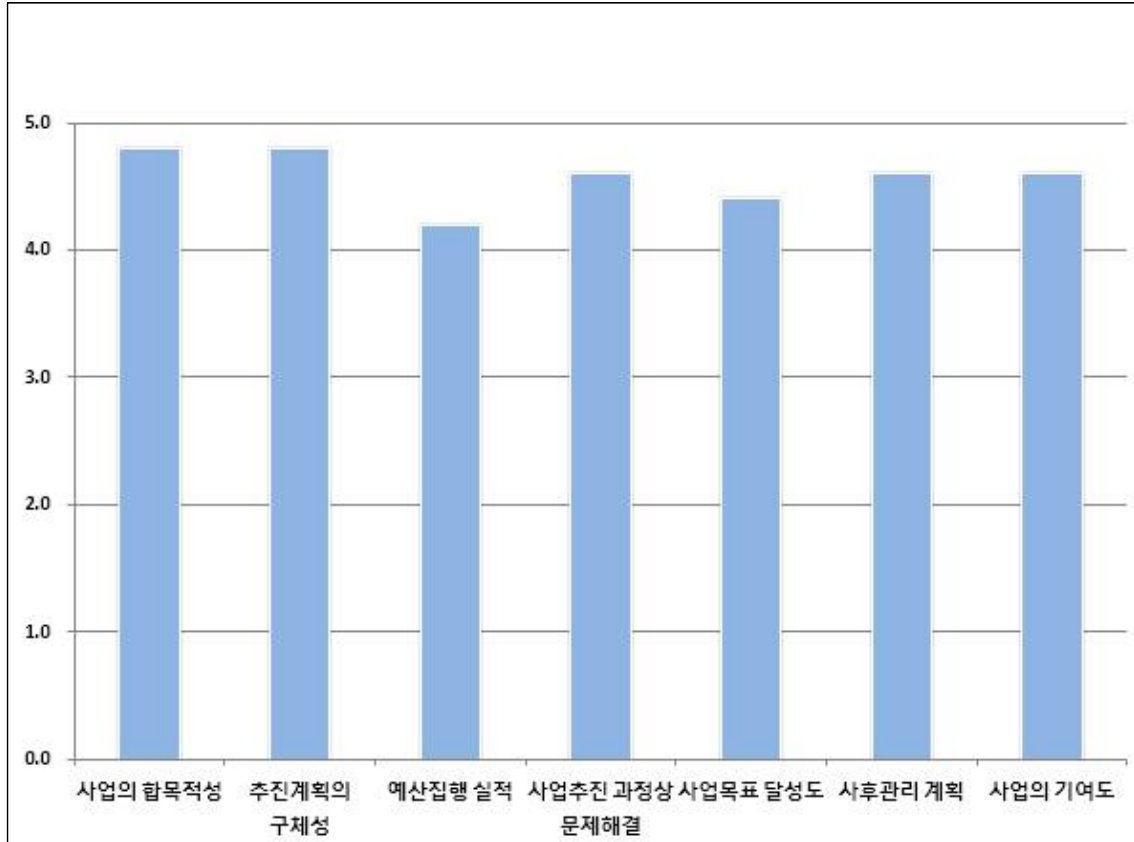


- 전반적으로 사업이 적절하게 시행되었음. 사업 집행된 내용에 비하여 예산집행이 수행되지 않음. 현재 시점에서 집행되지 않은 것으로 이해됨. 차후 사업 마무리 진행에 따라 25년에 집행 필요. 26년도는 25년 사업 내용(설계)을 기반으로 정비가 잘 진행될 필요가 있음.
- 미탄사지 종합정비 실시설계는 향후 미탄사지의 정비 실행의 토대사업으로서 매우 중요하므로 사업 연도 내에 완료될 수 있도록 방안을 강구해야 함.
- 단발 사업으로 그치지 않고, 주변의 역사문화적인 유산들과의 연계를 통한 다양한 효과가 발생할 수 있는 대책 마련이 필요함.
- 그간 발굴 조사된 여러 유구도 그렇지만 미탄사의 가람 배치가 학술적 논쟁의 대상이 되고 있음. 가장 큰 이슈가 되고 있는 것은 석탑과 추정 금당의 남북선상 축이 맞지 않는다는 점이다. 이를 근거로 일부 연구자들은 이곳이 원래 귀족 저택이다가 사찰로 변모되었다는 학설이 제기되었다. 이 점에 대해서도 향후 심도 있게 논의되어야

할 것으로 사료됨.

- 미탄사지 접근 동선이 애매해서 이를 개선할 필요가 있음. 고속도로를 나와서 이곳으로는 좌회전이 안 되어 분황사 정도까지 갔다가 다시 나와야 할 정도임. 반대의 경우에도 U-turn이 되지 않아 방문객들의 혼란을 초래하는바 개선책이 마련되어야 한다고 사료됨. 조사 후 정비를 잘 해 놓아도 동선의 불편 때문에 관광객들이 찾지 않는다면 그것도 문제임.

6) 경주 동궁과 월지 평가결과 및 종합의견

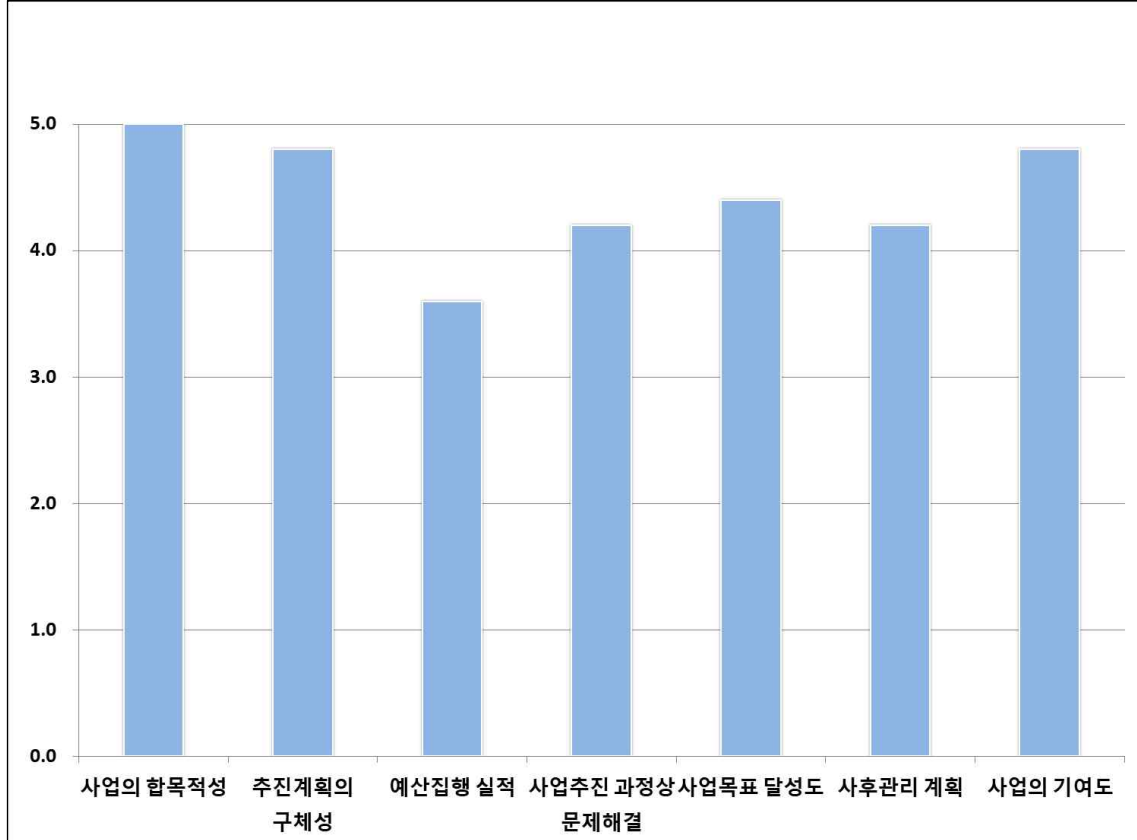


- 사업 내용에서 발굴·연구 및 조명 종합정비 등은 국가행사 추진과 함께 잘 시행되었음. 동궁과 월지 문화유산 구역의 신라방의 경우는 구체적인 추진 방향 등을 설정하여 사업을 시행할 필요가 있다고 생각됨.
- 동궁과 월지는 신라의 정체성을 나타내는 중요 유산으로서 가치 있는 유구들이 확인되었고, 그 북쪽의 신라왕경 방은 지배층의 삶의 공간으로서 신라문화를 이해할 수 있는 공간임. 발굴·연구와 야관경관조명 및 정비는 목표치에 근접하였으나 신라왕경 방 정비는 사업의 진척도를 높여야 함.
- 동궁과 월지 복원사업은 왕경의 실체를 이해하는 매우 중요한 사업이며, 발굴연구와 신라왕경 방 정비사업이 주요 사업으로 판단됨. 특히, 방 정비와 활용은 경주 구시가 지 전반에 펼쳐있는 신라왕경구조의 이해와 관광 활성화에 큰 영향을 줄 수 있을 것으로 판단하기에 보다 치밀하게 체계적으로 접근할 필요가 있음.
- 동궁과 월지는 경주 유적지 연간 방문객 수에서 3위 안에 들 정도로 사람들이

선호하는 곳임. 역사적으로 중요한 유구도 있지만 적지 않은 관광객들이 주변에 조성해 놓은 연꽃단지에 매료되기도 함. APEC을 계기로 주차장 등 모든 곳이 잘 정비되어 있어 관광객들이 지속적으로 많이 방문할 것으로 사료됨.

- 동궁과 월지 북편 신라왕경 방에서 시굴조사를 통해 일부 건물지가 노출되어 이를 정비하여 활용하고자 계획을 하지만 현재까지 주목할 만한 유구도 없고 복토 수준을 조금 넘어서는 정도이기 때문에 현실성이 부족하다고 사료됨. 계획서에는 이 방을 통일신라 왕경의 1,360방 중 일부 도시유적지로 비정하고 있지만 1,360방이라는 개념에 대해 재고의 필요성이 있음. 문헌의 기록을 액면 그대로 수용하기에는 어려움이 있음. 또 신라의 화려한 주거형태 및 생활상 복원 및 유적의 관광자원화를 염두에 두고 있지만 이를 뒷받침할 만한 가시적인 유구가 아직 조사되지는 않았음을 염두에 두고 사업을 추진함.

7) 경주 대릉원 일원 평가결과 및 종합의견

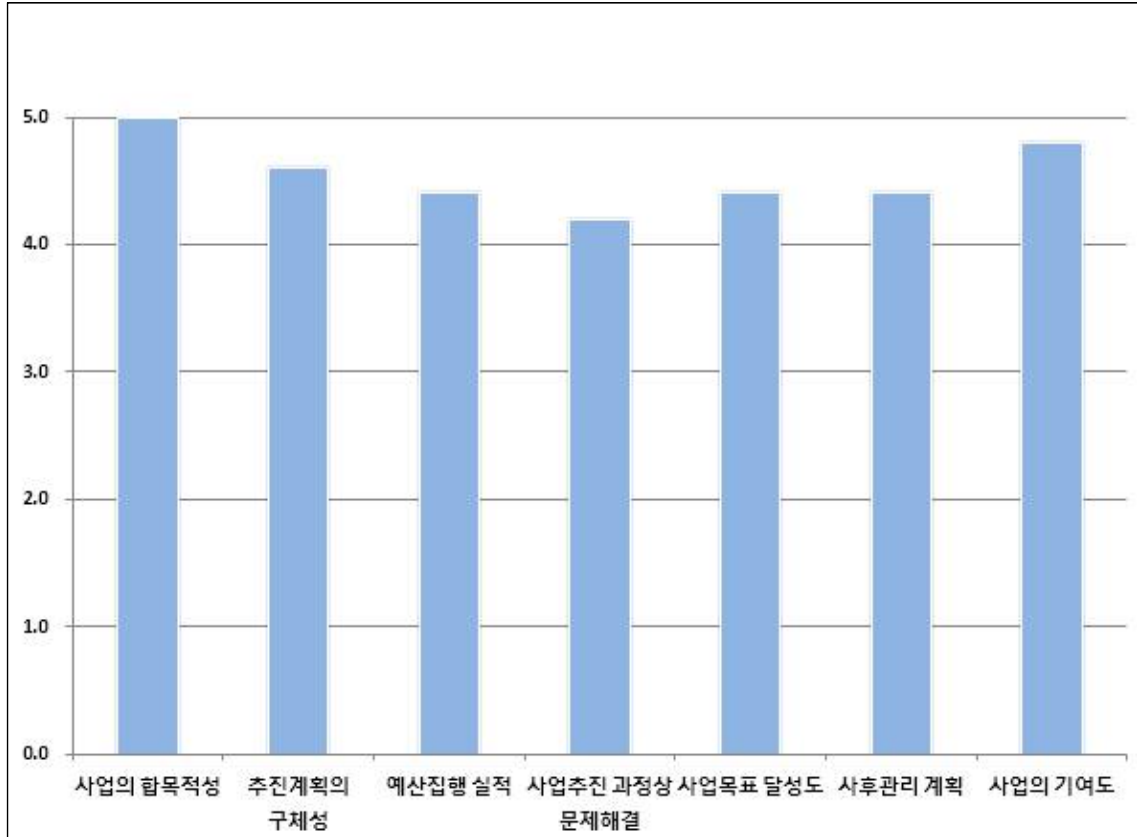


- 금관총 고분 정보센터 정비 공사 등이 적절하게 진행되었으며, 이와 함께 쪽샘지구 관람 편의시설 검토 등은 관람환경 개선 측면에서 긍정적임. 토지매입은 매년 시행하는 사업이며 지속적인 과정이 필요할 것으로 생각됨. 한편 관람환경 편의시설로 주차 공간(대릉원 전면 및 쪽샘지구와 기타 등)은 필요한 부분이지는 하나 항상 임시 시설로 이해하고 차후 경주시 교통체계를 고려하여 이전 배치하는 것을 고려하여 계획할 필요가 있음.
- 대릉원 일원은 신라 중앙 지배층의 사후공간으로서 신라문화를 상징하는 곳으로서 매우 중요함. 그동안 추진해온 쪽샘지구 유적조사 사업의 성과들이 구체화되어 가는 단계에서 다양한 사업들의 추진은 긍정적이므로 사업의 목적성과 실효성, 그리고 목표 달성도를 높이는 방안들이 강구되어야 함.
- 대릉원 옆 황오동 367 일원(쪽샘지구)의 이전과 복원은 오랜 시간 동안 추진된 경주(왕경)의 숙원사업에 해당함. 실천적인 결과가 나올 수 있도록 추진 속도를 올릴 필요가 있음. 앞으로 대릉원과 쪽샘지구, 더 나아가 월성대공원과 통합적으로 연계

되는 보다 다양한 활용 방안이 모색될 필요가 있음.

- 고분 복원 및 관광자원화로 경주의 위상을 재고하고 관광객들에게 고분 내부 및 축조과정 이해 편의를 목표로 삼음. Hard-ware 측면에서는 전반적으로 우수, Soft-ware 측면에서는 개선의 여지가 있음. 예를 들면, 고분정보관 동영상의 신라 적석목곽분 축조 장면에서 사람들이 무덤 축조에 사용할 바위를 곡괭이를 사용해서 채취하는 모습이 나오지만 수정·보완이 필요함. 왜냐하면 적석목곽분에 사용된 돌은 ‘산돌’이 아니라 거의 100% ‘넷돌’이기 때문임. 현재 동영상 내용은 방문객들에게 잘못된 정보를 제공하고 있음.
- 인왕동 고분 분포조사에서 분묘 유구도 노출되었지만 소위 남고루의 일부도 발견되었음. 이 고루의 성격(성 혹은 제방)에 대해 지난 100년간 논쟁이 되고 있지만 아직 해결되지 않았음. 고루의 외벽 쪽으로 길게 시굴갱을 넣어 해자 시설 유무를 확인하면 성격 구명에 다소 도움이 될 수도 있음을 염두에 두고 조사에 임함.


8) 경주 동부사적지대 평가결과 및 종합의견

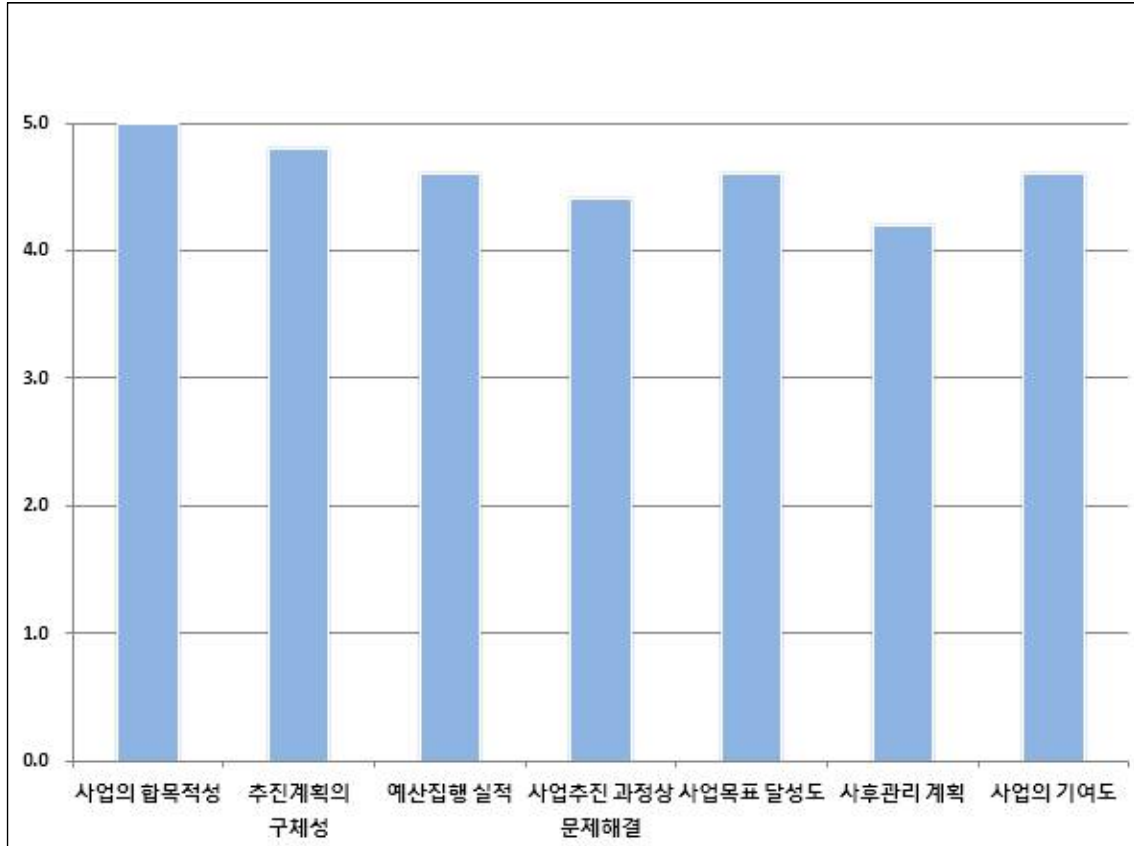

- 사업추진 과정은 계획에 따라 적정하게 시행되었음. 발굴 조사 및 학술대회 등은 발굴 현황에 따라 변경될 수 있는 것으로 이해됨. 다만 현재까지 진행된 내용을 중심으로 단계별 정리하는 것도 필요하다고 생각됨. 이에 따라 사업도 항목(공구)별 구분하여 작성하여 시행된 내용을 체계적으로 정리할 수 있도록 하는 것도 필요함.
- 동부사적지대는 왕궁 바깥 구역에서 왕궁 구역으로 재편된 공간으로서 다양한 유구들이 분포하고, 월성, 동궁과 월지, 대릉원 일원을 연결하는 공간적 위치를 지니고 있으며, 신라 왕궁의 변천과 내부 구조 및 기능을 파악할 수 있는 곳임. 이와 같은 중요성을 인지하고, 역사적 가치와 활용을 위한 다양한 사업을 면밀하게 계획하고 추진하였음.
- 동부사적지구는 경주다움을 전달하는 중요한 경관적 장소임. 발천유적 관련 보존관리와 정비 사업은 완료되었음. 관련하여 학술대회 개최 등을 통해 그 내용을 규명하고, 이의 결과를 국민에 향유하도록 하는 일은 매우 필요한 일로 판단됨. 동부사적지구 내 추가 발굴 사업을 선정하여 연속사업으로 추진할 필요가 있음.

- 신라 왕경 내 대부분의 유구와 유적이 일반적으로 그러하지만, 발천에 대해서도 많은 논의가 진행되고 있다. 향후 주목해야 할 과제는 초축 시기와 성격, 발원지, 발천을 위요한 고지형 등이다. 발굴 조사 시에 층위 해석에 대해 다소 명확하지 않은 부분이 노정된 것으로 보인다. 미세한 부분이 확실히 파악되어야 성격 구명(究明)과 향후 복원정비에 기준이 될 것으로 사료됨. 한편, 문헌자료를 기준으로 하다 보면 역사·고고학적 맥락과 맞지 않은 경우가 있으므로 주의가 요구됨.


9) 경주 춘양교지와 월정교지 평가결과 및 종합의견

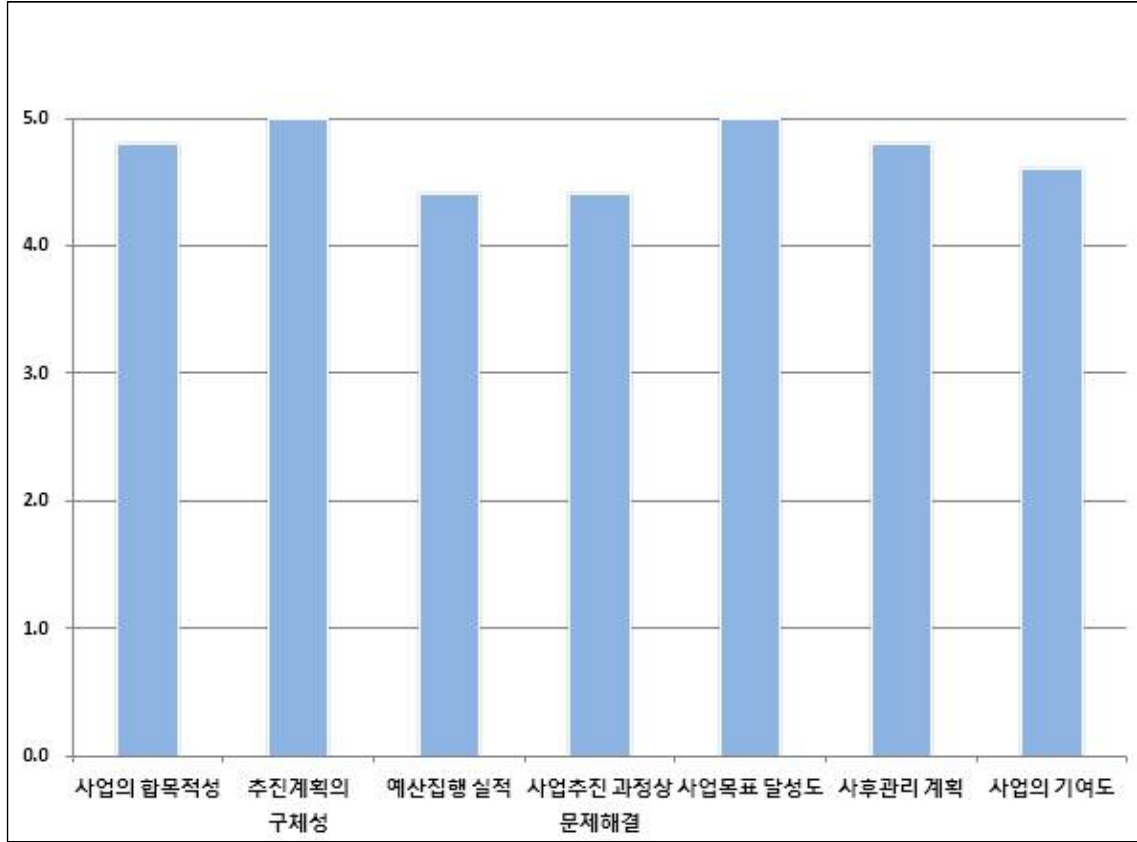

- 2025년도 사업추진 내용 및 집행 실적은 적절하게 시행되었음. 사유지 매입에 있어 지속적인 추진이 필요함.
- 춘양교지 복원 연구와 춘양교지와 월정교 예초는 당해 연도 사업이 달성되었고, 예산 집행률도 높음. 토지 매입도 비교적 추진이 잘 되고 있는 것으로 판단됨.
- 월정교는 오랜 시간 동안 원형에 대한 논란이 있었으나, 복원이 완료되어 경주를 찾는 국민에게 다양한 반향을 이끌고 있음. 춘양교지 복원을 통해 남천 일대의 관광 효과의 극대화에 만전을 기할 필요가 있음. 특히, 남천 일대의 역사적인 경관 관리에 더욱 힘을 필요로 있음
- 춘양교를 월정교처럼 복원하는 것은 타당하다고 사료됨. 이 두 교량이 세트이기도 하고 현 시점에서 볼 때 춘양교는 복원/재현된 월정교와는 달리 관광객들이 스쳐 지나가는 곳이기 때문이다. 이 두 교량을 제대로 활용하기 위해서는 춘양교 주변에 토지를 매입하여 이 교량도 재현/복원하는 것이 바람직함.

- 향후 활용 측면에서 이 교량[孝不孝橋]과 얽혀있는 설화 내용을 토대로 스토리텔링을 개발하는 것도 필요하다고 사료됨.

10) 경주 인왕동사지 평가결과 및 종합의견

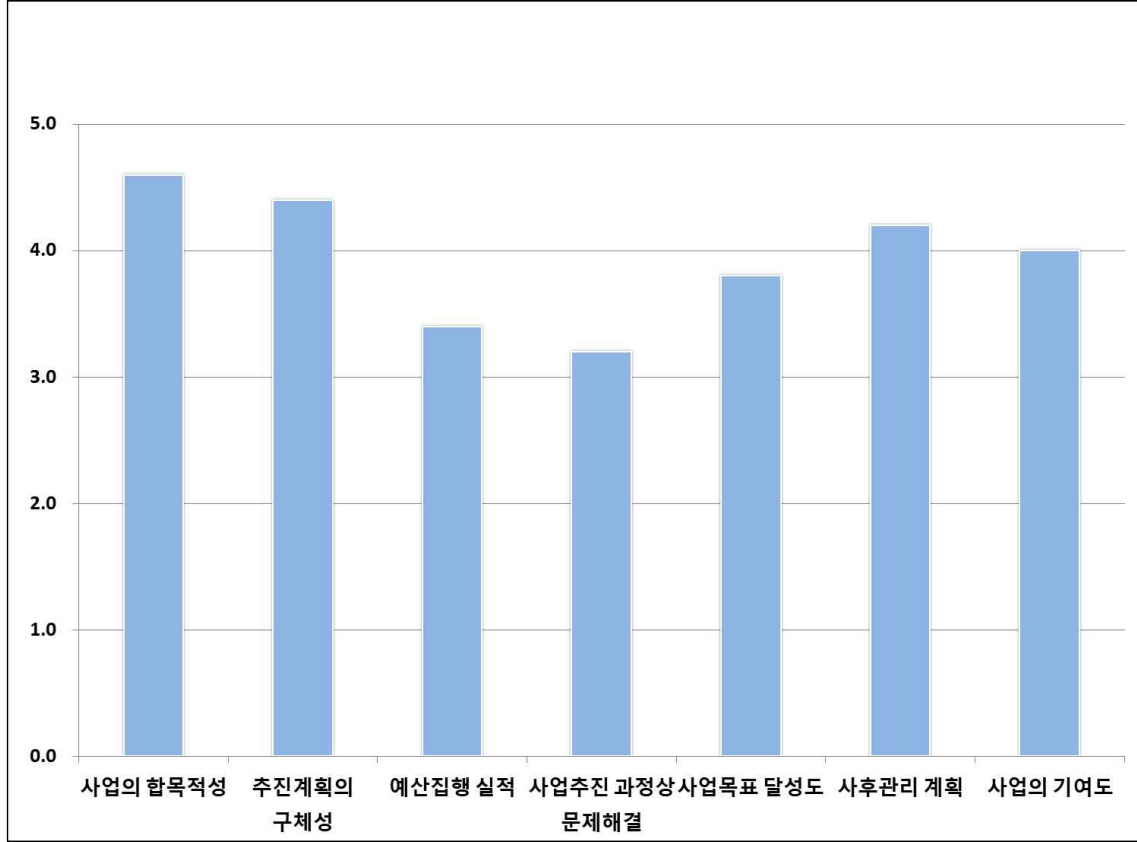


- 전반적으로 주변의 문화유산 정비 등의 타 사업에 비하여 추진이 더딘 편임. 사업 계획 등은 적정함. 발굴 및 연구 결과 등을 도출하여 정비 방향을 체계적으로 설정할 필요가 있음.
- 인왕동사지는 월성과 가장 가까운 곳에 위치한 사찰로서 발굴조사를 통해 가람이 확인되었고, 석탑 부재들도 상당 수 출토되어 석탑 자료들이 어느 정도 확보되어 복원이 가능할 것으로 판단하여 사업을 추진하였는데, 예산 집행률과 목표 달성도를 높여야 함.
- 보다 정밀하고도 체계적인 사업 추진이 필요함. 단발 사업으로 그치지 않고, 주변의 역사문화적인 유산들과의 연계를 통한 다양한 효과가 발생할 수 있는 대책 마련이 필요함.
- ‘전 인왕사지’가 사적으로 지정되면서 ‘인왕동 사지’로 명칭이 변경되었다. ‘仁睿’ 명문 기와가 출토되지 않았다는 측면에서 일리가 있다. 그러나 명문 기와가 출토되

지 않았다는 것을 근거로 명칭을 변경하는 것은 역사적 맥락과 맞지 않을 수도 있다. 신라 왕경에서 무덤이나 사지에서 명문이 나오지 않는 것은 다반사이고 정확한 내용을 모름에도 불구하고 많은 유적/유구가 사적으로 지정되어 있다. 비록 '전 인용사지'라는 명칭이 정확한 것은 아니더라도 전승되어 온 부분도 있으므로 역사성을 고려하는 차원에서 되돌릴 필요가 있다고 사료됨.

- 현재 정비해 놓은 건물지도 정확하게 고증된 것은 아님. 특히, 이 사지 서편에 있는 가건물(와적기단 건물지 유구 보호 차원)은 이 사지 만이 아니고 주변 경관에 저해가 되므로 철거하는 것이 바람직하다고 사료됨. 이 건물지가 중요한 것은 맞지만 이를 이해하는 관광객들이 얼마나 있을 것인가. 유구는 복토해서 보존하고 안내판 하나 정도를 세우도록 함.


11) 경주 천관사지 평가결과 및 종합의견

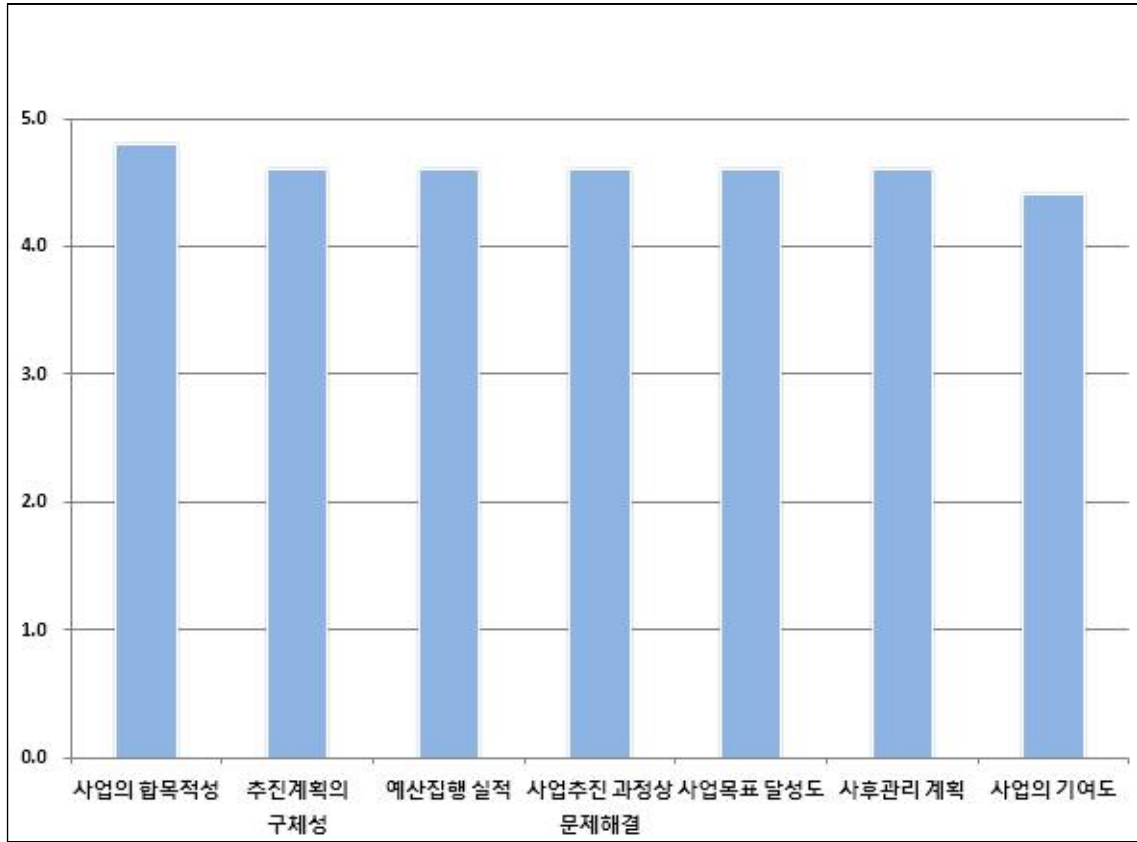

- 문화유산 관련 주변 관람환경 정비로 큰 어려움이 없음. 항상 모니터링을 통해 문화유산 현황 및 관람환경 상태 등을 관찰할 필요는 있음.
- 천관사지의 관리를 위한 예초와 경역정비 실시설계 모두 당초 계획대로 사업을 달성하였음.
- 보다 정밀하고도 체계적인 사업 추진이 필요함. 단발 사업으로 그치지 않고, 주변의 역사문화적인 유산들과의 연계를 통한 다양한 효과가 발생할 수 있는 대책 마련이 필요함.
- 천관사지는 김유신 장군과 기생 천관과의 사랑 이야기로 유명한 사지로 많은 사람들이 관심을 가질 수 있음. 향후 스토리텔링 개발이 필요하다고 사료됨.
- 전반적으로 정비가 잘 되어 있음. 자그마한 주 출입구 간판이 입구 건너편 쪽에 하나 있음. 여름철엔 가로수에 가려지기도 해서 외부에서 오는 관광객들은 이를


놓칠 수가 있음. 근래 navigation 시스템이 잘 되어 있기는 하지만 관광객들이 잘 볼 수 있는 확실한 간판을 하나 세우도록 함. 또 박물관과 월정교 그리고 인왕동 사지 쪽 방문객들은 천원마을 들어가는 곳으로 진입하면 좋겠으나 이곳에는 천관사 이정표가 없음. 이쪽에도 ‘천관사 출입구’를 하나 달아줌.

12) 경주 낭산 일원 평가결과 및 종합의견

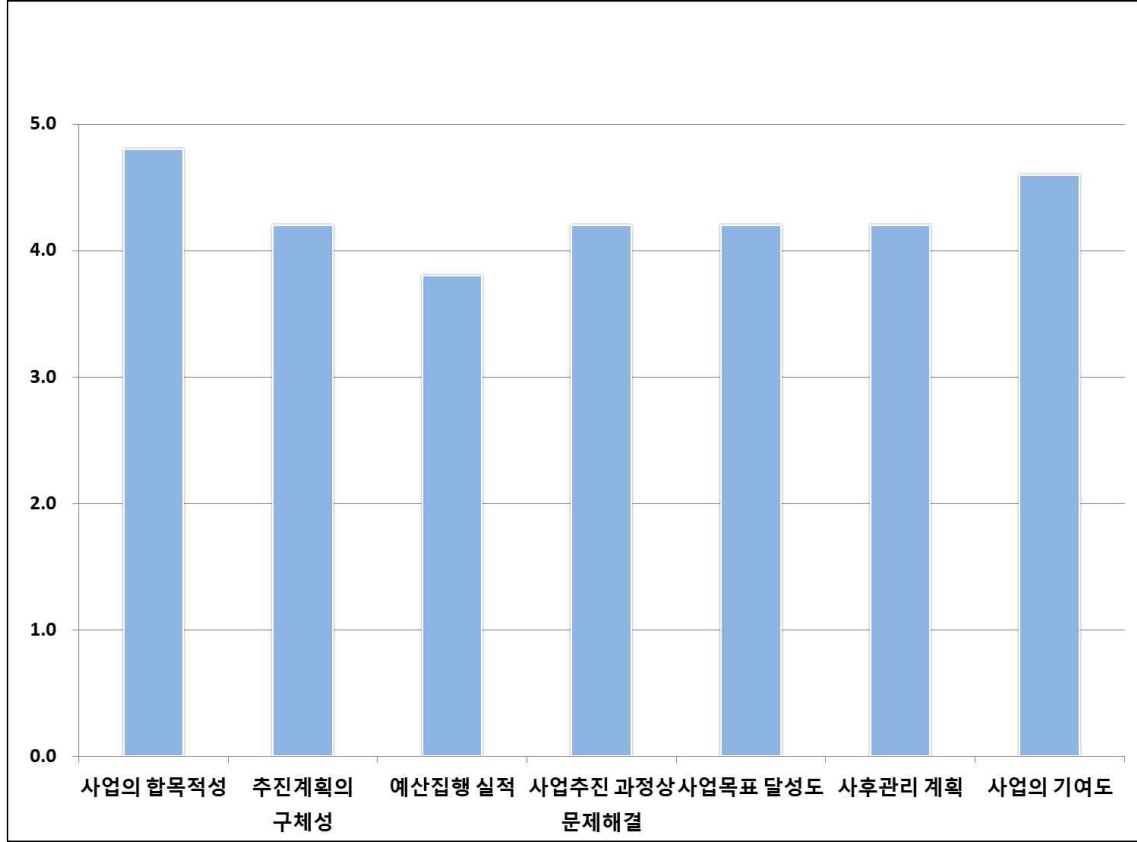

- 낭산 일원 석조유산 현황조사 및 분석연구는 적정하게 시행되었으나, 기타 재선충 방제 및 고사목 제거 실시는 미흡함. 시행 및 집행이 필요할 것으로 생각됨. 또한 주요 사업 내용으로 토지매입 등은 적극적으로 추진할 필요가 있음.
- 낭산 일원 현황조사 및 분석 연구를 실시하여 사업 우선순위 설정과 중장기계획 수립을 통한 복원, 정비 사업 추진 설정은 적절하며, 토지매입은 이를 위한 기본 전제가 되므로 지속적인 보상이 이루어져야 하나 사업의 진척에 어려움이 예상되므로 사전에 면밀한 대책 수립이 필요함. 재선충 방제는 낭산의 경관 유지와 직결되는 사업이므로 사전 예방이 이루어져야 하지만 예산 집행률이 저조함.
- 경주 전체의 공간 구조 상 낭산의 중요성은 이루 말할 수 없음. 토지 매입이 85%에 이른 점은 고무적이나, 수목 관리의 목표치는 크게 밀돌아 이를 보완할 필요가 있음.
- 낭산 일원의 경우 워낙 많은 유구와 유적이 분포하고 있어 단·중장기 계획을 세워서 사업을 수행하되 ‘선택과 집중’이 필요하다고 사료됨.

13) 경주 사천왕사지 평가결과 및 종합의견

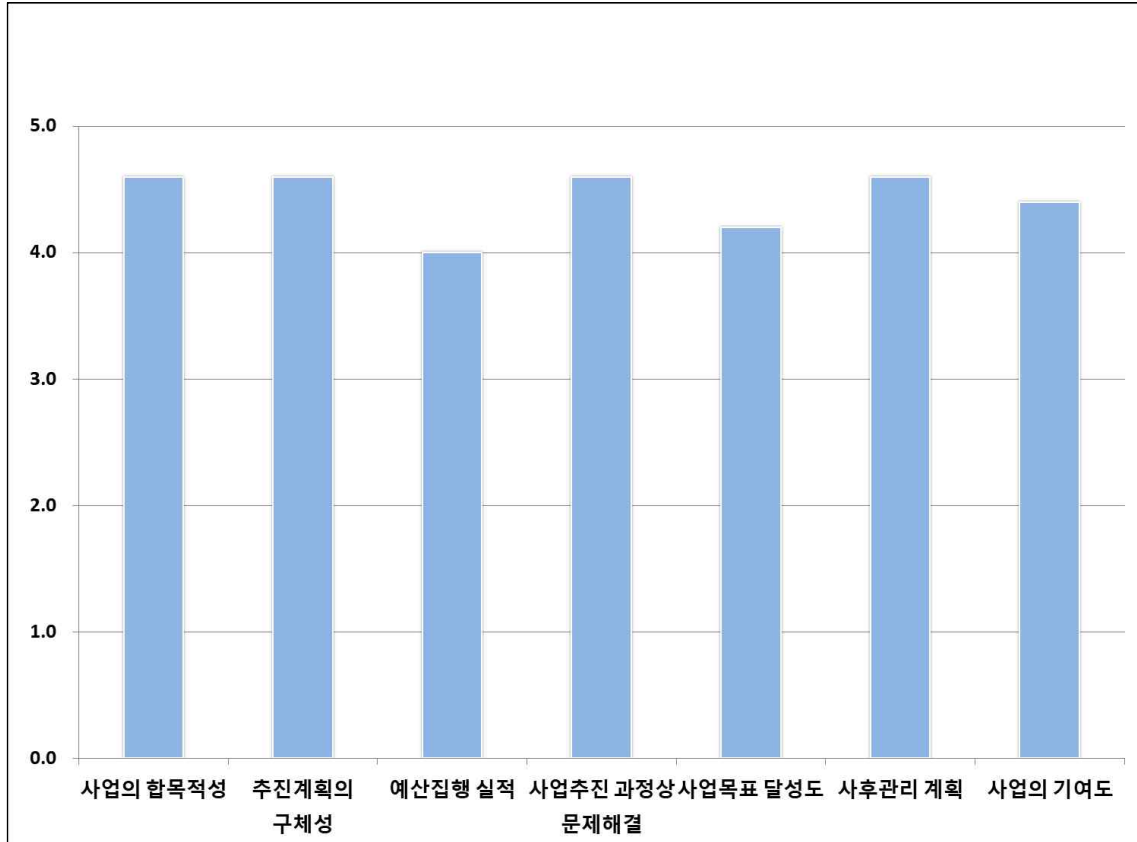

- 경역 정비 내용에서 문제가 되는 배수로 정비 등은 어려움이 있는 것으로 이해됨. 지문 및 대책안에 따른 시행계획을 세워 조속히 시행할 필요가 있으면, 기타 추진 내용은 적정함
- 사천왕사지 기단정비 실시설계용역은 완료되어 예산 집행률과 목표 달성도를 이루었으나 경역정비는 달성도가 상대적으로 낮음.
- 보다 정밀하고도 체계적인 사업 추진이 필요함. 단발 사업으로 그치지 않고, 주변의 역사문화적인 유산들과의 연계를 통한 다양한 효과가 발생할 수 있는 대책 마련이 필요함.
- 미조사 구간(중문지, 강당지, 화랑외각, 귀부남편 등) 발굴조사를 실시하되 우선순위를 설정하여 조사해야함. 향후 사천왕사지에서 이 사지와 상징적으로 관련되어 있는 ‘선덕여왕’의 무덤과 연결시킬 수 있는 진입로 개설이 타당한지 검토할 필요가 있다고 사료됨.

제3장 2026-2030년 핵심유적 세부 이행 과제 및 로드맵

- I. 경주 월성
- II. 경주 황룡사지
- III. 경주 분황사지
- IV. 경주 구황동 원지 유적 일원
- V. 경주 미탄사지 삼층석탑
- VI. 경주 동궁과 월지
- VII. 경주 첨성대
- VIII. 경주 대릉원 일원
- IX. 경주 동부사적지대
- X. 경주 춘양교지와 월정교지
- XI. 경주 인왕동사지
- XII. 경주 천관사지
- XIII. 경주 낭산 일원
- XIV. 경주 사천왕사지

I 경주 월성

1) 사업추진 방향

- 신라왕경 핵심유적의 구심지 확립 전략

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 발굴

- 월성 내부(성벽·문지·건물터 등) 정밀발굴조사('26~중·장기)
- A지구 성벽 및 내부 구조 조사('26~중기)
- C지구 동·남편(다·라구역) 발굴조사('26~중기)
- 동문지 주변 발굴조사('26~'29)
- B·D지구 건물지 발굴조사(중장기)
- 발굴조사보고서 발간('26~중·장기)

(2) 연구

- 월성(왕궁) 공간 구조 및 배치 양상 연구(해자, 성벽, 건물지 등 구조 복원 종합연구)('26~중·장기)
- 출토·발견 문자자료 집성 연구('26~중장기)
- 월성 고환경 복원 기초 자료 집성 연구('26~중·장기)
- 월성 출토 유물 복원 및 보존처리 연구('26~중·장기)
- 신라 왕궁의 생활상 복원 연구('26~중·장기): 동식물 등을 활용한 신라 왕궁 및 왕경 생활연구
- 자연과학 분석을 통한 신라시대 동물 연구('26~'30)

3) 첨단과학을 활용한 신라왕경 역사문화 보존관리 및 서비스 제공을 위한 세부 사업

(1) 연구

- 월성 학술조사 정보시스템 및 DB 구축('26~중·장기)
- 월성 중심 절대연대측정 연구('26~'30)
- 월성 성벽 복원 방안 연구('28~'30)

4) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 연구

- 월성 발굴조사 및 심화연구 성과 확산을 위한 학술대회 개최('26~중·장기)

(2) 활용

- 관람 편의·안전·방재시설 정비('26~중·장기)
- 발굴현장 해설 및 안내 프로그램 운영(발굴현장 공개 행사, 테마해설 및 상시해설 등)('26~중·장기)
- 현장 중심의 세대별 맞춤 교육 운영(찾아가는 월성이랑, 진로체험, 유아 교육 등)('26~중·장기)

5) 지속가능한 세계유산 복원·정비 기준 정립 및 역사문화자원 브랜드화를 위한 세부사업

(1) 정비

- 발굴 완료 유구 보존·정비('26~'30)
- 서편지 정비('26~'28)

- 수목, 지형 복원·정비('26~'30)
- 동문지 및 주변 성벽 정비(중기)
- 문지, 성벽 내부 핵심 건물 설계 및 정비(중기)

<표 3-1> 경주 월성 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기						
	단 기					중 기	장 기
	26	27	28	29	30		
발굴	월성 내부(성벽·문지·건물터 등) 정밀발굴조사						
	A지구 성벽 및 내부 구조 조사						
	C지구 동·남편(다·라구역) 발굴 조사						
	동문지 주변 발굴조사						
						B·D지구 발굴조사	
연구	발굴조사보고서 발간						
	월성(왕궁) 공간 구조 및 배치 양상 연구(해자, 성벽, 건물지 등 구조 복합 종합연구)						
	출토·발견 문자자료 집성 연구						
	월성 고환경 복원 기초 자료 집성 연구						
	월성 출토 유물 복원 및 보존처리 연구						
	신라 왕궁의 생활상 복원 연구						
	자연과학 분석을 통한 신라시대 동물 연구						
	월성 학술조사 정보시스템 및 DB 구축						
	월성 중심 절대연대측정 연구						
				월성 성벽 복원 방안 연구			
정비 복원	월성 발굴조사 및 심화연구 성과 확산을 위한 학술대회 개최						
	발굴 완료 유구 보존·정비						
	서편지 정비						
	수목, 지형 복원·정비						
						동문지 및 주변 성벽 정비	
활용						문지, 성벽 내부 핵심 건물 설계 및 정비	
	관람 편의·안전·방재시설 정비						
	발굴현장 해설 및 안내 프로그램 운영(발굴현장 공개 행사, 테마해설 및 상시해설 등) 현장 중심의 세대별 맞춤 교육 운영(찾아가는 월성이랑, 진로체험, 유아 교육 등)						

II ▶ 경주 황룡사지

1) 사업추진 방향

- 신라왕경의 최대 불교 사찰의 고증 및 연구를 토대로 복원·정비 사업 추진

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 발굴

- 황룡사 회랑 외곽 발굴조사 및 보고서 발간('26~'30)

(2) 연구

- 황룡사 강당 고증연구 및 기본설계(~'26)
- 황룡사 기타건축 기본계획 검토 및 기존 건축고증안 보완(~'27)
- 황룡사지 배수체계 개선 계획 수립(~'27)
- 황룡사 복원 학술대회 개최('28~'29)
- 황룡사 복원 종합 총서 발간('28~'30)
- 황룡사 회랑 내곽 기타 건물 정비 연구('28~'29)

(3) 복원

- 황룡사 중문 검토 연구 및 실시설계('26~'30)

(4) 활용

- 황룡사 활용 콘텐츠 연구 및 구축('26~중·장기)

3) 지속가능한 세계유산 복원·정비 기준 정립 및 역사문화자원 브랜드화를 위한 세부사업

(1) 정비

- 황룡사 회랑 내곽 기단 정비(~'27)
- 황룡사 관람환경 정비(~'27)
- 회랑 외곽 정비('30~중·장기)

(2) 복원

- 황룡사 중문 복원(중·장기)

4) 첨단과학을 활용한 신라왕경 역사문화 보존관리 및 서비스 제공을 위한 세부 사업

(1) 복원

- 황룡사 중금당 및 불상 디지털 콘텐츠 제작(~'26)
- 황룡사 강당 및 중심축 디지털 콘텐츠 제작('27)

(2) 활용

- 주요건물지(중문, 목탑, 중금당, 강당) AR 서비스('28~중·장기)

4) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 활용

- 황룡사역사문화관 전시 및 홍보('27~중·장기)

<표 3-2> 경주 황룡사지 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기							
	단 기						중 기	장 기
	26	27	28	29	30			
발굴	황룡사 회랑 외곽 발굴조사(~'28) 및 보고서 발간('29~'30)							
연구	황룡사 강당 고증연구 및 기본설계		황룡사 복원 학술대회 개최					
	기타건축 기본계획 검토 및 기존 건축고증안 보완		회랑 내곽 기타 건물 정비 연구					
	황룡사지 배수체계 개선 계획 수립							
						황룡사 복원 종합 총서 발간		
정비	회랑 내곽 기단 정비							
				회랑 외곽 정비				
	관람환경 정비							
복원	황룡사 중문 검토 연구 및 실시설계							
	황룡사 중금당 및 불상 디지털 콘텐츠 제작	황룡사 강당 및 중심축 디지털 콘텐츠 제작						
						황룡사 중문 복원		
활용	황룡사 활용 콘텐츠 연구 및 구축							
	황룡사 역사문화관 전시 및 홍보							
				주요 건물지(중문, 목탑, 중금당, 강당) AR 서비스				

Ⅲ 경주 분황사지

1) 사업추진 방향

- 황룡사, 미탄사지와 함께 신라를 대표하는 사찰벨트 조성
- 분황사와 관련이 깊은 원효대사와 자장대사의 스토리텔링 개발을 통한 활용 방안 모색

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 연구

- 중문 및 남회랑 건축복원 고증연구 및 학술대회 ('26~'28)

(2) 발굴

- 보광전 하부 발굴조사(장기)
- 분황사 서편도로 건너편 발굴조사(장기)

3) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 활용

- 분황사·구황동 원지 전시실·홍보관 건립('29~'30)
- 관람편의, 안전, 방재시설 정비('26~'30)

(4) 지속가능한 세계유산 복원·정비 기준 정립 및 역사문화자원 브랜드화를 위한 세부사업

(1) 정비

- 분황사지 주변정비(탐방로, 휴게시설 등)('26~'27)
- 중문, 담장 보수·정비('26)
- 금당지 일원 유구 정비('29~'30)

(2) 복원

- 중문 및 남회랑 복원('29~'30)

<표 3-3> 경주 분황사지 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기						중 기	장 기
	단 기							
	26	27	28	29	30			
발굴							보광전 하부 발굴조사	
							분황사 서편도로 건너편 발굴조사	
연구	중문 및 남회랑 건축복원 고증연구 및 학술대회							
정비	주변시설 정비(탐방로, 휴게시설물 등)							
	중문, 담장 보수·정비							
복원				금당지 일원 유구 정비				
				중문 및 남회랑 복원				
활용				분황사 구황동 원지 전시실·홍보관 건립				
	관람편의, 안전, 방재시설 정비							

IV ▶ 경주 구황동 원지 유적 일원

1) 사업추진 방향

- 구황동 원지 성격 규명을 위한 비교 및 심화연구

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 연구

- 원지 식생·경관 심화연구('27~'28)
- 원지와 도시구조 관계 심화연구(중기)
- 원지 부속 및 배후 건물지 고증연구(중기)

3) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 활용

- 구황동 원지 스토리텔링 개발('27~'30)
- 황룡사지 일원(황룡사지, 분황사지, 구황동 원지, 미탄사지) 연계 관광코스 개발('28~'30)

4) 지속가능한 세계유산 복원·정비 기준 정립 및 역사문화자원 브랜드화를 위한 세부사업

(1) 정비

- 구황동 원지 관람편의시설 실시설계('26)
- 구황동 원지 관람편의시설 정비('27~'28)

(2) 정비

- 원지내 건물지 재현(중기)

<표 3-4> 경주 구황동원지 일원 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기						중 기	장 기	
	단 기								
	26	27	28	29	30				
연구		원지 식생·경관·심화연구					원지와 도시구조 관계 심화연구		
							원지 부속 및 배후 건물지 고증연구		
정비	구황동 원지 관람편의시설 실시설계	구황동 권지 관람편의 시설 정비							
복원							원지내 건물지 재현		
활용		구황동 원지 스토리텔링 개발							
			황룡사지 일원 연계 관광코스 개발						

V 경주 미탄사지 삼층석탑

1) 사업추진 방향

- 미탄사지의 전체적인 경역 및 공간 구성 확인

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 연구

- 국가유산 지정을 위한 학술대회 개최(중기)
- 미탄사지 고증 심화 연구(중·장기)

(2) 발굴

- 미탄사지 주변부 발굴조사(중·장기)

3) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 활용

- 미탄사지 활용 콘텐츠 개발('28~'29)
- 황룡사지 일원(황룡사지, 분황사지, 구황동 원지, 미탄사지) 연계 관람 환경 개선('28~'30)

4) 지속가능한 세계유산 복원·정비 기준 정립 및 역사문화자원 브랜드화를 위한 세부사업

(1) 정비

- 미탄사지 일원 정비공사('26~'29)

<표 3-5> 경주 미탄사지 삼층석탑 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기						
	단 기					중 기	장 기
	26	27	28	29	30		
발굴						미탄사지 주변부 발굴조사	
연구						국가유산 지정을 위한 학술대회 개최	
						미탄사지 고증 심화 연구	
정비	미탄사지 일원 정비공사						
활용			미탄사지 활용 콘텐츠 개발				
			황룡사지 일원 연계 관람 환경 개선				

VI 경주 동궁과 월지

1) 사업추진 방향

- 월성과 통합된 왕성 권역으로 입체적·맥락적 경관 정비 사업 추진

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 발굴

- 월지 동편 발굴조사('26~중기)
- 월지 남편(주차장부지), 남서편(연꽃단지) 발굴조사(중기)
- 동해남부선 발굴조사(북편배수로 포함) (중기)
- 신라왕경 방 발굴조사(장기)
- 미탐사구간 지중레이더 탐사('27~'30)
- 발굴조사보고서 발간('26~중장기)

(2) 연구

- 신라왕경 출토유물 집성 및 아카이브 구축('26~중장기)
- 신라왕경 출토유물 제작·유통 연구('28~중기)
- 신라왕경 건물지 집성 및 유형화 분석 연구('28~중기)
- 동궁과 월지 고지형 및 고환경 복원 연구 ('26~중장기)

(3) 정비

- 동궁과 월지 유적 보존·정비계획 수립 연구('28~'30)

(4) 활용

- 동궁과 월지 활용방안 연구('28~'30)

3) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 활용

- 동궁과 월지 홍보관 건립('26~'30): 기본계획수립('26) 및 실시설계·건립('27~'30)
- 신라왕경 방 정비 활용 사업('26~'30)

4) 지속가능한 세계유산 복원·정비 기준 정립 및 역사문화자원 브랜드화를 위한 세부사업

(1) 정비

- 전통조경정비 및 기존 건물 유지관리(1,3,5호 건물 단청 등)('26~중기)
- 야간경관 개선 및 주변정비('26~'30)
- 주요 건물지 복원 및 정비('26~중장기)
- 동궁과 월지 유구 보존 정비('26~중장기)
- 동해남부선 폐철로 철거('26~'30)

<표 3-6> 경주 동궁과 월지 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기							
	단 기					중 기	장 기	
	26	27	28	29	30			
발굴	월지 동편 발굴조사							
						월지 남편, 남서편 발굴조사		
						동해남부선 발굴조사 (북편배수로 포함)		
							신라왕경 방 발굴조사	
	미탐사구간 지중레이더 탐사							
	발굴조사보고서 발간							
연구	신라왕경 출토유물 집성 및 아카이브 구축							
						신라왕경 출토유물 제작·유통 연구		
						신라왕경 건물지 집성 및 유형화 분석 연구		
	신라왕경 내 동궁과 월지 고지형 및 고환경 복원 연구							
정비 복원						동궁과 월지 유적 보존·정비계획 수립 연구		
	전통조경정비 및 기존 건물 유지관리(1,3,5호 건물 단청 등)							
	야간경관 개선 및 주변정비							
	주요 건물지 복원 및 정비							
	동궁과 월지 유구 보존 정비							
	동해남부선 폐철로 철거							
활용						동궁과 월지 활용방안 연구		
	동궁과 월지 홍보관 건립(기본계획수립, 실시설계·건립)							
	신라왕경 방 정비 활용 사업							

VII 경주 첨성대

1) 사업추진 방향

- 첨성대의 학술적 고증 연구를 통한 진정성 및 가치 확인

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 연구

- 첨성대와 주변 국가유산 학제간 연계 학술연구('28~중기)
- 첨성대 성격 심화연구(중·장기)

3) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 정비

- 홍보 전시관 건립('26~'30): 기본계획 수립('26) 및 실시설계·건립('27~'30)

(2) 활용

- 첨성대 미디어 파사드, 음향 설치('26~중기)
- 주변 요소 연계 스토리텔링 개발('26~'30)
- 관람편의·안전·방재시설 정비('27~중기)

<표 3-7> 경주 첨성대 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기						
	단 기					중 기	장 기
	26	27	28	29	30		
연구	첨성대와 주변 국가유산 학제간 연계 학술연구					첨성대 성격 심화연구	
	홍보 전시관 건립						
활용	첨성대 미디어 파사드, 음향 설치						
	주변 요소 연계 스토리텔링 개발						
	관람편의·안전·방재시설 정비						

VIII 경주 대릉원 일원

1) 사업추진 방향

- 사업추진 방향 : 신라왕경과 고분유적의 역사적 실체 고증, 훼손된 신라고분의 복원·정비를 통한 고분 경관 재현
- 신라왕경을 상징하는 지배계층의 대형고분과 출토 유물을 활용, 도로 등으로 단절된 유적의 원형 회복을 위한 장기 사업 구상

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 발굴

- 쪽샘지구 분포 및 발굴조사('26~'28)
- 황오·인왕지구 분포 및 발굴조사('26~중기)
- 황남지구 분포 및 발굴조사(장기)

(2) 연구

- 대릉원일원 주요 출토 유물 심화연구('26~중장기)
- 신라고분 형성 및 전개과정 연구('26~중기)
- 황남동 120호분 마감·찰갑 복원연구('26~중기)

(3) 발굴

- 발굴조사보고서 발간('26~중장기)

3) 첨단과학을 활용한 신라왕경 역사문화 보존관리 및 서비스 제공을 위한 세부 사업

(1) 연구

- 경주일대 신라고분 DB구축 연구('26~중기)
- 신라고분 관련 학술대회 개최('26~중장기)

4) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 활용

- 금관총 및 고분정보센터 운영 및 시설정비('26~'30)
- 대릉원 홍보자료 제작 배포('26~중장기)
- 쪽샘지구 편의시설 조성('26~'30)
- 학계/시민사회 조사성과 공개·활용('26~중장기)

5) 지속가능한 세계유산 복원·정비 기준 정립 및 역사문화자원 브랜드화를 위한 세부사업

(1) 정비

- 쪽샘유적발굴관 개보수 사업('26~'28)
- 황남동 120호분 종합정비계획 수립('26~'28)

<표 3-8> 경주 대릉원 일원 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기						
	단 기					중 기	장 기
	26	27	28	29	30		
발굴	쪽샘지구 분포 및 발굴조사						
	황오·인왕지구 분포 및 발굴조사						
						황남지구 분포 및 발굴조사	
	발굴조사 보고서 발간						
연구	대릉원일원 주요 출토 유물 심화연구						
	황남동 120호분 마감·착갑 복원 연구						
	신라고분 형성 및 전개과정 연구						
	경주일대 신라고분 DB구축 연구						
	신라고분 관련 학술대회 개최						
정비	쪽샘유적발굴관 개보수 사업						
	황남동 120호분 종합정비계획 수립						
활용	금관총 및 고분정보센터 운영 및 시설 정비						
	대릉원 홍보자료 제작 배포						
	쪽샘지구 편의시설 조성						
	학계/시민사회 조사성과 공개·활용						

IX 경주 동부사적지대

1) 사업추진 방향

- 월성과 첨성대로 연결되는 공간적 구조 확인
- 신라왕경의 구심점인 월성(왕궁)과의 연계 공간을 입체적·맥락적으로 가시화
- 장기적으로 월성, 동궁과 월지, 고분군 연결로 정비
- 월성의 동선과 연계되는 유적지대로 월성과의 관계를 고증하는 연구
- 동부사적지대 발천유적의 실체를 규명하여 고대하천 원형을 정비·재현

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 발굴

- 발천 발굴조사('26~중기)
- 동부사적지대 내 발굴조사(중·장기)
- 발천 발굴조사보고서 발간('27~중기)

(2) 연구

- 발천 복원·정비를 위한 학술연구('26~중기)
- 첨성대 및 주변 문화유산 연계 학술연구('27~중기)
- 발천경계의 생활권 성격규명 연구('29~중기)

3) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 연구

- 발천 복원·정비를 위한 학술대회('26)

(2) 활용

- 현장중심 문화유산교육의 장('26~'30)

4) 지속가능한 세계유산 복원·정비 기준 정립 및 역사문화자원 브랜드화를 위한 세부사업

(1) 정비

- 동부사적지대 종합정비계획 수립('26~'30)

(2) 복원

- 발천 내 석교·수로 재현·정비('26~'30)

(3) 정비

- 사업구역 재설정 및 토지매입('26~'30)

<표 3-9> 경주 동부사적지대 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기						
	단 기					중 기	장 기
	26	27	28	29	30		
발굴	발천발굴조사						
							동부사적지대 내 발굴조사
	발굴조사 보고서 발간						
연구	발천 복원·정비를 위한 학술연구						
	첨성대 및 주변 문화유산 연계 학술 연구						
	발천 복원·정비를 위한 학술대회						
						발천 경계의 생활권 성격 규명 연구	
정비	동부사적지대 종합정비계획 수립						
	사업구역 재설정 및 토지매입						
복원	발천 내 석교·수로 재현·정비						
활용	현장중심 문화유산교육의 장						

X 경주 춘양교지와 월정교지

1) 사업추진 방향

- 신라 궁성과 남산의 연결통로로 신라왕경의 공간적 연계성 고증 추진
- 장기적으로 도당산, 인왕동 사지, 남천 수변환경 정비와 연계

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 발굴

- 춘양교지 서편 교대지 및 옛길 확인, 주변부 발굴조사('28~'30)

(2) 정비

- 춘양교지 주변 토지매입('26~'28)
- 춘양교 복원 기본계획 수립 (중기)
- 춘양교 복원·정비(장기)

(3) 연구

- 춘양교 복원 고증연구 (중기)

3) 첨단과학을 활용한 신라왕경 역사문화 보존관리 및 서비스 제공을 위한 세부 사업

(1) 활용

- 월정교 디지털 콘텐츠 개발('27~'29)

- 복원 과정 영상 홍보 사업('26~'30)

4) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 활용

- 월정교 전면 개방 사업('26~'30)
- 관람편의, 안전, 방재시설 보수·정비('26~'30)
- 주변 연계 스토리텔링 개발 및 관광자원화('28~'30)

<표 3-10> 경주 춘양교지와 월정교지 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기						
	단 기					중 기	장 기
	26	27	28	29	30		
발굴	춘양교지 서편 교대지 및 주변부 발굴조사						
연구						춘양교 복원 고증연구	
정비	춘양교지 주변 토지매입						
						춘양교 복원 기본계획 수립	춘양교 복원·정비
활용	월정교 디지털 콘텐츠 개발						
	복원 과정 영상 홍보 사업						
	월정교 전면 개방 사업						
	관람편의, 안전, 방재시설 보수·정비						
	주변 연계 스토리텔링 개발 및 관광자원화						

XI 경주 인왕동 사지

1) 사업추진 방향

- 월성과의 관련성 확인을 위한 심화연구 및 주변 시설물과의 관계 파악

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 발굴

- 연지 남편 발굴조사('28~'30)
- 강당지 북편 발굴조사(중·장기)

(2) 연구

- 주요 건물 고증 심화연구(중·장기)

(3) 정비

- 토지매입('27~'30)
- 주변정비('26)
- 건물지(6,7,8,9), 담장 정비('27~'29)

(4) 복원

- 석탑 복원('26~'27)
- 우물, 연지 복원('28~'29)
- 주요 건물지 복원(중·장기)

3) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 연구

- 석탑 관련 학술대회 개최('27~'28)

(2) 활용

- 주변 유적 연계 관람환경개선('29~'30)
- 관람편의·안전·방재시설 정비('26~'30)

<표 3-11> 경주 인왕동 사지 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기						
	단 기					중 기	장 기
	26	27	28	29	30		
발굴	연지 남편 발굴조사					강당지 복원 발굴조사	
연구	석탑 관련 학술대회 개최					주요 건물 고증 심화연구	
	토지매입						
정비	주변정비						
	건물지(6,7,8,9), 담장 정비						
복원	석탑 복원						
			우물, 연지 복원				
						주요 건물지 복원	
활용				주변 유적 연계 관람환경개선			
	관람편의·안전·방재시설 정비						

XII 경주 천관사지

1) 사업추진 방향

- 전체적인 사역 확인 및 주변 시설과의 관계 확인
- 김유신과 천관과의 설화를 스토리텔링 개발하여 활용방안 모색

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 발굴

- 연지 및 주변 영역 발굴조사('27~'28)
- 천관사지 주변부 발굴조사('29~'30)

(2) 연구

- 주요 건물 고층 심화연구(중기)

(3) 정비

- 유적정비 정비계획 재수립('28~'29)
- 경역 내 배수로 등 정비('27~'28)
- 유적정비(주차장,신라도로 등)('29~'30)

(4) 복원

- 강당지 복원설계(중·장기)

3) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 활용

- 천관사지(김유신, 천관, 원성왕 등) 스토리텔링 개발('26~'30)
- 주변 유적(인왕동사지, 춘양교지와 월정교지, 천관사지) 연계 관람환경개선('26~'30)

<표 3-12> 경주 천관사지 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기							
	단 기					중 기	장 기	
	26	27	28	29	30			
발굴		연지 및 주변 영역 발굴조사	천관사지 주변부 발굴조사					
연구						주요 건물 고증 심화연구		
정비			유적정비 정비계획 재수립					
		경역 내 배수로 등 정비		유적정비(주차장, 신라도로 등)				
복원						강당지 등 복원설계		
활용		천관사지(김유신, 천관, 원성왕 등) 스토리텔링 개발						
		주변 유적(인왕동사지, 춘양교지와 월정교지, 천관사지) 연계 관람환경개선						

XIII ▶ 경주 낭산 일원

1) 사업추진 방향

- 낭산 일대 산재한 유적들의 검토를 통한 신라왕경 내 낭산의 역사적인 위치 확인

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 발굴

- 능지탑 재발굴조사('26~'29)
- 능지탑지 발굴조사보고서 발간('29~'30)

(2) 연구

- 능지탑 축조과정 연구('26)
- 황복사지 고증연구(2차)('27~'28)
- 황복사지 고증연구(3차)('29~'30)
- 능지탑지 고증연구(중·장기)

(3) 정비

- 낭산 일원 토지매입('26~'30)
- 낭산/망덕사지 권역 통합(중·장기)
- 낭산 일원 세부정비계획수립('26)
- 낭산 일원 활용계획 수립('27~'28)
- 낭산 일원 탐방로 정비, 휴게시설 조성('27~'30)
- 낭산 일원 방문자센터 신설(중기)

- 황복사지 주변정비 실시설계('26)
- 황복사지 주변정비('27~'28)

(4) 복원

- 능지탑 복원(중·장기)

4) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 활용

- 낭산 일원 유적 스토리텔링 및 콘텐츠 개발('26~'30)
- 낭산 일원 문화유산 해설 프로그램 개발('28~'30)
- 관람편의·안전·방재시설 정비('27~'30)
- 신유림을 거닐다(낭산 둘레길 걷기) 행사('29~'30)

<표 3-13> 경주 낭산 일원 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기							
	단 기					중 기	장 기	
	26	27	28	29	30			
발굴	능지탑 재발굴조사							
					능지탑지 발굴조사보고서 발간			
연구	능지탑 축조과정 연구							
		황복사지 고증연구(2차)						
				황복사지 고증연구(3차)				
							능지탑지 고증연구	
정비	낭산 일원 토지 매입							
							낭산/망덕사지 권역 통합	
	낭산 일원 세부정비계획 수립	낭산 일원 활용계획 수립						
	낭산 일원 탐방로 정비, 휴게시설 조성							
	황복사지 주변 정비 실시설계							
		황복사지 주변 정비						
						낭산 일원 방문자센터 신설		
복원						능지탑 복원		
활용	낭산 일원 유적 스토리텔링 및 콘텐츠 개발							
	낭산 일원 문화유산 해설 프로그램 개발							
	관람편의·안전·방재시설 정비							
	신유림을 거닐다 (낭산 둘레길 걷기) 행사							

XIV ▶ 경주 사천왕사지

1) 사업추진 방향

- 전체적인 사역 확인 및 주변 시설과의 관계 확인

2) 신라왕경 핵심유적 골격 회복을 통한 역사성 확립을 위한 세부사업

(1) 발굴

- 강당지 북편 발굴조사('28~'30)
- 회랑외곽 발굴조사(중기)
- 귀부남편 발굴조사(장기)

(2) 연구

- 귀부, 석교 심화연구(장기)

(3) 정비

- 토지매입('27~'30)
- 사역 내 배수로 정비('26)
- 귀부 동편 임시주차장 정비('26~'27)
- 동해남부선 폐철로 철거('26~'30)

(4) 복원

- 금당지 기단복원 심화연구('26)

- 동탑지 기단 복원('28~'29)
- 금당지 기단복원('26~'27)
- 귀부 주변 복원(중·장기)
- 중문지 및 회랑지 복원('30~'31)
- 중문지 및 회랑지 복원 심화연구('29~'30)

3) 국민, 지역주민과 함께하는 신라왕경을 위한 세부 사업

(1) 활용

- 낭산과 연계한 스토리텔링 및 관광코스 개발('26~'30)
- 관람편의, 안전, 방재시설 정비('26~'30)

<표 3-14> 경주 사천왕사지 세부 이행과제 및 로드맵

구 분	복원·정비 및 조사·연구 추진 시기						중 기	장 기	
	단 기					26			27
	26	27	28	29	30				
발굴	강당지 복원 발굴조사						회랑외곽 발굴조사	귀부남편 발굴조사	
연구							귀부, 석교 심화연구		
정비	토지매입								
	지역 내 배수로 정비								
	귀부 동편 임시주차장 정비								
복원	동해남부선 폐철로 철거								
	금당지 기단복원 심화연구								
					중문지 및 회랑지 복원 심화연구				
	금당지 기단 복원		동탑지 기단 복원			중문지 및 회랑지 복원(~'31)			
							귀부 주변 복원		
활용	낭산과 연계한 스토리텔링 및 관광코스 개발								
	관람 편의, 안전, 방재시설 정비								

제4장 2026년 사업추진 세부계획

- I. 세부 시행계획
- II. 세부 시행계획 종합

I 세부 시행계획

1. 신라 왕궁(경주 월성)

- 신라왕경 핵심유적의 구심지 확립 전략
- 해자, 왕궁 내부의 지하유구가 갖는 역사적 실체를 고증하기 위한 연구사업과 활용사업을 프로그램으로 구성하여 역사문화 보존 모델(경주 모델)을 적용함

1) 사업개요

- (1) 위 치 : 경북 경주시 인왕동 387-1 일원
- (2) 사업기간 : 2006년 ~ 계속
- (3) 총사업비 : 2,700억원(국비 1,890억, 지방비 810억)
- (4) 사업내용 : 월성 발굴조사 및 학술연구, 주요 유적 복원·정비
 - 월성 기초연구 및 발굴조사
 - 학제 간 융·복합연구 등 심화연구 추진
 - 해자 복원 및 주변정비
 - 문지 및 성벽 복원·정비
 - 월성 발굴조사 운영시설 건립 및 조사현장 개방 등 활용 추진
 - 유구 보존 및 주변정비

2) 추진경과

- 2014. 10. ~ 11. : 경주 월성 발굴허가 및 발굴조사 대행사업 체결
- 2014. 12. : 경주 월성 발굴조사 착수
- 2015. 11. ~2017. 07. : 월성해자(1~3호) 보완 발굴조사 완료
- 2016. 07. ~ 2018. 09. : 월성해자 정비 기본계획 수립 및 실시설계 시행

- 2017. 05. ~ 2018. 04. : 월성 수목정비 공사 시행
- 2018. 09. 18. : 월성해자 정비 및 재현 계획(설계) 승인(문화재청)
- 2018. 10. 10. : 월성 발굴조사 운영시설 건립부지 승인(문화재청)
- 2018. 12. : 월성해자 정비 및 재현 공사 착공
- 2019. 01. ~ 2020. 08. : 월성 발굴조사 운영시설 건립부지 발굴
- 2019. 10. 02. : 월성 발굴조사 운영시설 건립 기본계획 승인(문화재청)
- 2020. 04. : 월성 발굴조사 운영시설 건립 실시설계 승인(문화재청)
- 2020. 04. : 월성 해자 용수공급 타당성조사 및 기본설계 용역 시행
- 2020. 07. 08. : 월성해자 주변정비 및 용수공급 기본계획 승인(문화재청)
- 2020. 10. : 월성 수목 제거 및 주변 환경 정비 기본계획 승인 문화재청)
- 2020. 12. ~ 2021. 02. : 월성 수목 제거 및 주변 환경 정비 시행
- 2020. 12. : 월성 발굴조사 운영시설 목재수장고 기본계획 승인(문화재청)
- 2021. 01. : 월성 발굴조사 운영시설 건립 착공
- 2021. 01. : 월성 해자 용수공급 시설공사 착공
- 2021. 04. : 월성 남편 경관조명 설치공사 기본계획 승인(문화재청)
- 2021. 08. : 월성 해자 주변정비공사(전기) 실시설계 승인(문화재청)
- 2021. 09. : 월성 수목 제거 정비공사 실시설계 승인(문화재청)
- 2021. 10. : 월성 해자 주변정비공사(전기) 착공-월성 해자 방면
- 2021. 11. : 월성 수목 제거 정비공사 착공
- 2021. 11. : 월성 해자 주변정비공사(2차) 착공-월성 남측 방면
- 2022. 03. : 월성 해자 용수공급 시설공사 준공
- 2022. 04. : 월성 해자 주변정비공사(전기) 준공
- 2022. 04. : 월성 해자 주변정비공사(2차) 준공-월성 남측 방면
- 2022. 05. : 월성 해자 정비재현 공사 준공
- 2022. 06. : 월성 발굴조사 운영시설 설계변경(2차) 승인(문화재청)
- 2022. 08. : 월성 관람환경개선 기본계획 및 실시설계 시행
- 2022. 09. : 월성 발굴조사 운영시설 설계변경(3차) 승인(문화재청)
- 2022. 11. : 월성 발굴조사 운영시설 설계변경(4차) 승인(문화재청)

- 2023. 01. : 신라월성연구센터(송문대) 본동, 전시동 건립 준공
- 2023. 04. : 2023년도 월성 발굴조사 대행사업 협약 체결
- 2023. 03. : 월성 북측사면 경관정비공사 준공
- 2023. 07. : 신라월성연구센터(송문대) 부대시설공사 착공
- 2023. 10. : 신라왕궁영상관 다면영상 콘텐츠 제작 착수
- 2023. 12. : 월성 관람환경개선 기본계획 및 실시설계 용역 완료
- 2023. 12. : 월성 서편지 종합정비계획 수립용역 완료
- 2024. 02. : 2024년도 월성 발굴조사 대행사업 협약 체결
- 2024. 04. : 월성 남쪽 유실사면 복구공사 완료
- 2024. 04. : 신라월성연구센터(송문대) 부대시설공사 준공
- 2024. 05. : 신라왕궁영상관 리모델링 및 다면영상 콘텐츠 제작 완료
- 2025. 02. : 월성 관람환경개선사업(2차분) 실시설계용역 착수
- 2025. 10. : 월성 관람환경개선사업(탐방로 정비)1차 준공
- 2025. 11. : 송문대 진입로 정비공사 준공

3) 2026년 추진계획

(1) 발굴·연구

가. 경주 월성 발굴조사 및 학술연구

<표 4-1> 경주 월성 발굴조사 및 학술연구

구 분	내 용
사업기간	● 2014. 01. ~ 계속
사업비	● 1,309억원(2026년 60억)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ● 월성 A지구(남성벽 및 건물지), C지구(내부 건물지 등) 정밀발굴조사 및 출토유물 보존처리 ● 월성 출토 문자 자료 조사연구 자료집 발간 및 전문가 포럼, 고환경(고환경, 고기후, 식생활 등) 복원연구 ● 월성 발굴조사·연구 성과 활용 전시회 및 현장 개방 축제 개최 ● 안정적인 연구 기반 구현을 위한 발굴조사 데이터 댐 구축 ● 국내외 홍보 및 학술대회 개최, 상시교육, 콘텐츠 제작

(2) 복원·정비

가. 경주 월성 관람환경 시설 개선

<표 4-2> 경주 월성 관람환경 시설 개선

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 11. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 17억원(2025년 12억, 2024년 이월 5억원)
사업내용	• 주요 탐방로 정비 및 수목정비, 편의시설 정비 등

나. 경주 월성 서편지 정비

<표 4-3> 경주 월성 서편지 정비

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 1.2억원(2026년)
사업내용	• 서편지 정비 실시설계 용역

다. 경주 월성 지구 예초

<표 4-4> 경주 월성 지구 예초

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사업비	• 3.01억원(2026년)
사업내용	• 경주 월성 지구 예초 실시

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 발굴·연구

가. 경주 월성 발굴조사 및 학술연구

- 월성 A지구(남성벽 및 건물지), C지구(내부 건물지 등), B지구 정밀발굴조사

(2) 복원·정비

가. 경주 월성 서편지 관람환경개선사업

- 탐방로 및 배수로 정비
- 보행등, 경관조명 등 설치
- 울타리 및 안내판 정비

2. 경주 황룡사지

- 신라왕경 최대 불교 사찰의 고증 및 연구를 토대로 복원·정비 사업 추진

1) 사업개요

- (1) 위 치 : 경북 경주시 구황동 320-1 일원
- (2) 사업기간 : 2006년 ~ 계속
- (3) 총사업비 : 2,700억원(국비 1,890억, 지방비 810억)
- (4) 사업내용 :
 - 종합정비계획 수립, 국제학술대회 개최, 기초 및 심화연구, 발굴조사
 - 중문, 금당, 강당, 9층 목탑 등 주요건물 복원·정비
 - 황룡사지 디지털 콘텐츠 구축 및 활용
 - 황룡사역사문화관 건립, 주차장 조성, 광장 정비, 서편 정비 등 사적지 경관 개선

2) 추진경과

- 2005. 09. ~ 2012. 06. : 황룡사 복원 기본계획 및 종합계획 수립
- 2010. 03. ~ 2016. 05. : 황룡사 9층 목탑 모형제작
- 2012. 07. ~ 2026. 12. : 황룡사 복원 심화연구(1~10차)
- 2013. 07. ~ 2017. 08. : 황룡사 역사문화관 건립 및 임시주차장 조성
- 2015. 08. ~ 2020. 03. : 황룡사 남쪽담장 외곽 정비사업 부지 발굴(1차~2차)
- 2018. 01. ~ 2019. 09. : 황룡사지 동·서편 경작부지 정비
- 2021. 07. ~ 2022. 04. : 황룡사지 북편 정비
- 2022. 01. ~ : 황룡사지 중문·남회랑 증강현실 체험 서비스
- 2022. 10. ~ 2024. 06. : 황룡사지 9층 목탑 증강현실 콘텐츠 개발
- 2022. 11. ~ 2024. 12. : 황룡사 남쪽담장 외곽 정비사업 부지 발굴(3차)
- 2023. 03. ~ 2024. 12. : 황룡사지 진입부 기단 정비공사
- 2023. 07 ~ 2025. 12. : 황룡사지 남쪽광장 정비공사

3) 2026년 추진계획

(1) 발굴·연구

가. 경주 황룡사 복원 10차 심화연구

<표 4-5> 경주 황룡사 복원 10차 심화연구

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 01. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 10억원(2026년)
사업내용	• 중금당 및 불상 디지털 복원 콘텐츠 제작, 강당 및 중금당 불상 기본설계 및 BIM 구축 • 황룡사 기타건축 기본계획, 황룡사지 정비사업 학술지원 등

나. 경주 황룡사지 배수체계 개선 계획 수립

<표 4-6> 경주 황룡사지 배수체계 개선 계획 수립

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 08. ~ 2025. 09.
사 업 비	• 3억원(2026년)
사업내용	• 황룡사지 고지형 분석 및 현장 조사를 통한 효율적 배수체계 정비방안 수립

(2) 복원·정비

가. 경주 황룡사지 중심사역 기단정비사업

<표 4-7> 경주 황룡사지 중심사역 기단정비사업

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 09. ~ 2027.12.
사 업 비	• 20억원(2026년)
사업내용	• 목탑자·중금당지(석조가구식기단), 강당지(장대석 외벌대 기단) 기단 정비 • 동서금당자·강당 동서편건물자·회랑자·종루자·경루지(기단 경계표시) 기단 정비

나. 황룡사 역사문화관 전시실 개편

<표 4-8> 황룡사 역사문화관 전시실 개편

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 09. ~ 2026. 11.
사업비	• 20억원(2025년 예산)
사업내용	• 황룡사 역사문화관 2층 전시실 개편

다. 경주 황룡사지 남쪽광장 주변정비사업

<표 4-9> 경주 황룡사지 남쪽광장 주변정비사업 주변정비사업

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사업비	• 2억원(2026년)
사업내용	• 황룡사지 남쪽광장 주변정비사업 실시설계

라. 경주 황룡사지 주변정비사업

<표 4-10> 경주 황룡사지 주변정비사업

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사업비	• 1억원(2026년)
사업내용	• 황룡사지 일원 예초 작업 등

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 발굴·연구

가. 황룡사 복원 11차 심화연구

- 황룡사 복원 심화연구 및 중심사역 디지털 복원 콘텐츠 제작

(2) 복원·정비

가. 황룡사지 중심사역 기단정비사업(60억원)

- 황룡사지 중심사역 건축유적 기단 복원정비(목탑지, 중금당지 외 9개소)

나. 황룡사지 주변정비사업

- 황룡사지 일원 산책로 정비, 경관조명 유지보수, 예초 작업 등

다. 황룡사지 남쪽광장 주변정비사업

- 황룡사지 남쪽광장 내 경관조명, 편의시설, 조경 등

3. 경주 분황사지

- 황룡사, 미탄사지와 함께 신라를 대표하는 사찰벨트 조성

1) 사업개요

- (1) 위 치 : 경북 경주시 분황로 94-11 일원
- (2) 사업기간 : 2020년 ~ 2025년
- (3) 총사업비 : 69억원(국비 48.3억, 지방비 20.7억)
- (4) 사업내용 :
 - 복원·정비를 위한 기본정비계획 수립
 - 복원건물 및 모전석탑 원형 고증연구를 위한 학술대회
 - 분황사지 사역 복원·정비 사업 추진
 - 유적유구 정비 및 관람편의·부대시설 정비

2) 추진경과

- 2017. 06. : 종합정비계획 수립
- 2019. 02. : 사적 제548호 지정
- 2020. 12. ~ 2022. 02. : 종합정비계획(변경) 수립
- 2021. 10. : 분황사지 복원·정비 고증연구 학술대회 개최
- 2021. 12. ~ 2023. 02. : 분황사지 사찰지원시설 건립 세계유산 영향평가 용역
- 2023. 04. ~ 2024. 05. : 분황사지 복원건물 고증연구 용역
- 2024. 08. ~ 2025. 07. : 분황사지 복원건물 고증연구 용역(2차)
- 2025. 10. ~ 2026. 09. : 분황사지 복원건물 고증연구 용역(3차) 시행

3) 2026년 추진계획

(1) 발굴·연구

가. 경주 분황사지 복원건물 고증 연구(4차)

<표 4-11> 경주 분황사지 복원건물 고증 연구(4차)

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 10. ~ 2027. 09.
사 업 비	• 5억원(2026년)
사업내용	• 분황사지 중문 및 남회랑 건축복원 고증연구

(2) 복원·정비

가. 경주 분황사지 화장실 및 주변 시설 보수 공사

<표 4-12> 경주 분황사지 화장실 및 주변 시설 보수 공사

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 2억원(2026년)
사업내용	• 분황사지 화장실 및 주변 시설 보수

나. 경주 분황사지 관람환경시설 개선

<표 4-13> 경주 분황사지 관람환경시설 개선

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 2억원(2026년)
사업내용	• 화장실 내부 보수, 탐방로 및 휴게시설물 정비 등

다. 경주 분황사지 경역 내 화장실 설치 및 야간경관 조명 설치

<표 4-14> 경주 분황사지 경역 내 화장실 설치 및 야간경관 조명 설치

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사업비	• 3.6억원(2025년 3.6억)
사업내용	• 화장실 설치 및 야간경관 조명 설치

라. 경주 분황사지 사찰지원시설(종무소)건립 시행

<표 4-15> 경주 분황사지 사찰지원시설(종무소)건립

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 01. ~ 2026. 12.
사업비	• 7.2억원(2025년 이월)
사업내용	• 종무소 건립을 위한 공사 시행

마. 경주 분황사지 관람편의시설(휴게시설) 설치 및 콘텐츠 구축

<표 4-16> 경주 분황사지 관람편의시설(휴게시설) 설치 및 콘텐츠 구축

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 10. ~ 2026. 01.
사업비	• 1.65억원(2025년 이월)
사업내용	• 경주 분황사지 관람편의시설(휴게시설) 설치 및 콘텐츠 구축

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 발굴·연구

- 가. 분황사지 복원건물 고증연구(5차)
 - 중문 및 남회랑 기본계획안(고증안) 수립
 - 학술대회 개최

(2) 복원·정비

- 가. 분황사지 복원건물 복원정비
 - 중문 및 남회랑 복원정비
- 나. 분황사지 관람환경시설 개선
 - 경내 관람동선 정비 및 휴게시설물 설치 등

4. 경주 구황동 원지 유적 일원

- 구황동 원지 성격 규명을 위한 비교 및 심화연구 및 복원·정비사업 추진

1) 사업개요

- (1) 위 치 : 경북 경주시 구황동 292-2 일원
- (2) 사업기간 : 2020년 ~ 2025년
- (3) 총사업비 : 83.5억원(국비 58.45억, 지방비 25.05억)
- (4) 사업내용 :
 - 유적의 복원·정비를 위한 종합정비계획 수립 및 학술연구
 - 유구 및 수리시설(건물지 3동, 연못 호안, 수로, 축대, 담장지, 양수시설 등) 정비
 - 주변 조경 및 편의시설 정비 등

2) 추진경과

- 1999. 05. ~ 1999. 10. : 시굴조사(국립경주문화재연구소)
- 1999. 11. ~ 2004. 03. : 발굴조사(국립경주문화재연구소)
- 2008. 04. : 경주 구황동 원지 복원정비 기본계획 수립
- 2013. : 주변정비공사(담장설치 H=0.6m, L=164.5m, 마사토 깔기)
- 2019. 02. : 국가지정문화유산 사적 제549호 지정
- 2021. 10. : 구황동 원지 학술대회 개최
- 2021. 11. ~ 2022. 02. : 구황동 원지 복원정비 종합정비계획 수립 및 실시설계용역
- 2022. 12. ~ 2025. 11. : 구황동 원지 일원 정비

3) 2026년 추진계획

(1) 복원·정비

가. 경주 구황동 원지 유적 일원 정비사업

<표 4-17> 경주 구황동 원지 유적 일원 정비사업

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 03. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 2억원(2026년)
사업내용	• 종합정비계획 2단계 사업 시행을 위한 실시설계

나. 경주 구황동 원지 유적 일원 경관조명 설치

<표 4-18> 경주 구황동 원지 유적 일원 경관조명 설치

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 03. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 1억원(2026년)
사업내용	• 경관조명 설치를 위한 디자인 및 실시설계

다. 경주 구황동 원지 유적 일원 예초

<표 4-19> 경주 구황동 원지 유적 일원 예초

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 03. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 1억원(2026년)
사업내용	• 경주 구황동 원지 유적 일원 예초 실시

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 복원·정비

가. 2단계 정비사업 시행

- 2단계 정비(관람편의 시설 정비, 내부 관람동선 개편 및 외부 진입로 정비 등)

5. 경주 미탄사지 삼층석탑

- 미탄사지의 전체적인 경역 및 공간구성 확인 및 복원·정비사업 추진

1) 사업개요

- (1) 위 치 : 경북 경주시 구황동 441 일원
- (2) 사업기간 : 2018년 ~ 2030년
- (3) 총사업비 : 82억원(국비 57.4억, 지방비 24.6억)
- (4) 사업내용
 - 미탄사지 발굴조사 및 복원·정비사업
 - 복원·정비를 위한 종합정비계획 수립 및 학술대회

2) 추진경과

- 2018. 01. ~ 2018. 12. : 토지매입(1필지 / 1,327㎡)
- 2018. 05. ~ 2020. 12. : 발굴조사(1차 ~ 3차, 조사면적 10,500㎡)
 - 삼층석탑 남편 가람배치와 선대유구 조사
 - 삼층석탑 서편 사역범위와 가람배치 조사
- 2021. 03. ~ 2021. 10. : 발굴조사(4차, 조사면적 3,000㎡)
 - 삼층석탑 북편 선대유구 추가 조사
- 2022. 06. ~ 2023. 09. : 발굴조사(5차, 조사면적 4,280㎡)
 - 통일신라 ~ 조선전기 건물지, 담장 배수로 등 확인, 미탄사지 동쪽 방리도로 확인
- 2022. 12. ~ 2024. 12. : 경주 미탄사지 종합정비계획 수립
- 2024. 01. ~ 2024. 09. : 경주 미탄사지 경역정비공사
- 2025. 05. ~ 2026. 06. : 미탄사지 종합정비 실시설계용역 시행

3) 2026년 추진계획

(1) 복원·정비

가. 경주 미탄사지 일원 정비공사 시행

<표 4-20> 경주 미탄사지 일원 정비공사 시행

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 06. ~ 2028. 12.
사 업 비	• 15억원(2026년)
사업내용	• 미탄사지 일원정비공사 시행(배수, 포장, 원지, 유구 등)

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 복원·정비

가. 미탄사지 일원 정비공사 계속

- 유구 정비(원지, 건물지, 우물, 담당지), 주변 정비(포장, 배수) 등

6. 경주 동궁과 월지

- 월성과 통합된 왕성 권역으로 입체적·맥락적 경관 정비 사업 추진

1) 사업개요

- (1) 위 치 : 경북 경주시 인왕동 26 일원
- (2) 사업기간 : 2010년 ~ 계속
- (3) 총사업비 : 1,250억원(국비 875억, 지방비 375억)
- (4) 사업내용 :
 - 발굴조사 및 학술연구
 - 동궁과 월지 야간경관 정비
 - 신라왕경 방 구역 내 토지보상(118필지 / 169,468㎡)
 - 신라왕경 방 물리탐사 및 시굴조사
 - 신라왕경 방 정비 및 편의시설 구축

2) 추진경과

- 2010. 03. ~ 2010. 11. : 신라정원 종합조사 기초학술연구
- 2010. 03. ~ 2012. 03. : 종합정비기본계획 수립
- 2012. 10. ~ 2014. 12. : 복원 세부계획 및 기본설계 완료
- 2015. 05. : 신라왕경 방 구역 내 토지보상업무 위·수탁(한국부동산원)
- 2015. 12. : 종합정비기본계획 및 기본설계 승인(문화재청)
- 2016. 02. ~ 2019. 03. : 서편 건물지 복원 실시설계 및 연구용역 시행

- 2016. 08. : 동궁과 월지 문화재보호구역 지정
- 2016. 12. : 신라왕경 방 타당성조사 및 기본계획 수립
- 2017. 10. : 서편 건물지 복원 실시설계 및 연구용역 조건부 승인(세계유산센터 협의, 발굴조사 결과 반영)
- 2018. 01. ~ 2018. 11. : 서편지 건물 복원 유네스코 세계유산보고서 용역 완료
- 2018. 10. 01. : 서편 건물지 복원 실시설계 승인
- 2018. 11. 08. : 세계유산센터 2차 회신
- 2018. 11. ~ 2019. 08. : 세계유산센터 회신에 따른 해결방안 협의
- 2019. 01. ~ 2019. 06. : 디지털 콘텐츠연구 대행사업
- 2019. 10. : 동궁과 월지 발굴조사 및 학술연구 대행사업 시행(발굴조사, 학술연구)
- 2020. 01. ~ 2020. 11. : 동궁과 월지 방문객 센터 기본구상 및 타당성 분석 용역
- 2020. 02. ~ 2022. 07. : 신라왕경 방 정비 및 활용 기본계획 수립 완료
- 2020. 02. ~ 2020. 10. : 3호 건물 리모델링 및 탐방로 정비 설계
- 2020. 09. : 3호 건물 리모델링 및 탐방로 정비설계 승인(문화재청)
- 2020. 11. ~ 2022. 12. : 3호 건물 리모델링 및 탐방로 정비
- 2021. 01. ~ 2022. 04. : 동궁과 월지 관람환경개선 및 탐방로 정비 사업 준공
- 2021. 03. ~ 2022. 10. : 신라왕경 방 기반조성 및 배수로 정비사업 완료
- 2021. 04. : 동궁과 월지 방문자센터 건립 기본계획 및 기본설계 시행
- 2021. 04. : 신라왕경 방 토지매입 완료(118필지/169,468㎡)
- 2021. 11. ~ 2022. 09. : 동궁과 월지 3호 건물 단청(전통안료)공사 준공
- 2022. 05. ~ 2022. 08. : 동궁과 월지 1호 건물 보수공사 준공
- 2022. 08. : 동궁과 월지 방문자센터 건립 기본계획 및 기본설계 사적분과위원회 승인, 신라왕경 방 정비 기본계획 보고 사적분과위원회 접수
- 2022. 09. : 신라왕경 방 정비 기본계획 사적분과위원회 승인
- 2022. 04. ~ 2022. 12. : 동궁과 월지 야간경관조명 종합정비 기본계획 용역 시행

- 2023. 03. : 동궁과 월지 야간경관조명 정비 실시설계 용역시행(연꽃단지)
- 2023. 04. : 동궁과 월지 방문자센터 건립 실시설계 공모 관리 용역 시행
- 2023. 02. ~ 2023. 07. : 신라왕경 방 정비·활용사업 실시설계 용역 시행
- 2023. 12. : 신라왕경 방 정비·활용사업 시행
- 2024. 04. : 신라왕경 방 정비·활용사업 설계변경용역 시행
- 2024. 09. : 신라왕경 방 정비·활용사업 설계변경용역 완료
- 2024. 09. : 전각 및 호안석축 야간경관조명 정비 실시설계 용역 시행
- 2024. 09. ~ 2024. 11. : 연꽃단지 야간경관 기본 콘텐츠 제작 및 디자인 용역 완료
- 2024. 10. : 관람편의시설 정비 실시설계 용역 시행
- 2024. 11. : 연꽃단지 정비 실시설계 용역 시행
- 2024. 11. : 임시주차장 정비 실시설계 용역 시행
- 2025. 10. : 연꽃단지 정비 공사 준공
- 2025. 10. : 관람편의시설 및 임시주차장 정비 준공

3) 2026년 추진계획

(1) 발굴·연구

가. 경주 동궁과 월지 발굴조사 및 학술연구

<표 4-21> 경주 동궁과 월지 발굴조사 및 학술연구

구 분	내 용
사업기간	● 2019. 10. ~ 2026. 12.
사업비	● 86억원(2025년 집행완료) / 16억원(2026년)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ● 동궁과 월지 발굴조사, 학술연구 보고서 발간 ● 동궁과 월지 서편 나지구 발굴조사 및 신라왕경 학술대회 개최 ● 신라왕경 월성 이남 지역 고지형 및 고환경 분석 연구 ● 신라왕경 조사자료 DB 구축 ● 나지구 원지 조경석 산지 분석연구 ● 1980년대 동궁과 월지 남편 주차장 부지 조사성과 정리 및 발간 ● 한 중 고대 도성과 문화비교연구 ● 대국민 유물공개 및 홍보 콘텐츠 제작 및 배포

(2) 복원·정비

가. 신라왕경 방 정비·활용사업 시행

<표 4-22> 신라왕경 방 정비·활용사업 시행

구 분	내 용
사업기간	• 2023. 12. ~ 2026. 12.
사업비	• 33.5억원(2026년 4억, 2024년도 이월 29.5억)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 건축, 기계, 토목, 조경공사(편의시설 1개동, 배수로 설치, 탐방로 조성, 잔디식재 등) • 전기공사(편의시설 조명공사, 외부 보안등 및 가로등 공사 등) • 통신공사(CCTV설치 및 제어기 설치공사 등) • 소방공사(편의시설 내 소방공사) • 신라왕경 방 정비·활용사업 책임감리 용역

(3) 활용

가. 경주 동궁과 월지 홍보전시관 기본계획 수립

<표 4-23> 경주 동궁과 월지 홍보전시관 기본계획 수립

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 09. 예정.
사업비	• 2억원(2026년)
사업내용	• 동궁과 월지 홍보전시관 기본계획 수립

나. 경주 동궁과 월지 야간경관조명 정비사업(전각 및 호안석축)

<표 4-24> 경주 동궁과 월지 야간경관조명 정비사업(전각 및 호안석축)

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 04. 예정.
사업비	• 16.5억원(2026년 15억, 2025년 이월 1.5억)
사업내용	• 동궁과 월지 야간경관조명 정비(전각 및 호안석축) 실시

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 발굴·연구

- 가. 동궁과 월지 발굴조사 및 학술연구(계속)
- 나. 신라왕경 및 동궁과 월지 관련 학술대회 개최(계속)

(2) 복원·정비

- 가. 동궁과 월지 1·3·5호 건물 유지관리(단청 등)
- 나. 동궁과 월지 서편 건물지 디지털 재현
 - 동궁과 월지 서편 건물지 증강현실 콘텐츠 제작 및 구축
- 다. 신라왕경 방 정비 및 활용사업(계속)

(3) 활용

- 가. 동궁과 월지 홍보관 실시설계 및 건립
- 나. 동궁과 월지 야간경관 정비공사(전각 및 호안석축)

7. 경주 첨성대

- 첨성대의 학술적 고증 연구를 통한 진정성 및 가치 확인

1) 사업개요

- (1) 위 치 : 경북 경주시 인왕동 839-1 일원
- (2) 사업기간 : 2000년 ~ 계속
- (3) 사업내용 :
 - 첨성대 주변정비 및 보존·관리

2) 추진경과

- 1999. ~ 2001. : 중요문화재 정기안전점검, 석조문화재 보존관리연구
- 2009. : 경주 첨성대 실측훼손도 평가
- 2010. : 첨성대 천문과학관 조성 타당성 조사 및 기본계획
- 2011. : 석조문화재 안전관리방안 연구-첨성대를 중심으로
- 2012. : 경주 첨성대 훼손도 조사 및 정밀 실측
- 2013. : 경주 첨성대 정밀 안전진단
- 2015. : 경주 첨성대 정밀구조안전진단
- 2019. : 경주 첨성대 주변 물리탐사
- 2019. 06. : 학술심포지엄 「경주 첨성대로 본 하늘 위 역사문화콘텐츠」 개최
- 2024. 07. : 신라왕경 고천문 국제학술대회 및 토크콘서트 개최
- 2025. 09. : 첨성대 주변 시설물(안내소, 안내판 등) 정비공사 준공
- 2025. 04. : 첨성대 관람환경시설 기본계획 및 설계용역 착수

3) 2026년 추진계획

(1) 복원·정비

가. 경주 첨성대 관람환경시설 기본계획 및 실시설계

<표 4-25> 경주 첨성대 관람환경시설 기본계획

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 01. ~ 2026. 04.
사 업 비	• 1.07억원(2025년 집행완료)
사업내용	• 첨성대 주변 관람편의시설 정비방안 • 홍보 영상관 신축 검토 • 천문관련 콘텐츠 및 디지털 기술을 활용한 체험 프로그램 구상 (전시, 영상 등)

<표 4-26> 경주 첨성대 홍보체험관 건립 실시설계

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 06. 예정
사 업 비	• 2억원(2026년)
사업내용	• 첨성대 홍보체험관 실시설계 용역

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 복원·정비

가. 첨성대 홍보영상관 건립 및 주변 관람편의시설 정비

- 첨성대 주변 관람편의시설 정비
- 홍보 영상관 건립
- 천문관련 콘텐츠 및 디지털 기술을 활용한 체험 프로그램 구상 (전시, 영상 등)

8. 경주 대릉원 일원

- 신라왕경과 고분유적의 역사적 실체 고증, 훼손된 신라 고분의 복원정비를 통한 고분 경관 재현

1) 사업개요

- (1) 위 치 : 경북 경주시 황오동 367 일원
- (2) 사업기간 : 2008년 ~ 2025년
- (3) 총사업비 : 1,818억원(국비 1,273억, 지방비 545억)
- (4) 사업내용 :
 - 쪽샘지구 분포조사 및 정밀발굴조사
 - 황남동 120호분 주변 정밀발굴조사
 - 대형고분 재발굴조사
 - 대릉원 일원 내 주변정비(쪽샘지구, 늦전지구 등)
 - 금관총 보존전시공간 및 고분정보센터 건립
 - 대릉원 일원 내 토지 및 지장물 매입(1,227필지 / 710,817㎡)
 - 대릉원 일원 내 예초

2) 추진경과

- 2007. 03. ~ 현재 : 쪽샘지구 분포조사(14개 조사구역 중 11개 구역 완료)
- 2008. 01. ~ 현재 : 대릉원 일원 내 토지 및 지장물 매입(1,115필지 / 690,324.6㎡)
- 2013. 07. ~ 2015. 02. : 경주시 도심고분공원 기본조사 및 조성계획 수립
- 2014. 03. : 쪽샘유적발굴관 개관

- 2014. 05. ~ 2023. 06. : 쪽샘지구 44호분 정밀발굴조사 실시
- 2015. 02. ~ 2015. 07. : 금관총 재발굴조사 실시
- 2015. 08. ~ 2016. 12. : 쪽샘지구 임시정비공사(고분 복원 23기, 탐방로, 임시주차장)
- 2016. 08. : 금관총 복원 및 전시활용 기본계획 승인(문화재위원회)
- 2016. 04. ~ 2017. 10. : 서봉총 재발굴조사 실시
- 2017. 03. ~ 2018. 12. : 대릉원 일원 고분 자료집성 및 분포조사 실시
- 2017. 05. ~ 2017. 09. : 쪽샘지구 야간경관조명 공사 시행
- 2017. 08. ~ 2018. 07. : 천마총 리모델링 공사 시행
- 2018. 02. ~ 2018. 04. : 금관총 복원 및 전시공간 설계 공모
- 2018. 05. ~ 현재 : 황남동 120호분 주변 시굴조사, 정밀발굴조사 실시
- 2018. 06. ~ 2020. 12. : 금령총 재발굴조사 실시
- 2018. 09. ~ 2018. 11. : 금관총 보존전시공간 및 고분정보센터 건립부지 사발굴조사
- 2018. 11. : 금관총 보존전시공간 설계 승인(문화재청)
- 2018. 12. ~ 2022. 02. : 금관총 보존전시공간 건립공사 완료
- 2019. 07. ~ 2020. 01. : 황남지구 임시주차장 조성공사 시행
- 2019. 11. : 고분정보센터 설계 승인
- 2020. 05. ~ 2021. 06. : 늦전지구 주변정비공사 시행
- 2020. 07. ~ 2021. 12. : 쪽샘지구 주변정비공사 시행
- 2020. 12. ~ 2022. 12. : 고분정보센터 건립공사 완료
- 2022. 05. : 금관총 보존전시공간 전시 계획 및 제작·설치 설계 승인
- 2022. 08. : 금관총 보존전시공간 전시 계획 및 제작·설치 완료 및 시범 개방
- 2022. 11. ~ 2023. 06. : 천마총 및 쪽샘지구 마무리 공사 시행
- 2022. 11. 금관총 고분정보센터 정보화 구축 및 제작·설치 설계 승인
- 2023. 05. : 금관총 고분정보센터 정보화 구축 및 제작·설치 완료
- 2023. 06. : 금관총 보존전시공간 및 신라고분정보센터 개관

- 2024. 07. : 쪽샘지구 관람편의시설 조성계획 용역 시행
- 2025. 06. : 쪽샘44호분 보호각 개보수 기본설계 용역 시행

3) 2026년 추진계획

(1) 발굴·연구

가. 경주 대릉원 일원 쪽샘지구 분포조사 및 정밀발굴조사

<표 4-27> 경주 대릉원 일원 쪽샘지구 분포조사 및 정밀발굴조사

구 분	내 용
사업기간	● 2007. 03. ~ 2026. 12.
사 업 비	● 32억원(2026년)
사업내용	● 쪽샘지구(N·J지구) 신라고분 분포·발굴조사 ● 인왕·황오지구 신라고분 분포·발굴조사

나. 경주 황남동 120호분 주변 정밀발굴조사 및 경역정비

<표 4-28> 경주 황남동 120호분 주변 정밀발굴조사 및 경역정비

구 분	내 용
사업기간	● 2018. 05. ~ 2026. 12.
사 업 비	● 15.06억원(2026년)
사업내용	● 황남동 120호분 정밀발굴조사 및 유물 보존처리 ● 황남동 120호분 발굴 학술대회, 성과보고회 등 개최

(2) 복원·정비

가. 경주 대릉원 일원 내 토지 및 지장물 매입

<표 4-29> 경주 대릉원 일원 내 토지 및 지장물 매입

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 05. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 11.6억원(2026년 9억원, 2025년 이월 2.6억원)
사업내용	• 토지매입 및 지장물 철거

나. 경주 대릉원 일원 예초

<표 4-30> 경주 대릉원 일원 예초

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 05. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 3.78억원(2026년)
사업내용	• 대릉원 일원 내 예초 실시

다. 경주 대릉원 일원(쪽샘지구) 관람편의시설 실시설계

<표 4-31> 경주 대릉원 일원(쪽샘지구) 관람편의시설 실시설계

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 06. ~ 2027. 06.
사 업 비	• 3.8억원(2026년 예산)
사업내용	• 경주 대릉원 일원(쪽샘지구) 관람편의시설 조성을 위한 실시설계 용역

라. 경주 대릉원 일원 재선충 방제 및 고사목 제거

<표 4-32> 경주 대릉원 일원 재선충 방제 및 고사목 제거

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 06. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 0.4억원(2026년 예산)
사업내용	• 경주 대릉원 일원 재선충 방제 및 고사목 제거

마. 경주 대릉원 일원 이동식 CCTV설치

<표 4-33> 경주 대릉원 일원 이동식 CCTV설치

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 04. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 1.4억원(2026년 예산)
사업내용	• 경주 대릉원 일원의 화재 및 재해예방, 고분에 올라가는 행위 등 예방

바. 경주 대릉원 일원 보수 및 정비

<표 4-34> 경주 대릉원 일원 보수 및 정비

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 06. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 1억원(2026년 예산)
사업내용	• 경주 대릉원 일원 보수 및 정비 진행

(3) 활용

가. 쪽샘유적발굴관 상시 공개 운영

<표 4-35> 쪽샘유적발굴관 상시 공개 운영

구 분	내 용
사업기간	• 2024. 11. ~ 2026. 12.
사업비	• 경주 대릉원 일원 쪽샘지구 분포조사 및 정밀발굴조사 예산에 포함
사업내용	• 쪽샘지구 44호분 복원축조실험 상시 공개 및 전문 해설 서비스 제공

나. 쪽샘44호분 보호각 개보수 기본설계 용역

<표 4-36> 쪽샘44호분 보호각 개보수 기본설계 용역

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 06. ~ 2026. 06.
사업비	• 2.5억원(2024년 예산)
사업내용	• 쪽샘유적발굴관 구조안전성 검토를 통한 리모델링 설계 • 전시콘텐츠 발굴 및 적용 방향 검토

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 발굴·연구

가. 경주 쪽샘지구 및 황오·인왕지구 분포조사 및 정밀발굴조사(계속)

나. 경주 황남동 120호분 발굴보고서 작성

(2) 복원·정비

가. 대릉원 일원 내 토지 및 지장물 매입(계속)

나. 대릉원 일원 예초

- 다. 쪽샘지구 관람편의시설 실시설계 시행
- 라. 쪽샘지구 종합정비계획 수립
- 마. 대릉원 일원 이동식 CCTV설치
- 바. 대릉원 일원 보수 및 정비

(3) 활용

- 가. 쪽샘44호분 보호각 개보수 실시설계 시행

9. 경주 동부사적지대

- 월성과 첨성대로 연결되는 공간적 구조 확인
- 신라왕경의 구심점인 월성과의 연계 공간을 입체적·맥락적으로 가시화
- 장기적으로 월성, 동궁과 월지, 고분군 연결로 정비
- 월성의 동선과 연계되는 유적지대로 월성과의 관계를 고증하는 연구

1) 사업개요

- (1) 위 치 : 경북 경주시 황남동 104-1 일원
- (2) 사업기간 : 2014년 ~ 계속
- (3) 총사업비 : 225.5억원(국비 157.9억, 지방비 67.6억)
- (4) 사업내용 :
 - 경주 발천의 실체 확인을 위한 발굴조사
 - 석교복원 3개소 및 수로정비 1식
 - 탐방로정비 및 조명시설 설치 등

2) 추진경과

- 2015. 05. ~ 2020. 12. : 첨성로 남편 발굴조사(서라벌문화재연구원 5,280㎡)
- 2019. 11. ~ 2021. 12. : 첨성로 북편 발굴조사(신라문화유산연구원 5,817㎡)
- 2020. 03. : 발천 기본정비계획 수립 용역 착수
- 2021. 04. : 발천 온라인 현장설명회 및 정비 학술대회 개최
- 2025. 01. : 발천 정비사업 부지(첨성로 북편) 추가 발굴조사 완료
- 2025. 01. : 발천(첨성로 북편) 석교지 북편 도로부지 발굴조사 완료
- 2025. 07. : 경주 동부사적지대 석교지 남쪽부분 정밀 발굴조사 완료

- 2024. 08. : 동부사적지대 발천유적 보존관리 용역 착수
- 2024. 12. : 동부사적지대 발천 고고자료 집성 및 학술대회 용역 착수
- 2025. 10. : 발천유적 석재유구 및 주변정비공사 완료

3) 2026년 추진계획

(1) 발굴·연구

가. 경주 동부사적지대 발천 정비 계획 수립을 위한 자료 집성 및 학술대회 개최

<표 4-37> 경주 동부사적지대 발천 정비 계획 수립을 위한 자료 집성 및 학술대회 개최

구 분	내 용
사업기간	● 2024. 11. ~ 2026. 06.
사업비	● 1.5억원(2025년 0.5억, 2024년 1억)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ● 경주 동부사적지대 일대 문헌기록 검토 및 역사학적 분석 ● 경주 동부사적지대 고지형 분석과 기존 고지형 검토 ● 경주 동부사적지대 주변의 고고학적 현황과 연구검토 ● 학술대회 개최

나. 경주 동부사적지대 발천 정비기본계획 수립 학술연구

<표 4-38> 경주 동부사적지대 발천 정비기본계획 수립 학술연구

구 분	내 용
사업기간	● 2026. 06. 예정
사업비	● 1억원
사업내용	● 경주 동부사적지대 발천 정비기본계획 수립 학술연구

(2) 복원·정비

가. 경주 동부사적지대 발천 석교지 재현 및 수로 정비

<표 4-39> 경주 동부사적지대 발천 석교지 재현 및 수로 정비

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사업비	• 2억원(2026년 예산)
사업내용	• 동부사적지대 발천 석교지 재현 및 수로정비 실시설계

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 복원·정비

가. 2025년 발천 일대 자료 집성 및 학술대회 추진 경과를 반영하여 추가 발굴 및 정비 계획 수립

나. 발굴자료 및 정비계획에 따라 발천 석교지 재현 및 수로 정비 시행

10. 경주 춘양교지와 월정교지

- 신라 궁성과 남산의 연결통로로 신라왕경의 공간적 연계성 고증 추진
- 장기적으로 도당산, 인왕동사지, 남천 수변 환경과 연계하여 정비 실시

1) 사업개요

- (1) 위 치 : 경북 경주시 교동 274, 인왕동 921-1 일원
- (2) 사업기간 : 2006년 ~ 2030년
- (3) 총사업비 : 710억원(국비 497억, 지방비 213억)
- (4) 사업내용 :
 - 춘양교지 및 월정교지 예초
 - 춘양교지 관람편의시설 조성부지 정비
 - 춘양교지 및 월정교지 경관 정비 및 개선

2) 추진경과

- 2016. 08. : 월정교 누교 복원공사 준공
- 2018. 04. : 월정교 문루 복원공사 준공
- 2018. 10. : 월정교 주변정비공사 준공
- 2019. 01. : 월정교 문루 전시관 공사 준공
- 2019. 05. : 춘양교지 주변정비사업 실시설계 승인
- 2020. 05. : 춘양교지 석재유물 정비사업 완료
- 2021. 03. : 춘양교지 종합정비기본계획 수립
- 2021. 04. : 춘양교지 및 월정교 주변 보수정비공사 준공
- 2021. 10. : 춘양교지 관람편의시설 기본계획 및 기본설계 승인
- 2021. 11. : 춘양교지 3D 정밀실측 및 유구노출 대행사업 완료

- 2022. 05. : 춘양교지 경관조명 설치공사 완료
- 2022. 07. : 춘양교지 관람편의시설 실시설계 시행
- 2022. 08. : 춘양교지 관람편의시설 조성부지 내 정밀발굴조사 완료
- 2022. 10. ~ 2023. 11. : 3D 정밀실측 및 학술대회개최 대행사업 시행
- 2023. 06. ~ 2023. 11. : 춘양교지 관람편의시설 조성부지 정비사업 시행

3) 2026년 추진계획

(1) 복원·정비

가. 경주 춘양교지와 월정교지 예초

<표 4-40> 경주 춘양교지와 월정교지 예초

구 분	내 용
사업기간	● 2026. 01. ~ 2026. 12.
사업비	● 0.7억원(2026년)
사업내용	● 경주 춘양교지와 월정교지 내 예초 실시(53,240㎡)

나. 경주 춘양교지 토지 및 지장물 매입

<표 4-41> 경주 춘양교지 토지 및 지장물 매입

구 분	내 용
사업기간	● 2026. 01. ~ 2026. 12.
사업비	● 8억원(2026년)
사업내용	● 경주 춘양교지 미매입 토지 및 지장물 보상 매입 (1필지 / A=661㎡)

다. 사적지 정비

<표 4-42> 사적지 정비

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사업비	• 11억원(2026년)
사업내용	• 진입로, 보행로, 데크 보수 등 • 월정교 교각 받침목(첨차) 단정보수

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 발굴·연구

- 가. 교대지 및 주변부 발굴조사 실시
- 교대지 및 주변부 발굴조사

(2) 복원·정비

- 가. 지정구역 내 미매입 토지의 지속적 매입

11. 경주 인왕동사지

- 월성과의 관련성 확인을 위한 심화연구 및 주변 시설물과의 관계 파악
- 인왕동사지 석탑 복원 등 정비사업 추진

1) 사업개요

- (1) 위 치 : 경북 경주시 인왕동 342 일원
- (2) 사업기간 : 2020년 ~ 계속
- (3) 총사업비 : 90억원(국비 63억, 지방비 27억)
- (4) 사업내용 :
 - 인왕동사지 구역 내 토지매입(8필지 / 8,401m²)
 - 미발굴 지역 발굴조사(20,281m²)
 - 종합정비계획 수립 및 학술연구
 - 건물유구 및 석탑복원 등 편의시설 정비

2) 추진경과

- 2002. 11. ~ 2010. 12. : 발굴조사(국립경주문화재연구소)
- 2013. 10. : 유적정비 기본계획 수립
- 2018. : 토지매입(1필지 / 3,178m²)
- 2019. : 토지매입(3필지 / 8,581m²)
- 2019. 12. : 석탑 복원 등 경역정비공사 실시설계 착수
- 2021. 03. : 토지매입(3필지 / 4,229m²)
- 2021. 12. : CCTV 설치(1개소 / 4대)

- 2023. 01. ~ 2024. 12. : 경주 인왕동 사지 경역정비공사 시행
- 2023. 03. : 토지매입(2필지 / 1,805㎡)

3) 2026년 추진계획

(1) 복원·정비

가. 경주 인왕동사지 석탑복원 시행

<표 4-43> 경주 인왕동사지 석탑복원 시행

구 분	내 용
사업기간	● 2026. 01. ~ 2027. 06.
사 업 비	● 30억(2026년)
사업내용	● 인왕동사지 석탑(2기) 복원 시행

나. 경주 인왕동사지 유적정비 심화연구 용역

<표 4-44> 경주 인왕동사지 유적정비 심화연구 용역

구 분	내 용
사업기간	● 2025. 09. ~ 2026. 05.
사 업 비	● 0.63억원(2025년 이월)
사업내용	● 경주 인왕동 사지 복원 정비안 마련, 석탑 복원 실시설계

다. 경주 인왕동사지 주변정비공사

<표 4-45> 경주 인왕동사지 주변정비공사

구 분	내 용
사업기간	● 2025. 01. ~ 2026. 12.
사 업 비	● 2.53억원(2025년 이월)
사업내용	● 경주 인왕동사지 주변정비(야간조명 설치, 유구보호시설 도색, 수목식재, CCTV설치 등)

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 발굴·연구

- 가. 연지 남편 발굴조사 실시
 - 매입된 연지남편 발굴

(2) 복원·정비

- 가. 인왕동사지 복원정비공사 실시
 - 동·서탑 등 복원 정비

12. 경주 천관사지

- 전체적인 사역 확인 및 주변 시설과의 관계 확인
- 김유신과 천관녀의 설화를 스토리텔링으로 개발하여 활용방안 모색
- 천관사지 사역 내외 주요 시설에 대한 복원·정비사업 추진

1) 사업개요

- (1) 위 치 : 경북 경주시 교동 243 일원
- (2) 사업기간 : 2016년 ~ 2035년
- (3) 총사업비 : 67억원(국비 46.9억, 지방비 20.1억)
- (4) 사업내용 :
 - 건물지 초석 노출정비 : 금당지, 강당지, 추정승방지, 문지
 - 기타시설 정비 : 석조시설, 담장지, 석등, 우물
 - 편의시설 : 잔디식재, 관람로 설치, 안내판 설치 등

2) 추진경과

- 2000. 05. ~ 2001. 12. : 1차 발굴조사(국립경주문화재연구소 9,015m²)
- 2008. 01. ~ 2008. 12. : 편입 토지보상(1.3억)
- 2008. 08. ~ 2008. 11. : 정비공사 실시설계용역
- 2012. 06. ~ 2013. 06. : 2차 발굴조사(신라문화유산연구원 9,453m²)
- 2015. 06. : 종합정비계획 수립
- 2017. 11. ~ 2019. 11. : 석탑복원 등 경역정비공사 준공
- 2016. 07. ~ 2018. 12. : 경역정비 실시설계용역

- 2017. 11. : 3차 발굴조사(신라문화유산연구원)
- 2017. 07. ~ 2018. 10. : 경역정비공사(석탑복원 등)
- 2017. 09. ~ 2018. 05. : 4차 발굴조사(신라문화유산연구원 1,900㎡)
- 2020. 10. ~ 2021. 12. : 천관사지 경역정비공사
- 2020. 12. : 토지매입(1필지 / 1,653㎡)
- 2022. 05. ~ 2022. 11. : 천관사지 경역정비공사(잔디식재, 보호책)
- 2023. 03. : CCTV 설치
- 2023. 02. ~ 2023. 12. : 천관사지 주변정비공사(예초)
- 2023. 08. ~ 2023. 12. : 천관사지 주변정비공사(관람동선 및 주차장)
- 2024. 07. ~ 2024. 10. : 천관사지 주변정비공사(예초)
- 2025. 04. ~ 2025. 10. : 천관사지 주변정비공사(예초)
- 2025. 09. : 경역정비 실시설계 용역 완료

3) 2026년 추진계획

(1) 복원·정비

가. 경주 천관사지 주변정비

<표 4-46> 경주 천관사지 주변정비

구 분	내 용
사업기간	● 2026. 01. ~ 2026. 12.
사업비	● 0.3억원(2026년)
사업내용	● 천관사지 환경정비(예초작업 15,300㎡)

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 복원·정비

- 가. 경주 천관사지 발굴조사
 - 연지 및 경역의 복서측(회랑외곽) 발굴조사
- 나. 경주 천관사지 경역정비
 - 경역 내 배수로 등 정비 및 유적정비(주차장, 신라도로 재현 등)

13. 경주 낭산 일원

- 낭산 일대에 산재한 유적들의 검토를 통한 신라왕경 내 낭산의 역사적인 위치 확인
- 유적기본정비계획 및 낭산 일원 종합정비계획 수립을 통한 복원정비사업 추진

1) 사업개요

(1) 위 치 : 경북 경주시 구황동 100번지 일원

(2) 사업기간 : 2010년 ~ 2025년

(3) 총사업비 : 268억원(국비 187.6억, 지방비 80.4억)

(4) 사업내용 :

- 傳 황복사지 발굴조사
- 傳 황복사지 복원·정비를 위한 기본정비계획 수립
- 傳 황복사지의 학술적 성격 규명을 위한 학술대회 개최
- 경주 낭산 일원 내 토지 및 지장물 매입(549필지 / 889,505㎡)
- 고운 최치원 선생 독서당 재건
- 경주 낭산 일원 종합정비계획 수립

2) 추진경과

- 2010. 01. ~ 2025. 10. : 토지 및 지장물 매입(109필지 / 170,074㎡)
- 2014. : 선덕여왕릉 잔디식재 및 진입로 보수
- 2018. : 낭산 마애보살삼존좌상 정밀 실측 작업
- 2016. 09. ~ 2021. 05. : 추정 왕릉지 및 傳 황복사지 발굴조사(21,045㎡)
- 2016. 09. ~ 2017. 02. (1차) : 추정 왕릉지(석재) 및 건물지·담장 확인

- 2017. 08. ~ 2018. 02. (2차) : 십이지신상 기단 건물지·도로 등 주요 건물지 확인
- 2018. 12. ~ 2019. 04. (3차) : 금당지·중문지·대석단 및 회랑지 등 확인
- 2019. 07. (4차, 시굴) : 유물포함층 및 (추정)연못 확인
- 2020. 11. ~ 2021. 05. (5차) : 연지, 와무지, 우물, 구상유구 등 확인
- 2021. 04. ~ 2023. 06. : 황복사지 종합정비계획 수립
- 2022. 02. ~ 2023. 04. : 낭산 일원 종합정비계획 수립
- 2023. 10. ~ 2024. 11. : 낭산 일원 황복사지 고증연구
- 2024. 06. ~ 2024. 12. : 낭산 일원 심화연구 및 보존·정비를 위한 학술대회 개최
- 2024. 09. ~ 2025. 10. : 낭산 일원 석조유산 현황조사 및 분석연구
- 2024. 12. ~ 2025. 06. : 낭산 일원 국가유산 정비 가이드라인 마련 연구 용역
- 2025. 06. ~ 2026. 04. : 낭산 일원 시굴조사 및 기초학술조사
- 2025. 09. ~ 2026. 08. : 낭산 일원 세부정비계획 수립

3) 2026년 추진계획

(1) 발굴·연구

가. 경주 낭산 일원 시굴조사 및 기초학술조사

<표 4-47> 경주 낭산 일원 시굴조사 및 기초학술조사

구 분	내 용
사업기간	● 2025. 06. ~ 2026. 04.
사업비	● 6.5억원(2025년 예산)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ● 경주 능지탐지 일원 시굴 연장조사 및 정밀발굴조사 ● 경주 능지탐지 콜로키움 개최 및 기초자료보고서 발간 ● 경주 낭산 마을조사

나. 경주 낭산 일원 학술·발굴조사

<표 4-48> 경주 낭산 일원 학술·발굴조사

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 4억원(2026년)
사업내용	• 경주 낭산 일원 학술조사 • 경주 능지탐지 일원 발굴조사

(2) 복원·정비

가. 경주 낭산 일원 세부정비계획 수립

<표 4-49> 경주 낭산 일원 세부정비계획 수립

구 분	내 용
사업기간	• 2025. 09. ~ 2026. 08.
사 업 비	• 4.5억원(2025년 예산)
사업내용	• 경주 낭산 일원 기반 연구 및 정비 연구 • 탐방 클러스터 조성계획 수립 • 토지매입구역 우선순위 선별 • 전문가 토론회 개최 및 의견 수렴

나. 경주 낭산 일원 토지매입

<표 4-50> 경주 낭산 일원 토지매입

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 41억원(2026년)
사업내용	• 토지매입(36필지, 44,201㎡) 및 손실보상금 지급

다. 경주 낭산 일원 지장물 매입

<표 4-51> 경주 낭산 일원 지장물 매입

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 15억원(2026년)
사업내용	• 지장물 매입 및 철거

라. 경주 황복사지 정비 실시설계

<표 4-52> 경주 황복사지 정비 실시설계

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 0.45억원(2026년)
사업내용	• 황복사지 일원 정비(배수로 정비, 주차장 조성 등)를 위한 실시설계 용역

마. 경주 낭산 일원 보수 및 정비

<표 4-53> 경주 낭산 일원 보수 및 정비

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026. 12.
사 업 비	• 0.45억원(2026년)
사업내용	• 산책로 정비, 매입지 예초 등 낭산 일원 보수 및 정비

바. 경주 낭산 일원 재선충 방제 및 고사목 제거

<표 4-54> 경주 낭산 일원 재선충 방제 및 고사목 제거

구 분	내 용
사업기간	• 2026. 01. ~ 2026.12.
사 업 비	• 0.6억원(2026년)
사업내용	• 재선충 방제 및 고사목제거

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 발굴·연구

가. 傳황복사지 심화 고증 연구

- 경주 낭산 일원의 傳황복사지 정비계획 수립을 위한 심화(고증)연구

나. 경주 낭산 일원 보존정비 기초학술연구

- 경주 낭산 일원의 정비계획의 순차적 수립을 위한 학술연구

(2) 복원·정비

가. 경역정비공사

- 경주 낭산 일원 경역정비공사

나. 토지 및 지장물 매입

- 경주 낭산 일원 토지보상

14. 경주 사천왕사지

- 전체적인 사역 확인 및 주변 시설과의 관계 확인
- 발굴조사 성과를 토대로 한 주요 유구 복원·정비사업 추진

1) 사업개요

- (1) 위 치 : 경북 경주시 배반동 935-2 일원
- (2) 사업기간 : 2017년 ~ 2025년
- (3) 총사업비 : 87억원(국비 60.9억, 지방비 26.1억)
- (4) 사업내용 :
 - 동·서·탑지 기단 및 건물지 정비
 - 미조사구간 발굴조사 및 경역정비
 - 관람로 및 주차장 등 관람객 편의시설 정비

2) 추진경과

- 2006. ~ 2012. : 발굴조사(국립경주문화재연구소)
- 2012. ~ 2013. : 녹유신장벽전 제작(국립경주문화재연구소)
- 2015. 02. ~ 2015. 12. : 사역 동남쪽(임시주차장부지) 시굴조사
- 2017. 11. : 종합정비계획 수립(국립경주문화재연구소)
- 2018. 02. : 임시주차장 조성
- 2020. 01. : 사천왕사지 기단복원 등 경역정비 실시설계 완료
- 2020. 02. ~ 2022. 12. : 사천왕사지 기단복원 등 경역정비공사
- 2020. 09. : 사천왕사지 구역 내 토지보상(1필지 / 1,041m²)
- 2021. 12. ~ 2023. 08. : 경주 사천왕사지 금당지 심화연구 및 연구용역

- 2023. 04. ~ 2023. 09. : 경주 사천왕사지 주변정비공사
- 2023. 04. ~ 2024. 04. : 경주 사천왕사지 경역정비계획 용역

3) 2026년 추진계획

(1) 복원·정비

가. 경주 사천왕사지 주차장 정비 실시설계

<표 4-55> 경주 사천왕사지 주차장 정비 실시설계

구 분	내 용
사업기간	● 2026. 01. ~ 2026. 12.
사업비	● 0.7억원(2026년 예산)
사업내용	● 사천왕사지 주차장 정비 실시설계

나. 경주 사천왕사지 금당지 기단 복원

<표 4-56> 경주 사천왕사지 금당지 기단 복원

구 분	내 용
사업기간	● 2026. 01. ~ 2026. 12.
사업비	● 10억원(2026년 예산)
사업내용	● 사천왕사지 금당지 기단 복원

다. 경주 사천왕사지 경역 정비공사

<표 4-57> 경주 사천왕사지 경역 정비공사

구 분	내 용
사업기간	● 2025. 02. ~ 2026. 06.
사업비	● 6억원(2025년 예산)
사업내용	● 경주 사천왕사지 배수로 정비계획

4) 향후계획(2026년 이후)

(1) 복원·정비

- 가. 사천왕사지 금당지 기단정비
 - 사천왕사지 금당지 기단정비공사 실시
- 나. 사천왕사지 주차장 정비
 - 사천왕사지 주차장 정비공사 실시

II 세부 시행계획 종합

<표 4-58> 2026년 세부 시행사업 종합

구 분	내 용	세부내용	
경주 월성	발굴 연구	<ul style="list-style-type: none"> 경주 월성 발굴조사 및 학술연구 	<ul style="list-style-type: none"> 월성 A지구(남성벽 및 건물지), C지구(내부 건물지 등) 출토 유물 보존처리 월성 출토 문자 자료 조사연구 자료집 발간 및 전문가 포럼 고환경(고환경, 고기후, 식생활 등) 복원연구 월성 발굴조사 연구 성과 활용 전시회 및 현장 개방 축제 개최 안정적인 연구 기반 구현을 위한 발굴조사 데이터 디지털담 구축 국내외 홍보 및 학술대회 개최, 상시교육, 콘텐츠 제작
	복원 정비	경주 월성 관람환경시설 개선	<ul style="list-style-type: none"> 주요 탐방로 정비 및 수목정비, 편의시설 정비 등
		경주 월성 서편지 정비	<ul style="list-style-type: none"> 서편지 정비 실시설계 용역
경주 월성 지구 예초		<ul style="list-style-type: none"> 경주 월성 지구 예초 실시 	
경주 황룡사지	발굴 연구	<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사지 복원 10차 심화연구 	<ul style="list-style-type: none"> 중금당 및 불상 디지털 복원 콘텐츠 제작, 강당 및 중금당 불상 기본설계 및 BIM 구축 황룡사 기타건축 기본계획, 황룡사지 정비사업 학술지원 등
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사지 배수체계 개선 계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> 황룡사지 고지형 분석 및 현장 조사를 통한 효율적 배수체계 정비방안 수립

<표 4-58> 2026년 세부 시행사업 종합 (계속)

구 분	내 용	세부내용	
경주 황룡사지	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사지 중심사역 기단정비사업 	<ul style="list-style-type: none"> 목탑자 중금당지(석조가구식기단), 강당지(장대석 외별대 기단) 기단 정비 동서금당자 강당 동서편건물자 회랑자 종루지·경루지(기단 경계표시) 기단 정비
		<ul style="list-style-type: none"> 황룡사역사문화관 전시실 개편 	<ul style="list-style-type: none"> 황룡사 역사문화관 2층 전시실 개편
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사지 주변정비사업 	<ul style="list-style-type: none"> 황룡사지 일원 예초 작업 등
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사지 남쪽광장 주변정비 	<ul style="list-style-type: none"> 황룡사지 남쪽광장 주변정비 실시설계
경주 분황사지	발굴 연구	<ul style="list-style-type: none"> 경주 분황사지 복원건물 고증 연구(4차) 	<ul style="list-style-type: none"> 분황사지 중문 및 남회랑 건축복원 고증연구
	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 경주 분황사지 화장실 및 주변 시설 보수 공사 	<ul style="list-style-type: none"> 분황사지 화장실 및 주변시설 보수
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 분황사지 관람환경 시설 개선 	<ul style="list-style-type: none"> 분황사지 관람환경시설 개선
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 분황사지 경역 내 화장실 설치 및 야간경관 조명 설치 	<ul style="list-style-type: none"> 화장실 설치, 탐방로 정비, 휴게시설물 정비 등
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 분황사지 사찰지원 시설(종무소) 건립 시행 	<ul style="list-style-type: none"> 분황사지 사찰지원시설(종무소) 건립
<ul style="list-style-type: none"> 경주 분황사지 관람편의 시설(휴게시설) 설치 및 콘텐츠 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 경주 분황사지 관람편의시설(휴게시설) 설치 및 관련 콘텐츠 구축 		
경주 구황동 원지 유적 일원	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 경주 구황동 원지 유적 일원 정비사업 	<ul style="list-style-type: none"> 종합정비계획 2단계 사업 시행을 위한 실시설계
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 구황동 원지 유적 일원 경관조명 설치 	<ul style="list-style-type: none"> 경관조명 설치를 위한 디자인 및 실시설계
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 구황동 원지 유적 일원 예초 	<ul style="list-style-type: none"> 경주 구황동원지 유적 일원 예초 실시

<표 4-58> 2026년 세부 시행사업 종합 (계속)

구 분		내 용	세부내용
경주 미탄사지 삼층석탑	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 경주 미탄사지 일원 정비 공사 시행 	<ul style="list-style-type: none"> 미탄사지 일원정비공사 시행(배수, 포장, 원지, 유구 등)
경주 동궁과 월지	발굴 연구	<ul style="list-style-type: none"> 경주 동궁과 월지 발굴 조사 및 학술연구 	<ul style="list-style-type: none"> 동궁과 월지 발굴조사, 학술연구 보고서 발간 동궁과 월지 서편 나지구 발굴조사 및 신라왕경 학술대회 개최 신라왕경 월성 이남 지역 고지형 및 고환경 분석 연구 신라왕경 조사자료 DB 구축 나지구 원지 조경석 산지 분석연구 1980년대 동궁과 월지 남편 주차장 부지 조사 성과 정리 및 발간 한 중 고대 도성과 문화비교연구 대국민 유물공개 및 홍보 콘텐츠 제작 및 배포
	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 신라왕경 방 정비·활용사업 시행 	<ul style="list-style-type: none"> 건축, 기계, 토목, 조경공사(편의시설 1개동, 배수로 설치, 탐방로 조성, 잔디식재 등) 전기공사(편의시설 조명공사, 외부 보안등 및 가로등 공사 등) 통신공사(CCTV설치 및 제어기 설치공사 등) 소방공사(편의시설 내 소방공사) 신라왕경 방 정비·활용사업 책임감리 용역
	활용	<ul style="list-style-type: none"> 경주 동궁과 월지 홍보전시관 기본계획 수립 경주 동궁과 월지 야간경관조명 정비사업(전각 및 호안석축) 	<ul style="list-style-type: none"> 동궁과 월지 홍보전시관 기본계획 수립 동궁과 월지 야간경관조명 정비(전각 및 호안석축) 실시
경주 첨성대	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 경주 첨성대 관람환경시설 기본계획 	<ul style="list-style-type: none"> 첨성대 주변 관람편의시설 정비방안 홍보 영상관 신축 검토 친문관련 콘텐츠 및 디지털 기술을 활용한 체험 프로그램 구상 (전시, 영상 등)
	활용	<ul style="list-style-type: none"> 경주 첨성대 홍보체험관 건립 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> 경주 첨성대 홍보체험관 건립 실시설계

<표 4-58> 2026년 세부 시행사업 종합 (계속)

구 분	내 용	세부내용	
경주 대릉원 일원	발굴 연구	<ul style="list-style-type: none"> 경주 대릉원 일원 쪽샘지구 분포조사 및 정밀발굴조사 	<ul style="list-style-type: none"> 쪽샘지구(N·J지구) 신라고분 분포·발굴조사 인왕·황오지구 신라고분 분포·발굴조사
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 황남동 120호분 주변 정밀발굴조사 및 경역 정비 	<ul style="list-style-type: none"> 황남동 120호분 정밀발굴조사 및 유물 보존처리 황남동 120호분 발굴 학술대회, 성과보고회 등 개최
	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 경주 대릉원 일원 내 토지 및 지장물 매입 	<ul style="list-style-type: none"> 토지매입 및 지장물 철거
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 대릉원 일원 예초 	<ul style="list-style-type: none"> 대릉원 일원 내 예초 실시
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 대릉원 일원(쪽샘지구) 관람편의시설 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 대릉원 일원(쪽샘지구) 관람편의시설 조성을 위한 실시설계 용역
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 대릉원 일원 재선충 방제 및 고사목 제거 	<ul style="list-style-type: none"> 대릉원 일원 재선충 방제 및 고사목 제거
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 대릉원 일원 CCTV설치 	<ul style="list-style-type: none"> 경주 대릉원 일원의 화재 및 재해예방, 고분에 올라가는 행위 등 예방
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 대릉원 일원 보수 및 정비 	<ul style="list-style-type: none"> 대릉원 일원 보수 및 정비 진행
	활용	<ul style="list-style-type: none"> 쪽샘유적발굴관 상시 공개 운영 	<ul style="list-style-type: none"> 쪽샘지구 44호분 복원축조실험 상시 공개 및 전문 해설 서비스 제공
		<ul style="list-style-type: none"> 쪽샘44호분 보호각 개 보수 기본설계 	<ul style="list-style-type: none"> 쪽샘유적발굴관 구조안전성 검토를 통한 리모델링 설계 전시콘텐츠 발굴 및 적용 방향 검토
경주 동부사적지대	발굴 연구	<ul style="list-style-type: none"> 경주 동부사적지대 발천 정비 계획 수립을 위한 자료 집성 및 학술대회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> 경주 동부사적지대 일대 문헌기록 검토 및 역사학적 분석 경주 동부사적지대 고지형 분석과 기존 고지형 검토 경주 동부사적지대 주변의 고고학적 현황과 연구 검토 학술대회 개최
	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 경주 동부사적지대 발천 석교지 재현 및 수로 정비 	<ul style="list-style-type: none"> 동부사적지대 발천 석교지 재현 및 수로정비 실시
경주 춘양교지와 월정교지	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 경주 춘양교지와 월정교지 예초 	<ul style="list-style-type: none"> 경주 춘양교지와 월정교지 내 예초 실시(53,240㎡)
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 춘양교지 토지 및 지장물 매입 	<ul style="list-style-type: none"> 경주 춘양교지 미매입 토지 및 지장물 보상 매입 (1필지 / A=661㎡)
		<ul style="list-style-type: none"> 사적지 정비 	<ul style="list-style-type: none"> 진입로, 보행로, 데크 보수 등 월정교 교각 받침목(첨차) 단청보수

<표 4-58> 2026년 세부 시행사업 종합 (계속)

구 분		내 용	세부내용	
경주 인왕동사지	복원 정비	• 경주 인왕동사지 석탑복원 시행	• 인왕동사지 석탑(2기) 복원 시행	
		• 경주 인왕동사지 유적정비 심화연구 용역	• 인왕동사지 복원 정비안 마련, 석탑 복원 실시설계	
		• 경주 인왕동사지 주변정비 공사	• 경주 인왕동사지 주변정비(야간조명 설치, 유구보호시설 도색, 수목식재, CCTV설치 등)	
경주 천관사지	복원 정비	• 경주 천관사지 주변정비	• 천관사지 환경정비(예초작업 15,300㎡)	
경주 낭산 일원	발굴 연구	• 경주 낭산 일원 시굴조사 및 기초학술조사	• 경주 능지탑지 일원 시굴 연장조사 및 정밀발굴조사 • 경주 능지탑지 콜로키움 개최 및 기초자료보고서 발간 • 경주 낭산 마을조사	
		• 경주 낭산 일원 학술 발굴조사	• 경주 낭산 일원 학술조사 • 능지탑지 일원 발굴조사	
	복원 정비	• 경주 낭산 일원 세부정비계획 수립	• 경주 낭산 일원 기반 연구 및 정비 연구 • 탐방 클러스터 조성계획 수립 • 토지매입구역 우선순위 선별 • 전문가 토론회 개최 및 의견 수렴	
		• 경주 낭산 일원 토지 매입	• 토지매입(36필지, 44,201㎡) 및 손실보상금 지급	
		• 경주 낭산 일원 지장물 매입	• 지장물 매입 및 철거	
		• 경주 황복사지 정비 실시설계	• 황복사지 일원 정비(배수로 정비, 주차장 조성 등)를 위한 실시설계 용역	
		• 경주 낭산 일원 보수 및 정비	• 산책로 정비, 매입지 예초 등 낭산 일원 보수 및 정비	
		• 경주 낭산 일원 개선충방제 및 고사목 제거	• 개선충 방제 및 고사목 제거	
	경주 사천왕사지	복원 정비	• 경주 사천왕사지 주차장 정비 실시설계	• 사천왕사지 주차장 정비 실시설계
			• 경주 사천왕사지 금당지 기단 복원	• 사천왕사지 금당지 기단 복원
• 경주 사천왕사지 경역 정비 공사			• 경주 사천왕사지 배수로 정비계획	

제5장 예산계획

I. 2026년 시행사업 소요예산

II. 세부 시행계획의 의의

I 2026년 시행사업 소요예산

<표 5-1> 2026년 시행사업 소요예산

구 분	내 용	2026년 사업비(당해+이월) 기 집행금액 제외	
경주 월성	발굴 연구	<ul style="list-style-type: none"> 경주 월성 발굴조사 및 학술연구 	6,000,000천원
	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 월성 관람환경 시설 개선 	1,200,000천원
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 월성 서편지 정비 	120,000천원
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 월성 지구 예초 	301,000천원
경주 황룡사지	발굴 연구	<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사 복원 10차 심화연구 	1,000,000천원
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사지 배수체계 개선 계획 수립 	300,000천원
	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사지 중심사역 기단정비사업 	2,000,000천원
		<ul style="list-style-type: none"> 황룡사 역사문화관 전시실 개편 	-
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사지 남쪽광장 주변정비사업 	200,000천원
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 황룡사지 주변정비사업 	100,000천원
경주 분황사지	발굴 연구	<ul style="list-style-type: none"> 경주 분황사지 복원건물 고증 연구(4차) 	500,000천원
	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 경주 분황사지 화장실 및 주변 시설 보수 공사 	200,000천원
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 분황사지 관람환경시설 개선 	200,000천원
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 분황사지 경역 내 화장실 설치 및 야간경관 조명 설치 	360,000천원
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 분황사지 사찰지원시설(종무소) 건립 시행 	720,000천원
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 분황사지 관람편의시설(휴게시설) 설치 및 콘텐츠 구축 	165,000천원
경주 구황동 원지 유적 일원	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 경주 구황동 원지 유적 일원 정비사업 	200,000천원
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 구황동 원지 유적 일원 경관조명 설치 	100,000천원
		<ul style="list-style-type: none"> 경주 구황동 원지 유적 일원 예초 	100,000천원
경주 미탄사지 삼층석탑	복원 정비	<ul style="list-style-type: none"> 경주 미탄사지 일원 정비공사 시행 	1,500,000천원

<표 5-1> 2026년 시행사업 소요예산 (계속)

구 분	내 용	2026년 사업비(당해+이월) 기 집행금액 제외
경주 동궁과 월지	발굴 연구	• 경주 동궁과 월지 발굴조사 및 학술연구 1,600,000천원
	복원 정비	• 신라왕경 방 정비·활용사업 시행 3,350,000천원
	활용	• 경주 동궁과 월지 홍보전시관 기본계획 수립 200,000천원
		• 경주 동궁과 월지 야간경관조명 정비사업 (전각 및 호안석축) 1,650,000천원
경주 첨성대	복원 정비	• 경주 첨성대 관람환경 시설 기본계획 -
	활용	• 경주 첨성대 홍보체험관 건립 실시설계 200,000천원
경주 대릉원 일원	발굴 연구	• 경주 대릉원 일원 쪽샘지구 분포조사 및 정밀발굴조사 3,200,000천원
		• 경주 황남동 120호분 주변 정밀발굴조사 및 경역정비 1,506,000천원
	복원 정비	• 경주 대릉원 일원 내 토지 및 지장물 매입 1,160,000천원
		• 경주 대릉원 일원 예초 378,000천원
		• 경주 대릉원 일원(쪽샘지구) 관람편의시설 실시설계 380,000천원
		• 경주 대릉원 일원 재선충 방제 및 고사목 제거 40,000천원
		• 경주 대릉원 일원 이동식 CCTV설치 140,000천원
		• 경주 대릉원 일원 보수 및 정비 100,000천원
	활용	• 쪽샘유적발굴관 상시 공개 운영 경주 대릉원 일원 쪽샘지구 분포조사 및 정밀발굴조사 예산에 포함
		• 쪽샘44호분 보호각 개보수 기본설계 용역 -
경주 동부 사적지대	발굴 연구	• 경주 동부사적지대 발천 정비 계획 수립을 위한 자료 집성 및 학술대회 개최 -
		• 경주 동부사적지대 발천 정비기본계획수립 학술연구 100,000천원
	복원 정비	• 경주 동부사적지대 발천 석교지 재현 및 수로 정비 200,000천원

<표 5-1> 2026년 시행사업 소요예산 (계속)

구 분	내 용	2026년 사업비(당해+이월) 기 집행금액 제외		
경주 춘양교지와 월정교지	• 경주 춘양교지와 월정교지 예초	70,000천원		
	• 경주 춘양교지 토지 및 지장물 매입	800,000천원		
	• 사적지 정비(월정교 보수 및 편의시설 개선)	1,100,000천원		
경주 인왕동사지	• 경주 인왕동사지 석탑복원 시행	3,000,000천원		
	• 경주 인왕동사지 유적정비 심화연구 용역	63,000천원		
	• 경주 인왕동사지 주변정비공사	253,000천원		
경주 천관사지	• 경주 천관사지 주변정비	30,000천원		
경주 낭산 일원	발굴 연구	• 경주 낭산 일원 시굴조사 및 기초학술조사	-	
		• 경주 능지탑지 일원 발굴조사	400,000천원	
	복원 정비	• 경주 낭산 일원 세부정비계획 수립	-	
		• 경주 낭산 일원 토지매입	4,100,000천원	
		• 경주 낭산 일원 지장물 매입	1,500,000천원	
		• 경주 황복사지 정비 실시설계	45,000천원	
		• 경주 낭산 일원 보수 및 정비	45,000천원	
		• 경주 낭산 일원 재선충 방제 및 고사목 제거	60,000천원	
	경주 사천왕사지	복원 정비	• 경주 사천왕사지 주차장 정비 실시설계	70,000천원
			• 경주 사천왕사지 금당지 기단 복원	1,000,000천원
• 경주 사천왕사지 경역정비공사			-	
계		42,305,958천원		

- 2026년 신라왕경 핵심유적 복원·정비 시행계획의 총사업비는 기 집행금액을 제외하고 총 42,305,958천원으로 산정됨
- 상기 사업과 예산은 경주시와 신라왕경 핵심유적 복원정비 추진단이 협의한 사항에 대한 것으로 유적별 보존관리 상황을 감안하여 협의를 거쳐 변경될 수 있음

II ▶ 세부 시행계획의 의의

- 『2026년 신라왕경 핵심유적 복원정비 시행계획』은 『신라왕경 핵심유적 복원정비 종합계획(2026~2030)』과 연동하여 매년 추진 상황을 점검분석하고, 이에 따른 시행계획을 매년 수정·보완함
- 이를 통해 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업의 환경변화에 대응하는 집행체계를 구축함으로써 체계적인 사업 추진을 유도하여 지속가능한 신라왕경 핵심유적 복원정비 사업의 기반을 마련함
- 신라왕경 핵심유적 복원정비 시행계획 추진을 통하여 경주 역사문화도시 조성, 신라왕경 핵심유적 원형 회복(가시화), 신라왕경 핵심유적 관광자원 확보, 신라왕경 핵심유적의 문화향유 기회를 제고할 수 있음
